



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Elisabetta CONTE	Referendario (relatore)
Sergio Antonio PRESTIANNI	Referendario
Francesca COSENTINO	Referendario

Nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 22 del d.l. del 16 luglio 2020 n.76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n.120;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare l'art. 7, comma 7, che attribuisce alla Corte dei conti il compito di

valutare le condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, con le quali sono gestite le risorse provenienti dai fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTE le deliberazioni della Sezione autonomie n. 1/2022/INPR; n.13/2022/INPR; n. 18/2022/INPR e n. 1/2023/INPR;

VISTA la deliberazione n. 43/SSRCO/2022/INPR delle Sezioni riunite in sede di controllo;

VISTI gli esiti dell'attività istruttoria;

VISTA l'ordinanza n. 5/2023 con la quale il Presidente ha convocato la camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Elisabetta Conte

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto *“Ricognizione dei progetti PNRR-PNC in cui sono soggetti attuatori Regione Liguria, la Città metropolitana di Genova, le Province di Savona, Imperia, La Spezia e i Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti”*.

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Liguria; al Sindaco metropolitano di Genova; ai Presidenti delle Province di Savona, Imperia e La Spezia; ai Sindaci e ai Presidenti del Consiglio comunale dei Comuni di Alassio, Albenga, Arcola, Arenzano, Bordighera, Cairo Montenotte, Chiavari, Finale Ligure, Genova, Imperia, Lavagna, La Spezia, Loano, Rapallo, Sanremo, Sarzana, Savona, Sestri Levante, Taggia, Varazze, Ventimiglia .

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nelle modalità di legge.

Così deliberato nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023, tenuta da remoto.

Il Relatore



ELISABETTA CONTE
CORTE DEI CONTI
08.02.2023 12:43:56
GMT+00:00

Il Presidente



MARIA TERESA
POLVERINO
CORTE DEI
CONTI
08.02.2023
14:40:22
GMT+01:00

Depositata in Segreteria l'8 febbraio 2023

Il funzionario preposto



ANTONELLA
SFETTINA
CORTE DEI CONTI
08.02.2023
14:45:56
GMT+01:00

**RICOGNIZIONE DEI PROGETTI PNRR-PNC IN CUI SONO SOGGETTI
ATTUATORI REGIONE LIGURIA, LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, LE
PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA E I COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE AI 10 MILA ABITANTI**

1. I controlli sul PNRR intestati alla Corte dei conti
 2. L'attività istruttoria condotta dalla Sezione. Nota metodologica
 3. Il quadro emergente dalla banca dati ReGis e dalle altre banche dati sui progetti PNRR in Liguria
 4. Regione Liguria
 - i. Ricognizione dei progetti
 - ii. Trasparenza, tracciabilità e sostenibilità degli investimenti
 - iii. Controlli
 - iv. Sistema ReGis
 - v. *Governance* regionale del PNRR
 - vi. Regione Liguria come stazione appaltante
 - vii. Il progetto bandiera
 5. Città metropolitana di Genova e Province di Savona, Imperia, La Spezia
 - i. Ricognizione dei progetti
 - ii. Trasparenza, tracciabilità e sostenibilità degli investimenti
 - iii. Controlli
 - iv. Sistema ReGis
 6. Comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti
 - i. Ricognizione dei progetti
 - ii. Trasparenza, tracciabilità e sostenibilità degli investimenti
 - iii. Controlli
 - iv. Sistema ReGis
 7. Conclusioni
- Appendice

1. I CONTROLLI SUL PNRR INTESTATI ALLA CORTE DEI CONTI

Il quadro normativo di riferimento per la disciplina dei controlli della Corte dei conti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è rappresentato dall'art. 22 del d. l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e dall'art. 7 del d. l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

L'art. 22 ha previsto il controllo concomitante della Corte dei conti sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, prevedendo la trasmissione alle amministrazioni competenti, in caso di accertamento di gravi irregolarità gestionali ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi, ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, c. 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Ove l'attuazione dei suddetti piani, programmi e progetti compete agli enti territoriali, le funzioni di controllo sono esercitate dalle competenti Sezioni regionali (cfr. deliberazione n. 272/2021 del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti).

Il d.l. n. 77/2021, riguardante la *governance* del PNRR, all'art. 7, c. 7, poi, ha intestato espressamente alla Corte dei conti un controllo - nella forma di controllo sulla gestione *ex art. 3, c. 4, l. n. 20/1994* - improntato alla verifica di economicità, efficienza ed efficacia - sull'acquisizione e sull'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi del PNRR. I risultati di tale controllo esitano in un referto semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano.

Va, poi, citata anche la funzione consultiva relativa al PNRR svolta dalle Sezioni riunite e dalle Sezioni regionali di controllo. Difatti, la legge europea 2019-2020 (l. 23 dicembre 2021, n. 238, art. 46, c. 2) ha previsto la possibilità per le amministrazioni centrali e gli organismi di diritto pubblico nazionali di chiedere pareri alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella materia di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore ad un milione di euro, limitatamente alle risorse stanziato dal PNRR e ai fondi a questo complementari. I medesimi pareri possono essere richiesti alle Sezioni regionali di controllo da parte di enti locali e regioni sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziato dal PNRR e dai fondi complementari.

Tanto premesso, circa le modalità di esercizio dei controlli sopra descritti, l'impianto *top-down* del PNRR fa sì che più Sezioni siano coinvolte nell'espletamento delle attività di controllo, sia a livello centrale che locale (tra cui Sezioni riunite, Sezione delle autonomie, Collegio del controllo concomitante, Sezioni regionali) e che, quindi, vi sia necessità di una forte collaborazione tra queste al fine di attuare un controllo che sia effettivo e dal quale possa derivare un valore aggiunto.

A tal fine, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno individuato la necessità di una strutturale interazione con le Sezioni regionali, tenute a riportare periodicamente i risultati delle proprie verifiche, sostenendo che *“giovandosi della rete delle Sezioni regionali si punterà a condurre un sondaggio congiunturale che coinvolge un campione dei principali soggetti economici pubblici operanti sul territorio. Da svolgere in due momenti dell'anno (nell'ultima decade di gennaio e nella prima di luglio), l'indagine mira a evidenziare le difficoltà registrate nella gestione dei progetti di investimento distinguendo quelle riconducibili a tre distinte aree critiche per il procedere del Piano e, in generale, degli investimenti: la gestione amministrativa dei progetti; quella progettuale e quella collegata alle disponibilità di personale”* (delib. n. 21/2021/INPR). Successivamente, con deliberazione n. 43/2022/INPR, relativa alla programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2023, le medesime Sezioni hanno ritenuto che *“per la predisposizione della Relazione semestrale sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevista dall'art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021 cui unitariamente è attribuito il compito di redazione alle Sezioni riunite in sede di controllo, ciascuna Sezione centrale di controllo e, attraverso la Sezione delle autonomie, ciascuna Sezione regionale contribuirà con una Relazione di sintesi sull'attività svolta nel periodo di riferimento, approvata dalle rispettive Sezioni. Resta fermo che ciascuna Sezione riferirà con la tempistica e le modalità proprie (ad esempio, relazione su singoli enti, relazione su singoli progetti o programmi, relazione annuale sugli esiti) al Parlamento nazionale o alle Assemblee regionali in base all'attività programmata. Ogni relazione, che verrà allegata alla Relazione trasmessa al Parlamento, dovrà essere accompagnata da una nota metodologica che chiarisca fonti e tempi di predisposizione delle diverse attività di analisi. Per consentire alle Sezioni riunite in sede di controllo la trasmissione al Parlamento della Relazione semestrale entro i tempi programmati (15 marzo e 15 novembre) i singoli contributi dovranno essere trasmessi, previa specifica deliberazione, entro il mese di febbraio e ottobre”*.

Per quanto concerne l'attività delle Sezioni regionali, all'esigenza di cooperazione sopra delineata, considerando la funzione di coordinamento che le è propria, ha risposto la Sezione delle autonomie, con le deliberazioni nn. 13 e 18/2022/INPR. Detta Sezione, peraltro, ha implementato un *dataset* - che contempla attualmente più di 160mila CUP - alimentato con la messa a sistema della banca dati fornita dalla Presidenza del Consiglio-Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica degli "OPENDATA" estratti dal sito Italia Domani ("Milestone e Target programmazione del PNRR" e "Quadro finanziario del PNRR" con aggiornamento al 03/08/2022) ed arricchito con l'inserimento, per ognuno dei soggetti attuatori, di alcuni dei principali indicatori di bilancio individuati nella deliberazione n. 18/2022, al fine di fornire un ausilio alle Sezioni regionali nella mappatura e nel monitoraggio dei progetti.

Nelle deliberazioni sopra richiamate, così come nella recente deliberazione n. 1/2023/INPR, la Sezione delle autonomie ha individuato i contenuti minimi su cui si deve incentrare il controllo delle Sezioni regionali, al fine di poter disporre di dati omogenei. Tali contenuti sono riassumibili nei seguenti termini:

- ricognizione degli interventi effettuati sul territorio;
- considerazioni d'ordine generale sul rispetto degli obiettivi e dei relativi tempi di attuazione previsti dal PNRR, finanziati in tutto o in parte con le risorse ivi previste;
- evidenziazione di specifici ritardi, inefficienze, difformità o altre disfunzioni;
- attivazione delle eventuali misure di impulso necessarie per il superamento delle inefficienze evidenziate, comprensive dei rimedi suggeriti e - nel caso estremo di gravi situazioni - delle segnalazioni al Ministro;
- eventuale esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dall'art. 12 del decreto-legge n. 77 del 2021;
- indicazione e sintesi delle principali deliberazioni prodotte dalla Sezione regionale.

Pertanto, sulla base delle linee guida richiamate, ogni Sezione regionale è tenuta a fornire, attraverso i propri *report*, da trasmettere entro il 31 gennaio e il 1° ottobre alla Sezione delle autonomie, contenuti informativi omogenei sul monitoraggio dell'avanzamento del PNRR da parte degli enti attuatori situati nel territorio di propria competenza, avvalendosi anche del *database* sopra menzionato (cfr. delib. Sezione delle Autonomie n. 1/2023/INPR).

2. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA CONDOTTA DALLA SEZIONE. NOTA METODOLOGICA

L'attività istruttoria della Sezione, svoltasi tra i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 in modo da avere dati aggiornati alla chiusura dell'esercizio 2022, si è concentrata su un campione di enti attuatori composto dalla Regione Liguria, dalle tre province (Savona, Imperia e La Spezia), dalla città metropolitana di Genova e dai ventuno comuni liguri con popolazione superiore a 10 mila abitanti¹. Difatti, si è ritenuto di avviare le indagini utilizzando un campione che comprendesse gli enti di maggiori dimensioni, in modo da ottenere un quadro quanto più completo dei progetti in cui questi sono coinvolti, per poi selezionarne alcuni, ai fini delle successive verifiche, da tenere costantemente monitorati ed ampliare il campo d'indagine anche agli enti di dimensione più ridotta. Anche tali enti, difatti, risultano destinatari di considerevoli risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) ed appare opportuno verificare la capacità che gli stessi avranno, considerata la ridotta dotazione organica, di gestire tali fondi e di realizzare i connessi progetti, nonché i possibili impatti sulla gestione finanziaria e sulla corretta contabilizzazione delle risorse.

Un primo punto su cui si è incentrata l'attività istruttoria è stato la corretta individuazione dei progetti di cui gli enti che rientrano nel campione sono soggetti attuatori. Difatti, da un preliminare confronto dei dati presenti in differenti banche dati (ReGis², BDAP-MOP³, *database* della Sezione delle autonomie⁴) sono emerse alcune incongruenze. Sono stati,

¹ Comuni di Alassio, Albenga, Arcola, Arenzano, Bordighera, Cairo Montenotte, Chiavari, Finale Ligure, Genova, Imperia, Lavagna, La Spezia, Loano, Rapallo, Sanremo, Sarzana, Savona, Sestri Levante, Taggia, Varazze, Ventimiglia.

² L'art. 1, c. 1043, della legge 30 dicembre 2020 n.178 (legge di bilancio per il 2021) ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - il compito di sviluppare un sistema informatico per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation EU. In esecuzione alla previsione normativa, RGS ha sviluppato il sistema informatico denominato "ReGiS" per la rilevazione dei dati di monitoraggio del PNRR.

³ Il d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 delinea specifici obblighi di monitoraggio, tra gli altri, per le amministrazioni che realizzano opere pubbliche. In particolare, il monitoraggio riguarda le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi. Il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), raccoglie i dati direttamente dai sistemi alimentanti (al momento CUP, CIG e SIOPE). Le amministrazioni sono tenute a verificare la correttezza dei dati sulla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) e ad aggiornare i dati direttamente sui sistemi alimentanti, nonché a completare su BDAP-MOP il *set* informativo non presente sui sistemi alimentanti e a validare i dati e a trasmetterli ai fini del monitoraggio.

⁴ Per una più approfondita analisi dei progetti finanziati con risorse del New Generation EU è stato utilizzato il *database* predisposto dalla Sezione Autonomie che contiene anche i dati dei progetti finanziati con il Piano

pertanto, trasmessi agli enti dei *file excel* con i dati raccolti sulle banche dati sopra menzionate (elenco progetti, descrizione, costo ed importo finanziato, codice unico di progetto - CUP⁵), chiedendo di segnalare eventuali incongruenze, nonché CUP revocati, chiusi o non ammessi a finanziamento. Per la Regione si è tenuto conto principalmente dei dati presenti su ReGis, per gli enti locali di quelli presenti sul *database* della Sezione delle autonomie,

Nel medesimo *file*, al fine di verificare lo stato di attuazione dei progetti, sono state inserite apposite colonne, da compilare a cura degli enti, relative alla fase di attuazione (progettazione, aggiudicazione, esecuzione lavori, collaudo, intervento concluso), allo stato di avanzamento finanziario (pagamenti effettuati sui fondi PNRR al netto dell'IVA) e agli importi ricevuti in anticipazione. Delle specifiche colonne sono state riservate per la segnalazione di incongruenze o di criticità.

Come ricordato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 1/2022/INPR, i controlli della Corte dei conti devono incentrarsi, tra l'altro, sulla verifica dell'attuazione dei programmi di spesa, sotto i profili della tempestività e della qualità dei risultati. Ciò in quanto il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati comporta la restituzione del finanziamento ottenuto, con possibili gravi conseguenze sul bilancio, posto che le risorse revocate dovrebbero essere sostituite con fondi alternativi. Pertanto, se da un lato le risorse del PNRR rappresentano un'importante opportunità di ampliamento delle infrastrutture e dei servizi offerti, dall'altro potrebbero rappresentare un rischio finanziario rilevante qualora gli interventi non siano correttamente gestiti. Anche alla luce di tali considerazioni, infatti, è di preminente importanza che gli enti effettuino un preventivo approfondimento

nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza e fornisce informazioni di particolare interesse per i comuni, non presenti sul sistema ReGis in data 12 gennaio 2023 (data di estrazione) inerenti alle seguenti misure:

M2C3I0201 Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sisma bonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici;

M5C2I0101 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione;

M5C2I0103 Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta;

M1C3I0102 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura;

M2C1I0101 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti.

⁵ Si ricorda che, al fine di agevolare il monitoraggio e la tracciabilità dei finanziamenti, come anche stabilito dall'art. 5 c. 1 del DPCM del 15 settembre 2021, gli atti delle amministrazioni titolari che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano la realizzazione di investimenti, devono contenere per ciascun progetto del PNRR, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo CUP. Il CUP va, inoltre, obbligatoriamente riportato in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento.

sugli investimenti e sulla loro sostenibilità, con particolare attenzione alla sostenibilità degli oneri correnti, a regime, necessari alla gestione e manutenzione degli investimenti realizzati nonché anche con riferimento agli equilibri e alla disponibilità e alla gestione delle risorse umane (cfr. principio contabile della programmazione, allegato 4/1 al d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022).

In questa prospettiva, quindi, uno specifico quesito è stato posto, in sede istruttoria, circa la preventiva verifica della sostenibilità dell'investimento.

Dopo la conclusione di questa prima indagine, volta prioritariamente ad effettuare una mappatura organica dei progetti e del loro stato di avanzamento, la Sezione intende proseguire i propri controlli concentrandosi anche sugli impatti e sulle relazioni tra investimenti PNRR e condizioni finanziarie degli enti.

Anche in tale ottica, al fine di verificare che non vi sia commistione tra le risorse PNRR e risorse destinate ad altre finalità, con una possibile distrazione delle prime dall'utilizzo cui sono finalizzate, è apparso necessario verificare la tracciabilità di tali flussi finanziari. Si ricorda che l'art. 9, d.l. n. 77/2021 richiede espressamente che le amministrazioni che gestiscono fondi PNRR assicurino la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo di tali risorse⁶. Pertanto, è stato richiesto agli enti di relazionare in merito all'utilizzo di una distinta contabilizzazione degli investimenti, con appositi capitoli del piano esecutivo di gestione (PEG), al fine di garantire il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa, nonché all'integrazione della descrizione dei capitoli di bilancio con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP, specificando, altresì, se in caso di più opere finanziate con il medesimo decreto, sia stato previsto un distinto capitolo per ogni progetto. Inoltre, al fine di attuare una corretta perimetrazione anche con riferimento a quei progetti con procedure di gara già

⁶ Sul punto si rimanda anche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, come successivamente modificato dal d.m. del 5 agosto 2022 e, in particolare, all'art. 3, c. 3, a norma del quale "Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

espletate prima dell'ammissione a finanziamento sul PNRR, è stato richiesto se fossero state integrate le descrizioni dei capitoli, originariamente finanziati da risorse statali, con l'indicazione della missione, componente, investimento e del CUP (conformemente a quanto previsto anche dalla circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022).

Ulteriore punto su cui si è focalizzata l'attività istruttoria è l'implementazione, da parte degli enti, del sistema interno di *audit*, anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni, nonché l'adeguatezza degli stessi al fine di contrastare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli interventi a valere sul PNRR. Si ricorda, infatti, che l'art. 1, c. 1043 della legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020), prescrive che gli enti titolari di progetti PNRR sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e devono realizzare i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi *target* intermedi e finali. Inoltre, come previsto dagli allegati alle circolari RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 e n. 9 del 10 febbraio 2022, nonché dai dispositivi attuativi (avvisi e bandi) delle amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e relativi atti convenzionali, il soggetto attuatore assume, nella fase di realizzazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di controllo:

- a) di regolarità amministrativo - contabile delle spese esposte a rendicontazione;
- b) del rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure (investimenti/riforme) PNRR,
- c) dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frodi, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo");
- d) di rendicontazione, sul sistema informativo utilizzato, delle spese sostenute ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi (OCS).

Infine, un altro aspetto toccato dall'attività istruttoria è quello relativo all'attività di implementazione della piattaforma ReGis, rispetto al quale si richiama la circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022, che ha chiarito che "il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli

obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR". La stessa circolare prevede, inoltre, che "I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza."

3. IL QUADRO EMERGENTE DALLA BANCA DATI ReGiS E DALLE ALTRE BANCHE DATI SUI PROGETTI PNRR IN LIGURIA

Dal Sistema informatico ReGiS risulta che il totale dei progetti che hanno attuazione in Liguria ammonta ad euro 5.384.728.501,15, di cui euro 3.780.942.961,35 sono da riferirsi a interventi che hanno ambito di attuazione nazionale.

A seguito dell'interlocuzione istruttoria con Regione Liguria, si è proceduto ad un confronto tra i dati presenti sulla citata banca dati e quelli rappresentati dall'amministrazione. Al termine del raffronto e delle rettifiche operate, risulta che gli investimenti che hanno attuazione sul territorio regionale ammontano a complessivi euro 1.643.505.586,81.

Le amministrazioni titolari dell'intervento sono riportate nella tabella che segue.

Tab. n. 1 Totali per Amministrazione Titolare dell'intervento


PNRR - Amministrazione titolare	PRG - Costo ammesso progetti
Ministero affari esteri e cooperazione internazionale	9.867.981,00
Ministero ambiente e sicurezza energetica	3.020.038,70
Ministero dell'università e della ricerca	203.879.199,72
Ministero del lavoro e politiche sociali	10.887.122,47
Ministero del turismo	0,00
Ministero della cultura	42.924.363,01
Ministero della giustizia	8.875.000,00
Ministero della salute	177.551.606,41
Ministero dell'interno	403.252.040,33
Ministero dell'istruzione e merito	177.092.222,47
Ministero imprese e del made in Italy	431.855,06
Ministero infrastrutture e trasporti	539.779.854,59
PCM - Dipartimento affari regionali e autonomie	0,00

PCM - Dipartimento politiche di coesione	14.601,00
PCM - Dipartimento protezione civile	10.778.697,05
PCM - Dipartimento trasformazione digitale	25.021.005,00
PCM - Funzione pubblica	9.635.000,00
PCM - Dipartimento per lo sport	20.495.000,00
Totale	1.643.505.586,81

Fonte: Banca Dati Regis (dati al 12 gennaio 2023)

Per quanto riguarda la distribuzione, tra le diverse missioni⁷, dei progetti insistenti solo sul territorio regionale, quella con una maggiore dotazione finanziaria risulta essere la M2, relativa alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, seguita da quelle relative ad inclusione e coesione (M5) e ad istruzione e ricerca (M4). Molto contenuta, invece, è la dotazione finanziaria della missione relativa alle infrastrutture per una mobilità sostenibile (M3).

Grafico n. 1 - Distribuzione dei progetti tra le differenti missioni

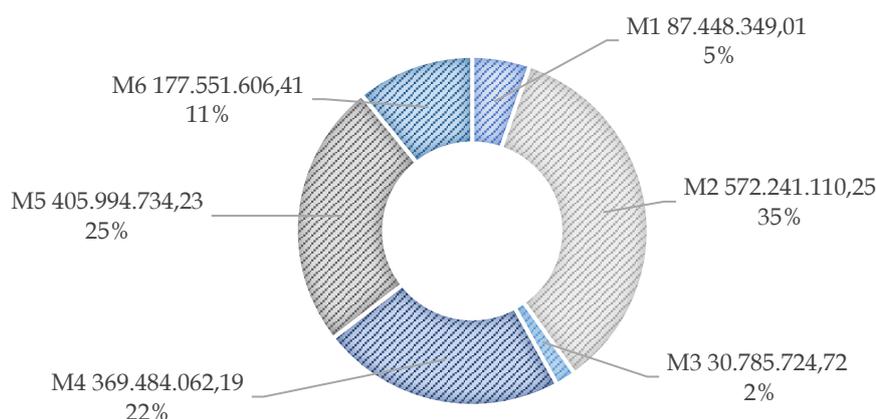


Fonte: Banca Dati Regis (dati al 12 gennaio 2023)

Per quanto concerne, invece, la distribuzione delle risorse tra gli enti rientranti nelle quattro province liguri, la maggior parte dei fondi sono allocati sul territorio genovese (euro 931.622.623,78), mentre nell'imperiese sono allocati euro 158.044.413,32, euro 162.723.734,90 nel savonese ed euro 82.839.278,87 nello spezzino.

⁷ Il PNRR si articola in sei Missioni (M1 - digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, M2 - rivoluzione verde e transizione ecologica, M3 - infrastrutture per una mobilità sostenibile, M4 - istruzione e ricerca, M5 - inclusione e coesione e M6 - salute) e 16 Componenti e si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.


Grafico n. 2 – Distribuzione risorse tra il territorio delle province liguri

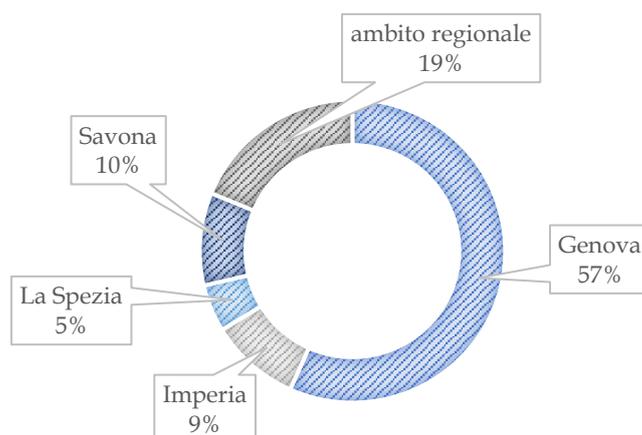

Fonte: Banca Dati Regis (dati al 12 gennaio 2023)

Per quanto concerne, poi, la distribuzione delle risorse tra le differenti categorie di enti attuatori, quella che beneficia della più rilevante quota di risorse è quella degli enti locali (euro 1.069.157.608,42, di cui euro 987.699.250,45 di competenza dei comuni), seguiti da Regione Liguria (euro 280.775.535,88), università (euro 18.608.941,02) e scuole (5.255.592,23).

Grafico n. 3 - Distribuzione risorse tra diverse categorie di enti attuatori

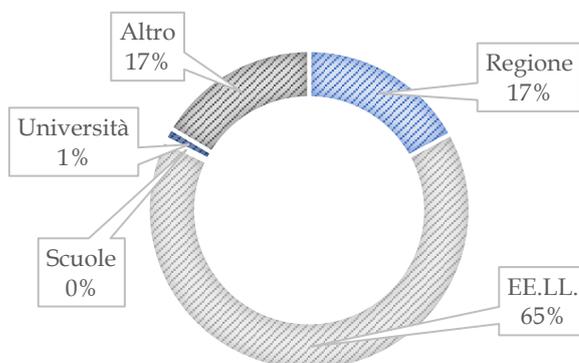

Fonte: Banca Dati Regis (dati al 12 gennaio 2023)

Dalla consultazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare da BDAP-MOP, per i 234 comuni liguri figurano 2.459 CUP, di cui, tuttavia, 38 risultano revocati, 44 già chiusi ed un CUP è inesistente.

Avendo riguardo alle fasi dell'investimento, riassumibili in quelle della progettazione (studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva), esecuzione, conclusione

(collaudo) e funzionalità, risulta che gli interventi relativi ai comuni hanno raggiunto le seguenti fasi:

136 allo studio di fattibilità

154 in fase di progettazione (preliminare, definitiva o esecutiva)

9 in stipula contratto


462 in esecuzione lavori o fornitura

162 in fase di collaudo o chiusura intervento

33 in fase funzionalità

1503 senza indicazione

Grafico n. 4 – Stato di avanzamento investimenti

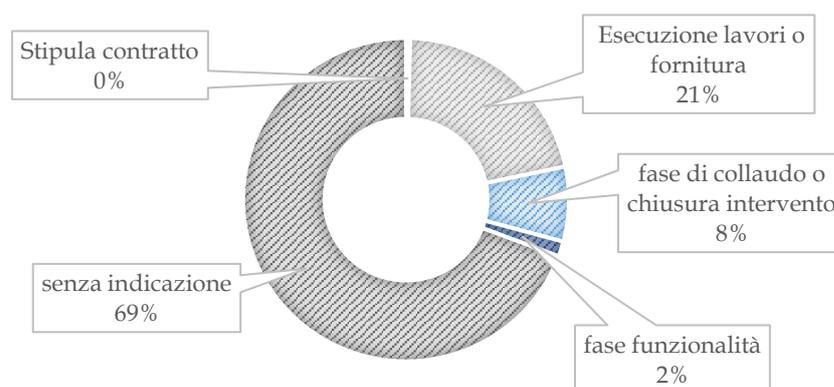

Fonte: BDAP - MOP

Il mancato aggiornamento, da parte dei comuni, della Banca dati BDAP MOP, rappresenta una criticità, atteso che, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 229/2011, i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche, devono essere resi disponibili nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche con cadenza almeno trimestrale.

Per quanto concerne lo stato di avanzamento finanziario relativo ai CUP in esame, dall'estrazione effettuata, il totale degli investimenti avviati da tutti i 234 comuni della Liguria ammonta ad euro 1.291.218.614,00⁸. La Banca dati BDAP-MOP raccoglie i dati direttamente dal sistema SIOPE⁹ e fornisce informazioni circa i pagamenti già effettuati che,

⁸ Il dato comprende anche le quote di cofinanziamento non PNRR.

⁹ Il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici - SIOPE - è stato realizzato sulla base di una convenzione tra la Ragioneria Generale dello Stato e la Banca d'Italia, con l'obiettivo di rendere disponibile un archivio di informazioni riguardante gli incassi e i pagamenti delle Amministrazioni pubbliche.

per gli investimenti oggetto di questa indagine, ammontano a complessivi 68.525.239,71 euro, corrispondenti al 5,31 per cento dei finanziamenti concessi.

4. REGIONE LIGURIA

L'attività istruttoria relativa a Regione Liguria è stata avviata con nota prot. n. 5792 del 22 dicembre 2022, riscontrata con nota prot. n. 733 del 27 gennaio 2023. Come già descritto nel paragrafo 2, l'indagine si è focalizzata sulla ricognizione dei progetti PNRR in svolgimento, sulla trasparenza, tracciabilità e sostenibilità dei relativi investimenti, sul sistema dei controlli interni e sull'adempimento degli obblighi relativi alla banca dati ReGis. Di seguito, si sintetizzano gli esiti dell'attività istruttoria.

i. Ricognizione dei progetti PNRR

Dalla ricognizione effettuata da questa Sezione, sulla base dei dati presenti in ReGis, incrociati con i dati forniti dalla Regione, risultano attivi 172 progetti PNRR, distribuiti tra le misure M1, M2, M5 e M6, per un totale di euro 280.775.535,88. Aggiungendo anche i 9 progetti finanziati con il PNC (tutti a valere sulla misura 6), il valore totale dei progetti è pari ad euro 315.599.995,88.

Va dato, comunque, conto che dai dati trasmessi da Regione Liguria (cfr. appendice), sussistono rimodulazioni dei progetti per una minore somma complessiva di euro 172.764.¹⁰ Inoltre, sempre in sede istruttoria, la Regione ha comunicato che alcuni interventi presenti su ReGis non rientrano nell'ambito del PNRR, per complessivi euro 22.961.624,00¹¹.


In particolare, basandosi sui dati di ReGis (e, quindi, ai progetti PNRR), la misura su cui si concentrano la maggior parte dei progetti e dei fondi è la M6, relativa alla salute, con 135 progetti totali per un valore di euro 177.551.606,41. I progetti sulla misura 5 (inclusione e coesione) sono pari a 30, per un valore di euro 46.763.976,99, mentre la misura 2 (rivoluzione

¹⁰ Tale somma è ottenuta come differenza tra le rimodulazioni in aumento, per complessivi euro 585.778, e quelle in diminuzione, per complessivi euro 758.542. gli interventi interessati sono quelli di cui ai CUP G32C22000560005, G32C22000580005, G32C22000590005, G32C22000600005, G32C22000610005, G32C22000620005, E24E22000670001, E54E22000130001, E24E22000680001, E24E22000690001, E54E22000120001, E57H22001010001.

¹¹ Si tratta dei CUP E29J20002360001, J36G20000790001, J36G20000780001, I67H20004180001, G39J21024400001, J39J20001450001, I67H20004190001, J39J20001440001, G37H21000200002, E51B20000670003, D52C20000230002, I77H20005040001, C34E20003050002, D51B20000830002, C31B20001120002, C38I20000410002.

verde e transizione ecologica) pur contando un numero di progetti decisamente inferiore (6 progetti) assorbe risorse per una somma pressoché paritetica (euro 46.824.952,48). Infine, la misura 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), con un solo progetto attivo, drena risorse per euro 9.635.000,00.

Grafico n. 5 – Distribuzione risorse tra le misure

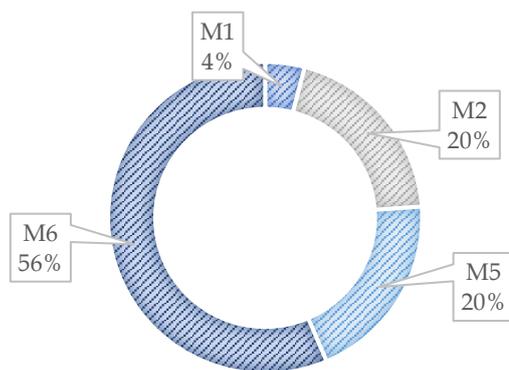

Fonte: elaborazione dati istruttoria

Per quanto concerne le scadenze dei progetti in essere, la maggior parte di questi (58,28 per cento) avrà scadenza nel 2024, mentre circa un terzo dovrà essere concluso nel 2026 (33,1 per cento). Pochi progetti (11) troveranno scadenza nel 2025, mentre uno solo nel 2023.

Con riguardo allo stato di avanzamento fisico e finanziario, si evidenzia che non sono disponibili i dati su tutti i progetti oggetto della ricognizione. Tutti i dati forniti, relativi ai singoli progetti, sono contenuti in appendice.

Come anticipato, la misura 1 comprende un unico progetto¹², finalizzato a fornire assistenza tecnica sia a livello centrale che locale, mediante l'assunzione di trenta esperti (effettuata, nei termini, entro il 31 dicembre 2021) e l'istituzione di una segreteria tecnica e di *task force* territoriali. Al 31 dicembre 2022, sono stati rinnovati i contratti di ventisette esperti e sono stati conferiti due nuovi incarichi in sostituzione di due esperti cessati, mentre lo stato di avanzamento finanziario è di pagamenti effettuati per euro 1.742.856,00 su una dotazione totale di euro 9.635.000,00 (18,09 per cento). In sede istruttoria, la Regione ha segnalato alcune criticità nell'attuazione del progetto, dovute al fatto che le disposizioni di attuazione hanno posto vincoli che hanno messo seriamente in discussione l'utilità e l'efficacia

¹² Cup G31B21007480006

dell'intervento, ed in particolare:

- divieto di supporto alle amministrazioni, sia regionali che locali, per l'attuazione di progetti del PNRR diversi dal progetto "1000 esperti";
- divieto di prestazione lavorativa a supporto delle strutture dell'amministrazione regionale per la gestione del progetto 1000 esperti;
- divieto di rendicontazione di talune attività necessariamente propedeutiche agli obiettivi del progetto (monitoraggio, analisi della normativa, coordinamento etc).

Inoltre è stata segnalata la difficoltà, da parte degli esperti, a comprendere il funzionamento della pubblica amministrazione, trattandosi di professionisti. Infine, l'amministrazione regionale ha segnalato che le comunicazioni con il Dipartimento della funzione pubblica sono estremamente difficoltose e che la piattaforma ReGis, da utilizzare per la rendicontazione, ad oggi non è pienamente operativa.

Per quanto concerne la misura 2, su sei progetti, due sono in fase di verifica della progettazione esecutiva¹³, uno è in fase di approvazione del progetto (già conclusa la fase dell'approvazione della progettazione esecutiva, tuttavia, a causa dell'adeguamento dei prezzi sono necessarie ulteriori risorse, da reperire, per euro 300 mila)¹⁴, mentre per un altro progetto è stata conclusa la gara di affidamento dei lavori ma la procedura è stata oggetto di ricorso al Tar¹⁵. Si tratta, in tutti i casi, di progetti vertenti su misure per la gestione del rischio di alluvione e per la gestione del rischio idrogeologico.

Nell'ambito della misura 5, i quattro progetti relativi al potenziamento dei centri per l'impiego (M5C1I1.1) registrano uno stato di avanzamento finanziario abbastanza elevato (100 per cento in 2 casi¹⁶, 88 in uno¹⁷ e 20 in un altro¹⁸). Per quanto riguarda i 26 progetti riguardanti il *social housing* (Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA - M5C2I2.3.1)¹⁹, dalla rilevazione emerge che – sebbene si tratti di progetti aventi termine al

¹³ Cup G36B20001090005 e G48B20001870002.

¹⁴ Cup G67H21000530001.

¹⁵ Cup G57H20002010001.

¹⁶ Cup G32E21002820005 e G31D21000790007.

¹⁷ Cup G31D21000800007.

¹⁸ Cup G31D21000810007.

¹⁹ Cup C27H21000230001, C27H21000240001, C27H21000250001, G29J21000270001, G23D00000000005, G24E21000060008, G24E21000040001, G29J21000210001, G25F21000050001, G27H21000270001, G26G21000020001, G27H21000340005, G24E21000050001, G25F21000040001, G25F21000070001, G27H21000350005, G27H21000360001, G28I21000420005, C39J21003050001, F77I21000010001, H73D21000170006, F77I21000020001, F77I21000030001, F77I21000040001, F77I21000050001, F77I21000060001.

30 giugno 2026 - questi risultano destinatari, dal punto di vista dell'avanzamento finanziario, della liquidazione di un'anticipazione pari al 10 per cento da calcolarsi sull'assegnazione di euro 44.828.281,83. Il cronoprogramma prevede l'adozione di una determina a contrarre entro il 30 agosto 2023 (per 18 interventi, per gli ulteriori 8 entro il 6 ottobre 2023), la fine dei lavori entro il 31 marzo 2026 e il collaudo entro il 30 giugno 2026. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la Regione ha segnalato criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'*iter* procedurale di approvazione dei progetti.

Passando all'esame dei progetti afferenti alla misura 6, i 26 relativi all'implementazione delle centrali operative territoriali (COT - M6C1I1.2.2)²⁰, tutti con scadenza al 30 giugno 2024, risultano essere per la maggioranza alla fase della progettazione o dell'assegnazione del CIG. Alcuni dei progetti, inoltre, sono stati interessati da rimodulazioni finanziarie²¹. Per quanto concerne l'avanzamento finanziario, data la fase ancora iniziale di realizzazione, nella maggior parte dei casi non risultano pagamenti.

Per quanto concerne i progetti della misura 6 relativi al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (ospedali di comunità - M6C1I1.3), 11 progetti con scadenza al 30 giugno 2026²², si trovano tutti in fase di progettazione (preliminare in 5 casi, definitiva in 4, in 2 risulta affidata). L'avanzamento finanziario è pari a zero (eccetto un caso in cui sono stati effettuati pagamenti per euro 20.054,72, CUP E57H22001020001).

Con riferimento alla misura M6C1I 1.1 (Case della Comunità e presa in carico della persona), l'importo complessivo dell'investimento è di euro 44.030.923 e prevede la realizzazione di 32 progetti con scadenza al 30 giugno 2026²³. Gli interventi sono quasi tutti in fase di

²⁰ Cup D54E21003770001, D57H22000920001, D57H22000930001, D64E22000290006, D97H22000810001, E24E22000700001, E24E22000710001, E25F22000640001, E27H22000870001, E44E22000400001, E57H22001010001, E74E21049180006, E76G22000230006, E79J22001300001, G32C22000560005, G32C22000580005, G32C22000590005, G32C22000600005, G32C22000610005, G32C22000620005, G34E22000490001, G36G22000110006, I13D22000280007, I22C22000180007, I24E22000650007, I34E22000320007.

²¹ Cup G32C22000560005, G32C22000580005, G32C22000590005, G32C22000600005, G32C22000610005, G32C22000620005.

²² Cup D57H22000970001, D97H21008210001, I18I22000130007, E49J22001530001, E69J22001470001, G37H22000860006, G37H22000840006, E57H22001020001, I67H22000980007, G22C22000260006, G42C22000290006.

²³ Cup D57H22000940001, G37H22000820006, I62C22000110007, E77H22001880001, G27H22000780006, G37H22000760006, G37H22000780006, G37H22000790006, G37H22000800006, G37H22000810006, G47H22001180006, E43D22000380001, E43D22000370001, E57H22000980001, E43D22000390001, G37H22000770006, G37H22000830006, D57H22000950001, E29H09000250003, D47H22000690001, D57H22000960001, E67H22000940001, E93D22000700001, G77H22001000006, I13D22000290007,

progettazione (preliminare in 4 casi, definitiva o esecutiva in 8, in un caso è stato stipulato il contratto di affidamento lavori). L'avanzamento finanziario è pari ad euro 109.241,03 su un ammontare autorizzato di euro 44.030.923,00.

Riguardo alla misura M6C2I1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile concernente interventi di adeguamento antisismico, per euro 15.343.202,00²⁴ è a valere sui fondi PNRR, mentre per euro 34.824.460,00²⁵ è a valere sul PNC. Gli investimenti si trovano in fase di progettazione (4 in fase preliminare), tuttavia va considerato che il cronoprogramma prevede a T1 2023 (31 marzo 2023) la pubblicazione gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN. La Sezione si riserva di monitorare il rispetto delle scadenze.

I progetti relativi all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (M6C2I1.1.1) sono complessivamente 28, per un valore complessivo di euro 60.490.903,95, di cui 8 terminati, 13 in fase di progettazione/lavori da avviare e 6 in fase di svolgimento dei lavori. Si fa presente che, come già anticipato (cfr. appendice), in questo intervento rientrano numerosi dei progetti indicati dalla Regione come non finanziati dal PNRR, sebbene presenti in ReGis.

Passando, poi, ad esaminare i progetti vertenti sull'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature - M6C2I1.1.2), che comprende 61 progetti con scadenza 31 dicembre 2024²⁶, dalle informazioni trasmesse, 11 risultano fermi in attesa della stipula di un accordo quadro da parte di Consip, in 11 casi le apparecchiature risultano da

I22C22000190007, D77H22000870001, D97H21008200001, E21B22000830001, E34E22000200001, G32C22000570005, G34E22000100008.

²⁴Cup D91B22000730001, C31B22001290006, D71B22001030001, G32C22000220006, G32C22000230006, G36G22000020006, E51B22001640001, I86G22000060007.

²⁵ Cup I66G22000050006, I15F22000480003, G62C22000130001, C31B22001300001, C31B22001310001, C31B22001320001, E66G22000180001, G35F21001800004, G33D21005740008.

²⁶ Cup C34E22000190006, C34E22000200006, C34E22000210006, C34E22000220006, C34E22000230006, C34E22000240006, C34E22000250006, C34E22000260006, C34E22000270006, C34E22000280006, D54E22000250003, D54E22000260003, D54E22000270003, D54E22000280003, D54E22000290003, D74E22000270003, D74E22000280003, D74E22000290003, D74E22000300003, D94E22000340003, E24E22000670001, E24E22000680001, E24E22000690001, E44E21053210006, E44E21053220006, E44E21053230006, E44E21053240006, E44E21053250006, E44E21053260006, E44E21053270006, E54E22000120001, E54E22000130001, E74E21049170006, G31B22001330006, G34E22000230001, G34E22000310001, G34E22000320001, G34E22000330001, G34E22000360001, G34E22000380001, G34E22000400001, G34E22000410001, G34E22000420001, G34E22000430001, G34E22000440001, G36G22000010006, G37G22000010002, G37G22000030005, G37G22000040005, G39J22000440005, G39J22000450005, G74E22000800001, I19J22001250007, I29J22000930007, I69J22001360007, I69J22001370007, I69J22001380007, J39I22000090006, J39I22000100006, J39I22000110006, J39I22000120006.

acquistare, 10 progetti sono in fase di gara mentre per 27 la procedura di gara si è conclusa e in quattro casi le apparecchiature risultano già in uso. L'avanzamento finanziario, pertanto, ha in questi casi carattere dicotomico, essendo concluso nei soli casi in cui le apparecchiature sono state consegnate e collaudate, fermo in tutti gli altri casi.

Per quanto concerne, infine, l'ultima categoria di progetti rientranti nella misura 6 (verso un ospedale sicuro e sostenibile - M6C2I1.2, 9 progetti con scadenza al 30 giugno 2026²⁷), risultano principalmente trovarsi alla fase di progettazione e nessun pagamento risulta effettuato.

ii. *Trasparenza, tracciabilità e sostenibilità degli investimenti*

La Regione ha precisato che al fine di garantire in contabilità finanziaria l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento dei progetti specifici e, quindi, di permettere la tracciabilità della gestione delle risorse PNRR/PNC (cfr. art 3 DM Ministero dell'economia e delle finanze del 11 ottobre 2021), anche ai fini della rendicontazione, è stata adottata una idonea codifica "parlante" per i capitoli di entrata e di spesa all'interno del bilancio regionale, distinguendo, altresì, le risorse provenienti dal Fondo Complementare e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, la descrizione dei capitoli in questione è stata integrata con codici alfanumerici riportanti la codifica ministeriale di identificazione dell'intervento o riforma, come previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*". Nello specifico, sono state indeterminate le Missioni, Componenti, Interventi e Sub-Interventi.

La Regione ha, altresì, riferito che sulla base della codifica impiegata, sono stati anche adottati, sul sistema di contabilità, appositi classificatori e riclassificatori associati ai singoli capitoli bilancio di PNRR/PNC, appositamente individuati da specifici indicatori permettendo una reportistica selettiva dei dati di gestione anche per i relativi monitoraggi, coerentemente con la gerarchia delle singole voci di classificazione ministeriale (missione, componente, intervento, sub intervento). Inoltre, con riferimento alle risorse del PNRR

²⁷ Cup C31B22001290006, D71B22001030001, D91B22000730001, E51B22001640001, G32C22000220006, G32C22000230006, G36G22000020006, I86G22000060007, G34D22000340001.

dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, i capitoli sono stati dotati anche di un ulteriore codice sul bilancio gestionale, al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite al finanziamento con fondi sanità, secondo l'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011.

Poiché ogni capitolo di spesa finanziaria, normalmente, più progetti, è stato implementato il sistema informatico contabile regionale (SICER) mediante l'introduzione di un meccanismo automatico che prevede l'inserimento obbligatorio del CUP in ogni singola transazione contabile (entrata/uscita), in modo da garantire la tracciabilità dei singoli progetti.

Sotto questo profilo, si rileva che le descrizioni dei capitoli non riportano indicazione del CUP, contrariamente a quanto previsto dal Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR allegato alla circolare RGS n.29 del 26 luglio 2022, laddove si richiede che *“Al fine di garantire la perimetrazione prevista dall'art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP”*.

In caso di progetti già in essere poi rientrati nel PNRR, è stato chiesto di specificare se si fosse proceduto alla perimetrazione, con riferimento alle annualità precedenti oramai rendicontate, integrando le descrizioni dei capitoli, originariamente finanziati da risorse statali, con l'indicazione della missione, componente, investimento e del CUP. L'amministrazione ha comunicato che è stato individuato, ad oggi, un unico investimento (M5 C1 I 1.1 “Potenziamento dei centri per l'impiego”) per il quale è stata richiesta ed effettuata la sola ridenominazione di un capitolo di spesa già esistente. Regione Liguria ha precisato che *“è in corso un'analisi con il nostro partner tecnologico finalizzata ad una implementazione informatica che consenta di riclassificare eventuali capitoli di spesa già esistenti riconducibili alla casistica dei “progetti in essere”, al fine di garantire i richiesti requisiti di tracciabilità.”*

Per il dettaglio dei capitoli di entrata e di spesa, al 31 dicembre 2022, relativi ai fondi PNRR e PNC, con il corrispondente stanziamento nel triennio 2022-2024, si rimanda all'appendice.

Riguardo, infine, alla sostenibilità, Regione Liguria ha spiegato che provvede all'attuazione e alla realizzazione degli interventi PNRR e PNC con le proprie risorse umane, già impegnate ed assegnate all'ordinaria attività connessa ai fini istituzionali dell'ente, assicurando, come previsto dal d.lgs. n. 118/2011, il rispetto degli equilibri finanziari, sussistendo, quindi, una condizione di aggravio a carico del personale dell'ente, stante l'impossibilità di utilizzare risorse PNRR per assunzioni a tempo determinato di personale qualificato anche per le attività di monitoraggio, coordinamento e controllo nella realizzazione delle misure PNRR/PNC.

Il Collegio osserva che Regione Liguria non ha fornito spiegazioni in ordine al futuro impatto finanziario degli investimenti che sta realizzando in qualità di soggetto attuatore, né circa la sostenibilità degli stessi. Pertanto, sarebbe opportuno che l'amministrazione procedesse ad elaborare una previsione quali-quantitativa di benefici e costi associati ai progetti, anche mediante una attualizzazione dei valori futuri.

iii. Controlli

Per quanto concerne le metodologie di *audit*, con particolare riferimento al controllo di regolarità amministrativo-contabile, dalla risposta della Regione emerge che non sono stati previsti, allo stato e con riferimento ai progetti PNRR, strumenti specifici di controllo aggiuntivi a quelli ordinari (cfr. art. 4, l.r. 6 aprile 2022, n. 4). L'amministrazione ha segnalato, con particolare riguardo alle attività di controllo, che le strutture regionali impegnate in interventi/progetti PNRR sono in attesa dell'approvazione di documenti di illustrazione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) da parte delle Unità di Missione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi, con le relative allegate *check list* di controllo da applicare. Sul punto, Regione Liguria ha fatto presente di aver rinnovato l'invito alle amministrazioni centrali di provvedere alla definizione dei rispettivi Si.Ge.Co. definendo *check list* omogenee tra loro.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione della corruzione e le procedure antiriciclaggio di competenza del RPCT, sono state illustrate le misure intraprese nel 2022 e quelle che saranno implementate nel corso del 2023, con riserva di integrarle di pari passo con l'emanazione da parte dei soggetti nazionali competenti di ulteriori raccomandazioni in merito. Nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ed in particolare

della sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza”, di Regione Liguria (Giunta Regionale), viene attuata la mappatura dei processi a rischio e la definizione di misure specifiche di prevenzione per ciascuno di essi. Il suddetto Piano 2022-2024 prevede inoltre diverse misure generali che, riporta la Regione nella propria risposta ISTRUTTORIA, sono idonee a prevenire e contrastare le irregolarità menzionate²⁸. L’amministrazione ha, inoltre, evidenziato che nella sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2023-2025, di imminente adozione, si è ritenuto di rafforzare ed integrare ulteriormente le misure generali menzionate, al fine di rendere più efficace la prevenzione ed il contrasto ai rischi evidenziati anche dalla Corte dei conti, segnalando, in particolare, che riguardo alla misura 13.1.6 (Osservanza degli obblighi in materia di conflitto di interesse), le modifiche consisteranno:

²⁸ Con riferimento al PIAO 2022-2024 sono state, ad esempio, indicate:

-La misura generale 13.1.2 ha ad oggetto la vigilanza sull’applicazione del Codice di Comportamento del personale dell’ente; tale Codice prevede varie disposizioni espressamente rivolte ad attuare il principio di separazione delle funzioni (si vedano ad es. gli artt. 12 e 17) oltre che a contrastare i conflitti di interesse (artt. 6 e 7, cui è specificamente rivolta la misura 13.1.7 infra).

- La misura generale 13.1.3 ha ad oggetto i casi e le modalità di rotazione ordinaria periodica del personale dirigenziale e dei funzionari con responsabilità di posizione organizzativa direttamente coinvolto nelle attività ad elevato rischio di corruzione (in applicazione delle “Disposizioni in materia di rotazione ordinaria e straordinaria del personale della Giunta della Regione Liguria” approvate con DGR n. 1158 del 30/12/2020 e conseguente attuazione del Piano delle rotazioni adottato annualmente con decreto del Segretario Generale).

- La misura generale 13.1.4 riguarda invece la rotazione “straordinaria” del personale in caso di avvio di procedimenti penali e disciplinari per condotte di natura corruttiva (art. 16, comma 1, lett. l quater – D.lgs. n. 165/2001). Per quanto riguarda la verifica dell’assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità da parte del personale che opera nelle aree a maggior rischio, nonché l’attività di vigilanza da parte del dirigente sul rispetto delle regole previste dal codice di comportamento e, in particolare, delle regole in materia di conflitto di interessi, incompatibilità e cumulo d’impieghi da parte del personale assegnato al suo ufficio, si evidenziano la già menzionata misura generale 13.1.2 (Osservanza del codice di comportamento del personale) e, soprattutto, le seguenti:

- misura generale 13.1.5 (Osservanza degli obblighi in materia di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/20213, dell’art. 6 bis della legge 241/1990, dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001);

- misura generale 13.1.6 (Osservanza degli obblighi in materia di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016);

- misura generale 13.1.7 (Osservanza dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi);

- misura generale 13.1.8 (Monitoraggio per verificare l’esistenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati);

- misura generale 13.1.9 (Verifica dell’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39/2013 al momento di attribuzione incarichi e/o nomine e verifica annuale di insussistenza di cause di incompatibilità);

- misura generale 13.1.11 (verifica e monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 nel caso di costituzione di commissioni, assegnazioni di uffici e incarichi dirigenziali).

- La misura generale 13.1.10 ha ad oggetto l’attuazione della normativa sul divieto di svolgere, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso Regione Liguria, attività lavorative o professionali presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta alle dipendenze di Regione; la misura definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 53 comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

- nel considerare tra i soggetti responsabili della misura, in ogni caso, tutte le strutture responsabili di attività, fasi, passaggi, relativi a procedure di affidamento di contratti pubblici inerenti la realizzazione di interventi e l'impiego di risorse di cui al PNRR, PNC e ai fondi strutturali;

- nel precisare, nel senso di rendere maggiormente dettagliato, il modello di dichiarazioni da richiedere nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

- nella previa individuazione e verifica del "titolare effettivo" ai fini della normativa sull'antiriciclaggio e nel verificare anche in capo ed in relazione ad esso l'assenza di conflitti di interessi.

Riguardo alla misura generale 13.1.10 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro), le modifiche consisteranno:

- nell'estensione dell'ambito di operatività a tutte le Strutture responsabili per la realizzazione di interventi e la gestione di risorse PNRR, PNC, fondi strutturali;

- nell'incrementare la quota di verifiche da effettuare rispetto all'effettiva osservanza dei divieti dopo la cessazione dal servizio.

Regione Liguria ha ritenuto, inoltre, di prevedere anche un'apposita misura generale che attui una più diretta integrazione tra la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed il sistema di prevenzione della corruzione. Tale ulteriore misura avrà ad oggetto:

- l'indicazione in maggior dettaglio delle modalità concrete, degli strumenti ed ausili utilizzabili per l'applicazione delle "Disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" (già approvate da Regione con DGR n. 599 del 12/07/2019);

- la conseguente acquisizione, nell'ambito dell'attività/processo, e valutazione degli elementi idonei a individuare, in raffronto agli indicatori di anomalia, le operazioni sospette di riciclaggio.

iv. Sistema ReGis

In merito all'utilizzo del sistema ReGiS, la Regione Liguria ha sottolineato le ancora numerose difficoltà ad interagire con il relativo servizio di assistenza, nonché i tempi lunghi necessari per il rilascio delle utenze da parte delle amministrazioni centrali titolari degli investimenti.

Inoltre, è stato riferito che più volte è stata richiesta da parte delle regioni la possibilità di estrapolare dal sistema, con il profilo di “visualizzatore”, le informazioni sui progetti di pertinenza e la conseguente reportistica, che costituirebbe fondamentale strumento per la verifica dei dati nonché per le attività di monitoraggio e di controllo da parte delle strutture regionali.

Regione Liguria ha segnalato il permanere di numerose difficoltà nell'utilizzo, già evidenziate in diverse sedi istituzionali, dovute alla farraginosità delle operazioni, alla scarsa immediatezza di approccio al sistema stesso e alla parziale attivazione delle funzionalità complessivamente previste.

Infine, è stato comunicato di aver provveduto alle attività di competenza sul sistema ReGiS, sottolineando comunque come ad oggi, per alcuni interventi, le amministrazioni centrali titolari non abbiano ancora provveduto al caricamento dei dati di “anagrafica” dei progetti impedendo, di fatto, l’operatività da parte del “soggetto attuatore”.

v. Governance regionale del PNRR

La *governance* regionale del PNRR è già stata esaminata da questa Sezione in sede di parificazione del rendiconto 2021 della Regione Liguria, pertanto, per un’analisi dettagliata, si rimanda alla relazione allegata alla deliberazione n. 47/2022/PARI.

In sintesi, in attuazione della l.r. 5 marzo 2021, n. 2, art. 6, c. 1 - che al fine dell’attuazione di programmi regionali aventi valenza strategica o per il raggiungimento di risultati determinati coerenti con il programma di Governo, ha previsto l’istituzione di apposite strutture di missione aventi durata temporanea, comunque non superiore alla durata della legislatura - con d.g.r. n. 541 del 22 giugno 2021, la Giunta ha definito un sistema organizzativo per la realizzazione del PNRR, che si compone di una cabina di regia e delle menzionate strutture di missione. Alla cabina di regia²⁹ sono attribuiti i compiti di verificare l’avanzamento del Piano, monitorare l’efficacia delle iniziative di potenziamento della

²⁹ Essa è composta dal presidente della Giunta regionale e dagli assessori regionali, nonché, in forma allargata, dal presidente di Anci Liguria, dal sindaco metropolitano, dai presidenti delle province, dai presidenti delle camere di commercio, dai presidenti delle autorità portuali, dal rettore dell’università degli studi di Genova, dal presidente e dal vice presidente della commissione speciale di studio *Next Generation UE* (NGUE - istituita con D.C.R. 29 marzo 2021, n. 2) e dalle parti datoriali e sindacali. Con d.g.r. n. 19/2022 questa è stata integrata con i segretari regionali delle organizzazioni sindacali confederali liguri, con il presidente di Confindustria Liguria e con i presidenti di altre associazioni di categoria liguri maggiormente rappresentative.

capacità amministrativa, assicurare la cooperazione con gli *stakeholders* ed interloquire con le amministrazioni responsabili in caso di criticità, proporre le modifiche normative necessarie per la più efficace implementazione del PNRR e curare i rapporti con il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria. Sono state istituite sette strutture di missione, una competente per la realizzazione del coordinamento centralizzato e le altre competenti ciascuna per l'attuazione delle sei missioni del PNRR.

La d.g.r. sopra menzionata ha, altresì, previsto che al termine di ogni trimestre di attività delle strutture di missione, la Giunta relazioni alla competente Commissione consiliare in merito all'attività svolta e, in particolare, sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e dei compiti affidati.

Nel 2022 sono state approvate tre relazioni trimestrali con d.g.r. n. 437 del 20 maggio, n. 731 del 29 luglio e n. 117 del 18 novembre. Tali relazioni, che comprendono una disamina, per ogni investimento, degli atti posti in essere nel trimestre di riferimento, tuttavia, figurano alcuni investimenti non presenti nei dati forniti dalla Regione e comunque presenti in ReGis (es. M1C1- investimento 7.2 competenze digitali di base; M1C1 – investimento 1.4.2 servizi digitali e cittadinanza digitale; M1C1 – investimento 1.4.3 adozione piattaforma PagoPa, M1C3- investimento 2.2 tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale).

vi. Regione Liguria come stazione appaltante

Per i progetti in cui la Regione riveste solamente il ruolo di stazione appaltante, si è chiesto di indicare il CUP, il CIG, il tipo di procedura di scelta del contraente seguita, l'importo a base d'asta, il termine per l'esecuzione del contratto e se è stato rispettato l'obbligo *“di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile”*, ovvero se si sia operato ai sensi del c. 7 dell'art. 47 del d.l. n. 77/2021, che prevede che *“le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

L'Amministrazione ha fornito le seguenti informazioni:

CUP	Descrizione CUP	CIG	Denominazione Soggetto Attuatore	Procedura seguita	Importo a base d'asta	Termine previsto per l'esecuzione del contratto	E' stato rispettato l'obbligo "di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile
847H20001590004	REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE LERONE IN LOCALITA' LEROLA*LEROLA*REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE LERONE IN LOCALITA' LEROLA	957495814E	COMUNE DI COGSOLETO	SUAR. GARA A PROCEDUR NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI COGSOLETO (GE) DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE LERONE IN LOC. LEROLA. FINANZIAMENTO PNRR M2C4 INT 2.2	174,155.35	180 GIORNI	si
ES7H2000470006	VIA ISTRIA 1ABC*VIA MILANO*RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CREAZIONE NUOVI ALLOGGI	956137848B	AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L' EDILIZIA (A.R.T.E.) DELLA PROVINCIA DI SAVONA	S.U.A.R. PER CONTO DI A.R.T.E. SAVONA - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.L. N. 76/2020 E SS.MM.II., PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CREAZIONE NUOVI ALLOGGI NEL FABBRICATO ERP VIA ISTRIA NEL COMUNE DI SAVONA - FONDO COMPLEMENTARE PNRR - DPCM 15.09.2021	3,186,348.77	547 GIORNI	applicata la deroga di cui all'articolo 47, comma 7, del d.l. n. 77/2021
8E7H20001150001	MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN LOCALITA' ROSSO, PARAVAGNA E BREGALLO*ROSSO - PARAVAGNA - BREGALLO*REALIZZAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO STRADALE	94545079FC	COMUNE DI DAVAGNA	SUAR. GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, PER CONTO DEL COMUNE DI DAVAGNA (GE) PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RETICOLO STRADALE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI DAVAGNA NELLE LOCALITA' CASTELLUCCO - SCOFFERA - BREGALLO - MORANEGO - COLLETTA - PASTE - CAFENARDO - ROSSO - NOKETO - SEZURA - VALLE - CALVARI - PIANE DI ROSSO	256,000.00	290 GIORNI	si
ES9I2011040001	VIA PARTIGIANI CIVICI DA 4 A 34*VIA PARTIGIANI 4 - 34*REALIZZAZIONE DI EFFICIENTAMENTO SISMICO, CAPPOTTATURA, RIFACIMENTO COPERTURA E SOSTITUZIONE INFESSI	95710296FC	AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L' EDILIZIA (A.R.T.E.) DELLA PROVINCIA DI SAVONA	S.U.A.R. PER CONTO DI A.R.T.E. SAVONA - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.L. N. 76/2020 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO NEL FABBRICATO ERP VIA DEI PARTIGIANI CIV DA 4 A 34 NEL COMUNE DI ALBENGA - FONDO COMPLEMENTARE PNRR - DPCM 15.09.2021	1,834,106.97	420 GIORNI	applicata la deroga di cui all'articolo 47, comma 7, del d.l. n. 77/2021
GE1819000320001	SP3 - VIA PIANOGRANDE E VIA CORTINO*VIA PIANOGRANDE-CORTINO*MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE PROTETTO	950981104D	COMUNE DI CASELLA	SUAR. GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI CASELLA (GE) DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE PROTETTO LUNGO LA S.P. 3 VIA PIANOGRANDE E VIA CORTINO. FINANZIAMENTO PNRR - M2C4INT 2.2	365,028.01	240 GIORNI	si
ES2D17000160005	A.R.T.E. - AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE EDILIZIA DI SAVONA - ADEGUAMENTO CANNE FUMARIE VIA QUINTANA E VIA BRESCIANA A SAVONA*VIA QUINTANA E VIA BRESCIANA*ADEGUAMENTO CANNE FUMARIE	958002243F	AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L' EDILIZIA (A.R.T.E.) DELLA PROVINCIA DI SAVONA	S.U.A.R. PER CONTO DI A.R.T.E. SAVONA - PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. N. 77/2021 E SS.MM. II, DEI LAVORI AD OGGETTO: "FABBRICATI ERP VIA BRESCIANA CIVV. 13-17-21 E VIA QUINTANA CIVV. - 3-5-7-11-13 A SAVONA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- FONDO COMPLEMENTARE PNRR DPCM 15.09.2021"	1,000,000.00	360 GIORNI	applicata la deroga di cui all'articolo 47, comma 7, del d.l. n. 77/2021

Fonte: Regione Liguria

vii. Il progetto bandiera

I «Progetti bandiera», di cui all'art. 33, c. 3, lettera b), del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152 (Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021), convertito, con modificazioni, dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233, sono progetti aventi particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma.

La Regione Liguria ha individuato come proprio Progetto bandiera la realizzazione del primo "Centro Nazionale di Medicina Computazionale", finalizzato al trasferimento sulla clinica dei risultati della ricerca generati dall'impiego del calcolo computazionale ai modelli biologici ed ai programmi di gestione delle tecnologie robotiche d'impiego biomedico nonché al loro successivo sviluppo nella fase prototipale. L'obiettivo strategico del Progetto è quello di realizzare una struttura ibrida d'avanguardia, in grado di esaltare le sinergie tra le conoscenze generate dalla ricerca scientifica più avanzata, le potenzialità innovative dell'industria ad alto contenuto tecnologico, e le esigenze di un ospedale moderno che crede

nella necessità di un approccio personalizzato alla cura. La realizzazione del primo “Centro Nazionale di Medicina Computazionale” prevede, in particolare:

- per quanto attiene alla componente sanitaria, la realizzazione di un ospedale moderno capace di fornire un approccio innovativo al percorso di cura dei pazienti e allo stesso tempo di offrire i dati al centro di ricerca attraverso l’implementazione di processi intelligenti, sicuri e rispettosi della regolamentazione europea in materia di protezione dei dati. Il centro dovrà utilizzare “a Km zero” le soluzioni computazionali e di innovazione tecnologica generate nei laboratori di ricerca e nell’officina dei partner industriali realizzando un paradigma di integrazione circolare e quasi immediata tra paziente, dato, innovazione e cura;
- per quanto attiene alla componente scientifica, la messa a fattor comune di conoscenze e potenzialità già esistenti con lo scopo di coordinare, finalizzare e focalizzare gli sforzi in modo strutturato, aumentando così la competitività verso realtà internazionali, fungendo da volano nella produzione di competenze e conoscenze a livello nazionale, ispirando e supportando lo sviluppo di soluzioni tecnologiche in grado di alimentare la capacità dell’industria biomedicale nazionale di competere nell’arena dei mercati internazionali.

Il direttore generale del dipartimento salute e servizi sociali di Regione Liguria, con il decreto del 27 giugno 2022, ha istituito e nominato il Comitato Strategico Istituzionale, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS)³⁰ ed il Gruppo Tecnico.

³⁰ Il CTS è costituito da due commissioni: una componente clinico organizzativa ed una scientifica. La sinergia emersa tra le diverse componenti volte alla valutazione sanitaria, scientifica e clinico – organizzativa, ha riportato in sede istruttoria la Regione, ha permesso di individuare i due pilastri, uno di tipo sanitario e uno di tipo scientifico, alla base del progetto bandiera:

- una struttura clinica destinata ad assicurare la risposta ospedaliera per l’area del ponente, quale parte dell’hub sanitario metropolitano e regionale, con una quota di posti letto focalizzati sulle specialità cliniche maggiormente *tech-computational intensive*; l’inquadramento territoriale, demografico e l’analisi dei cambiamenti in atto in ambito epidemiologico nella Regione hanno consentito di individuare le funzioni da insediare ed il dimensionamento dell’offerta sanitaria del nuovo Ospedale del Ponente Genovese, in linea con i principi di riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale descritti nei D.M. n. 70 del 2015, D.M. n.77 del 2022 e nel P.S.R. 2023- 2025 di ormai prossima approvazione e pubblicazione;
- un centro di ricerca di medicina computazionale e tecnologica (CMCT) completamente integrato con il sistema sanitario regionale, che valorizzi e coordini le competenze e le risorse degli enti di ricerca e delle aziende che operano nel campo delle scienze della vita del territorio e permetta la progettazione lo sviluppo e la validazione di nuove soluzioni tecnologiche immediatamente trasferibili sul paziente; il centro di ricerca è composto da l’area di laboratori-officina di ricerca traslazionale per iniziative di

Regione Liguria ha proposto al Ministero della Salute l'inquadramento del progetto bandiera nell'ambito delle iniziative di investimento immobiliare INAIL, di cui al D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, delineando il quadro complessivo delle fonti di finanziamento del progetto stesso, del costo stimato in 405 milioni, come segue:

1. risorse di cui all'art. 56-bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (programma di investimento INAIL) relativamente all'acquisizione delle aree, alla progettazione e alla realizzazione delle strutture destinate alle attività di assistenza sanitaria e di ricerca traslazionale e di base collegate alle attività cliniche per un ammontare stimato in 280 milioni; tale ammontare rappresenta l'investimento INAIL per la realizzazione edilizia completa "cielo-terra" del Centro Nazionale di Medicina Computazionale;

2. risorse derivanti da finanziamento ex art. 20 della legge 67/1988 relativamente alle dotazioni tecnologiche, tecniche e arredi per un ammontare stimato di 60 milioni di cui: 54 milioni da prevedersi nella programmazione regionale a valere sulle risorse stanziare con la legge n. 234/2021 e 6 milioni da prevedersi nella programmazione regionale a valere sulle risorse assegnate alla Liguria con la legge n. 178/2020;

3. risorse derivanti da PNNR, Missione 1 Componente 2; Missione 4 Componente 2; Missione 6 Componente 1, Missione 6 Componente 2, relative al finanziamento delle ulteriori dotazioni tecnologiche, delle infrastrutture di ricerca di base e dei programmi di attività scientifica di base e traslazionale per un ammontare stimato di 65 milioni.

Con la deliberazione della giunta regionale n. 518 del 7 giugno 2022 è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e la Regione, con oggetto "Modalità di collaborazione per la realizzazione del progetto bandiera della Regione Liguria ai sensi dell'art. 33, comma 3, lett. b) del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, "Centro Nazionale di Medicina Computazionale". Il Protocollo di intesa è stato sottoscritto l'11 ottobre 2022. Con DPCM del 14 settembre 2022, il Progetto è stato inserito tra le iniziative di investimento immobiliare

partnership con le unità di R&S delle industrie operanti nel settore delle tecnologie e delle computer science applicato al settore biomedico.

di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 56- *bis* del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 valutabili da INAIL.

È stato, inoltre, redatto un documento di progetto contenente un riepilogo dei contenuti e una traduzione dimensionale dei fabbisogni necessari in termini di superfici e volumetrie. Con argomento di giunta del 28 dicembre 2022, la giunta ha condiviso i contenuti di tale atto; inoltre, la Regione ha avviato una fase di confronto con INAIL al fine di definire nel dettaglio le procedure di realizzazione dell'investimento afferente alla realizzazione della struttura ospedaliera destinata ad ospitare il centro di medicina computazionale.


5. CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA E LA SPEZIA

i. Ricognizione dei progetti

Sulla base delle risultanze istruttorie fornite dagli enti interessati (per una disamina dei dati disaggregati, si rimanda all'appendice), i progetti finanziati risultano essere 68, di cui 4 rientranti nella misura 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), 3 nella 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), 47 nella 4 (istruzione e ricerca), e 14 nella 5 (inclusione e coesione).

Per quanto concerne il valore complessivo, si assesta ad euro 112.043.956,00, con un importo finanziato pari ad euro 100.128.956,00. Esaminando il valore dei fondi assegnati ai progetti rientranti nelle varie misure, risulta che sulla misura 1 sono stati previsti finanziamenti per euro 56.000,00, per euro 13.020.039,00 sulla misura 2, per euro 49.095.913,00 sulla misura 4 e per euro 37.957.004,00 sulla misura 5.

Grafico n. 6 – Distribuzione dei progetti (a) e dei finanziamenti (b) tra le misure

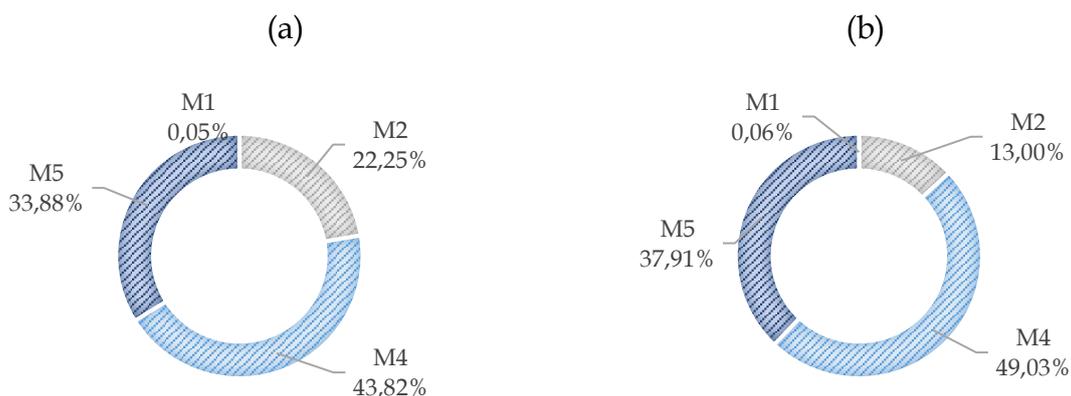


Fonte: elaborazione dati istruttoria

Dai grafici emerge che la misura che attrae più risorse è la 4, assorbendo più del 40 per cento delle stesse, mentre la misura 1 risulta destinataria di circa lo 0,06 per cento dei fondi. In tema di rapporto tra finanziamento e costo del progetto, le missioni 1, 4 e 5 registrano il finanziamento integrale delle opere, mentre la missione 2 vede una copertura dei progetti pari al 52,22 per cento.

Per quanto concerne l'attuazione, sulla base delle risposte fornite dagli enti (che hanno riguardato 68 progetti), risulta che 27 sono in fase di progettazione, 27 in fase di aggiudicazione, 11 in fase di attuazione/esecuzione dei lavori e 3 sono conclusi.

Grafico n. 7 – Fase di esecuzione

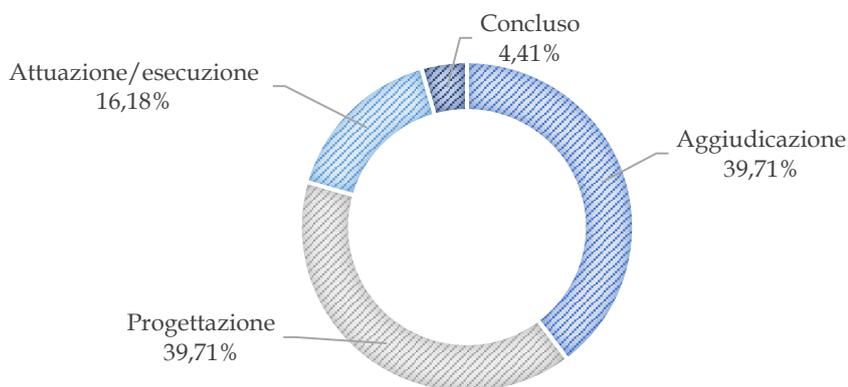

Fonte: elaborazione dati istruttoria

Sulla base dei dati raccolti in istruttoria, emerge che, al 31 dicembre 2022, sono stati effettuati pagamenti per euro 5.583.425,40 per complessivi 35 progetti, mentre gli enti hanno ricevuto anticipazioni per euro 11.480.407,73 relativamente a 45 progetti. Pertanto, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato come rapporto tra il costo dei progetti ed i pagamenti effettuati è pari all' 11,46 per cento.

ii. Trasparenza, tracciabilità e sostenibilità degli investimenti

Per quanto concerne la trasparenza e la tracciabilità degli investimenti, i quattro enti hanno confermato di aver previsto specifiche misure.

La Città metropolitana di Genova e le quattro province hanno comunicato di aver predisposto una distinta contabilizzazione degli investimenti, con appositi capitoli del PEG, al fine di garantire il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa, e integrato la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP.

La Città metropolitana e la Provincia di Imperia hanno confermato che, nel caso di più opere finanziate con il medesimo decreto, è stato previsto un distinto capitolo per ogni progetto. La Provincia della Spezia ha comunicato di aver proceduto alla perimetrazione in un solo caso di progetto "in essere", con riferimento alle annualità precedenti oramai rendicontate, non essendo, però, potuta intervenire sulla modifica della descrittiva dei capitoli di spesa.

La verifica della sostenibilità degli investimenti è stata effettuata dalla Provincia della Spezia nei documenti di programmazione. Per quanto attiene il Bilancio 2021/2023, in riferimento alla disponibilità e alla gestione delle risorse umane, si è proceduto con decreto presidenziale n. 34 del 21 aprile 2022 con variazioni di bilancio ed aggiornamento del Piano delle Opere e del Piano fabbisogno di personale. Con conseguente determinazione dirigenziale del settore segreteria generale n. 383 del 29 aprile 2022, si è disposta l'assunzione di personale dedicato, nella misura di 3 unità tecniche. Per quanto attiene il Bilancio 2022/2024, l'ente ha proceduto con deliberazione di consiglio provinciale n.13 del 1° giugno 2022 all'approvazione degli allegati del DUP 2022/2024. Anche la Provincia di Imperia, nell'ambito delle verifiche sulla sostenibilità, ha avviato un piano assunzionale incentrato sui fabbisogni dei servizi coinvolti nell'attuazione del PNRR.

La Città metropolitana di Genova ha confermato di aver provveduto a verificare preventivamente la sostenibilità degli investimenti, anche con riferimento agli equilibri, alla

disponibilità e alla gestione delle risorse umane, in relazione alla struttura organizzativa dello stesso in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

La Provincia di Savona ha riportato di aver effettuato la valutazione della sostenibilità “a monte”, evidenziando come il PNRR abbia introdotto scadenze maggiormente vincolanti, che al momento sono comunque rispettate.

iii. Controlli

La Provincia di Savona ha comunicato di aver provveduto alla modifica del regolamento dei controlli interni, nonché alla nomina di un responsabile del monitoraggio delle misure PNRR, oltre che alla creazione di una unità organizzativa di controllo composta da tre membri. L'unità si riunisce periodicamente e provvede a verifiche a campione.

La Provincia di Imperia ha implementato il sistema di *audit* mediante l'introduzione di controlli specifici e l'adozione di linee guida per i controlli interni PNRR/PNC che individuano gli ambiti delle verifiche in:

- aspetti amministrativo-contabili con particolare riguardo alla tracciabilità finanziaria e ai controlli antifrode;
- rispetto del divieto di doppio finanziamento;
- verifica dell'assenza di conflitto di interessi tra i soggetti coinvolti;
- obblighi di trasparenza e rendicontazione;
- compatibilità del programma dei pagamenti del PNRR-PNC con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con l'obbligo di garantire un fondo cassa non negativo al 31 dicembre di ogni esercizio;
- obbligo di tenuta e conservazione di tutti gli atti;
- tipologie di procedure di affidamento;
- rispetto dei tempi previsti per target e milestone e coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con il bilancio dell'ente.

La Provincia della Spezia, con decreto dirigenziale del settore segreteria generale n.1009 del 17 ottobre 2022, ha creato un gruppo di lavoro finalizzato all'elaborazione di *check list* di controllo ed indicatori di anomalie. Il gruppo di lavoro è costituito da un presidente, due funzionari amministrativi ed un funzionario tecnico. La *check list* è stata creata per effettuare controlli in tema di rispetto della regolarità amministrativa e contabile, delle condizionalità

PNRR, dei principi trasversali e per l'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità.

La Città metropolitana di Genova ha provveduto ad implementare un sistema interno di *audit*, attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni, al fine di contrastare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli interventi a valere sul PNRR. L'ente ha segnalato di aver ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 37001:2016 in data 18 novembre 2021 e di disporre di un sistema di gestione integrato UNI EN ISO 37001:2016 (prevenzione della corruzione) e UNI EN ISO 9001:2015 (qualità) che consentono un controllo costante e oggettivo dei processi interni. Inoltre, in linea con quanto previsto dal nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2022) relativamente alla fase dell'esecuzione del contratto (Art. 71 della direttiva 2014/24/UE e art. 88 della direttiva 2014/25/UE; art. 105 d.lgs. n. 50/2016, come da ultimo modificato dal d.l. n. 77/2021), sono stati previsti dei controlli *in loco*, periodici e a sorpresa, al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato. Rispetto alla prevenzione frodi, con decreto del sindaco metropolitano n.33 del 25 maggio 2022, è stata nominata la Segretaria e Direttrice Generale "Gestore delle segnalazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo" e con direttiva Prot. 63319/2022 sono state definite e divulgate le "Misure organizzative in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio". Già dal 2022, infine, alcuni obiettivi di *performance* sono stati correlati al raggiungimento delle milestone previste dal PNRR.

iv. Sistema ReGis

Gli enti hanno confermato di aver posto in essere le specifiche attività di implementazione della piattaforma ReGis, in coerenza con quanto descritto nel sistema di gestione e controllo del PNRR e nella manualistica ad esso collegata.

6. COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

L'indagine sui comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti ha coinvolto ventuno enti della Liguria e, in particolare, i comuni di Alassio, Albenga, Arcola, Arenzano, Bordighera, Cairo Montenotte, Chiavari, Finale Ligure, Genova, Imperia, Lavagna, La


Spezia, Loano, Rapallo, Sanremo, Sarzana, Savona, Sestri Levante, Taggia, Varazze, Ventimiglia.

i. Ricognizione dei progetti

Sulla base delle risultanze istruttorie fornite dagli enti interessati (per una disamina dei dati disaggregati, si rimanda all'appendice), i progetti finanziati risultano essere 441, di cui 95 rientranti nella misura 1, 143 nella 2, 41 nella 4, 154 sulla 5 e 8 finanziati da PNC.

Per quanto concerne il valore complessivo, si assesta ad euro 1.182.293.978,07, con un importo finanziato pari ad euro 852.473.295,44. Andando ad esaminare il valore dei fondi assegnati ai progetti rientranti nelle varie misure, risulta che sulla misura 1 sono stati previsti finanziamenti per euro 22.153.943,91, per euro 324.172.411,13 sulla misura 2, per euro 61.071.649,77 sulla misura 4, per euro 375.105.290,63 sulla misura 5 ed euro 69.970.000,00 con fondi PNC.

Grafico n. 8 – Distribuzione dei progetti (a) e dei finanziamenti (b) tra le misure

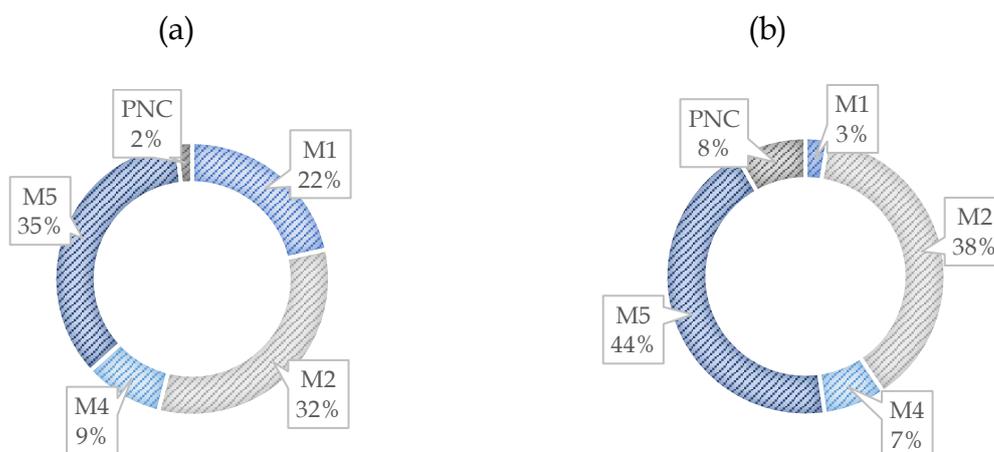


Fonte: elaborazione dati istruttoria

Dai grafici risulta come la misura che drena più risorse sia la 2, assorbendo il 54,15 per cento delle stesse, mentre la misura 1, sebbene presenti un alto numero di progetti (quasi un quarto) risulta destinataria di circa l'1,9 per cento delle risorse. I fondi PNC assicurano la copertura totale del costo del progetto. A seguire, la misura 5 è quella che presenta un maggiore rapporto tra finanziamento e costo del progetto (98 per cento), seguita dalla misura 1 (98,37 per cento) e dalla misura 4 (91,41 per cento). Nel caso della misura 2, che concentra, in termini assoluti, il maggior volume di finanziamenti, questi ultimi coprono circa la metà dei costi totali dei progetti (50,63 per cento).

Per quanto concerne l'attuazione, sulla base delle risposte fornite dagli enti (che hanno riguardato 438 progetti), risulta che 184 sono in fase di progettazione, 2 sono in fase di pubblicazione del bando, 103 in fase di aggiudicazione/contratto firmato, 80 in fase di attuazione/esecuzione dei lavori, 6 in fase di collaudo e 63 sono conclusi.

Grafico n. 9 – fase di esecuzione

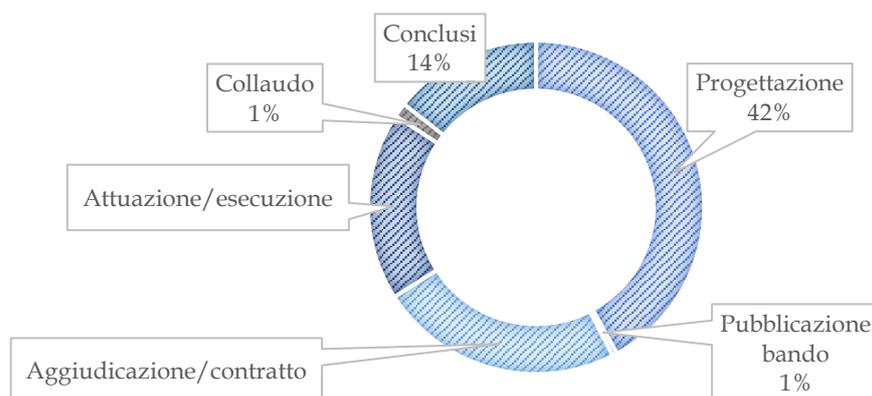

Fonte: elaborazione dati istruttoria

Sulla base dei dati raccolti in istruttoria, emerge che, al 31 dicembre 2022, sono stati effettuati pagamenti per euro 28.673.348,34 per complessivi 176 progetti, mentre gli enti hanno ricevuto anticipazioni per euro 84.214.894,77 relativamente a 196 progetti. Complessivamente, quindi, lo stato di avanzamento finanziario, calcolato come rapporto tra il costo dei progetti ed i pagamenti effettuati è pari allo 2,43 per cento.

Emerge, pertanto, come lo stato di avanzamento complessivo sia ancora ad una fase piuttosto embrionale, difatti, sebbene i progetti siano, per la maggior parte, avviati, quasi la metà degli stessi è alla fase della progettazione, con conseguente lentezza nell'esecuzione dei pagamenti.

Per quanto concerne, invece, le criticità segnalate dai comuni attuatori, emergono, in larga parte, difficoltà nell'utilizzo del sistema ReGis, principalmente per quanto concerne il caricamento dei dati, con alcune segnalazioni di ritardo nel caricamento da parte delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. Inoltre, in alcuni casi, il costo dei progetti inizialmente previsto, sulla base del quale è stata anche calcolata la parte di compartecipazione con fondi PNNR, è stato rivisto in aumento, sebbene, si ricorda che al fine di neutralizzare l'aumento dei prezzi, sono state previste specifiche misure anche con

riferimento ai lavori finanziati con risorse PNRR/PNC (cfr. l. 29 dicembre 2022, n. 197, cc. 369-379). In alcuni casi, inoltre, sono state segnalate difficoltà di comunicazione ed interazione con le amministrazioni centrali.

ii. Trasparenza, tracciabilità e sostenibilità degli investimenti

Per quanto concerne la trasparenza e la tracciabilità delle risorse, la quasi totalità degli enti oggetto di istruttoria (19)³¹ ha dichiarato di aver adottato una distinta contabilizzazione per tali risorse (in alcuni casi, a partire dal 2023, es. Comuni di Sarzana e Sestri Levante), indicando, in alcuni casi, anche gli specifici capitoli di entrata e di spesa dedicati (es. Comune di Loano) ed in altri, di aver previsto un capitolo *ad hoc* per ogni singola opera anche in caso di più opere finanziate con lo stesso decreto (es. Comune di Finale Ligure). Ad ogni modo, nelle future verifiche che la Sezione condurrà, anche nell'ambito degli ordinari controlli finanziari *ex art. 148-bis* Tuel, assumerà un'importanza centrale la verifica della corretta e distinta contabilizzazione di dette risorse, al fine di evitare una commistione delle stesse con gli altri fondi nella disponibilità dell'ente e, conseguentemente, un utilizzo per finalità diverse da quelle degli investimenti cui sono dedicate.

Con riferimento alla perimetrazione dei progetti già in essere, poi ricompresi nel PNRR, la maggior parte degli enti (17)³² ha dichiarato di averla effettuata (tra gli enti che, invece, hanno comunicato di non avervi proceduto vi sono i Comuni di Cairo Montenotte e di Sestri Levante, quest'ultimo ha riferito che, ai fini della perimetrazione, sono stati creati fascicoli di rendicontazione depositati negli uffici). Anche in questo caso, si rende opportuno proseguire nel monitoraggio al fine di verificare la corretta contabilizzazione dei flussi finanziari relativi agli interventi in discorso.

Per quanto concerne la sostenibilità degli investimenti, la maggior parte dei comuni interpellati ha dichiarato di aver effettuato delle verifiche in merito³³, sebbene in alcuni casi

³¹ Comuni di Alassio, Albenga, Arcola, Bordighera, Cairo Montenotte, Chiavari, Finale Ligure, Genova, Imperia, Lavagna, La Spezia, Loano, Rapallo, Sanremo, Sarzana, Savona, Sestri Levante, Varazze e Ventimiglia. I Comuni di Arenzano e Taggia non hanno fornito risposte.

³² Comuni di Alassio, Albenga, Arcola, Bordighera, Chiavari, Finale Ligure, Genova, Imperia, Lavagna, La Spezia, Loano, Rapallo Sanremo, Sarzana, Savona, Varazze e Ventimiglia. I Comuni di Cairo Montenotte e Sestri Levante hanno fornito risposta negativa mentre quelli di Arenzano e Taggia non hanno fornito risposte.

³³ Comuni di Alassio, Albenga, Arcola, Bordighera, Chiavari, Finale Ligure, Genova, Imperia, Lavagna, La Spezia, Loano, Rapallo Sanremo, Sarzana, Sestri Levante, Varazze e Ventimiglia. I Comuni di Cairo Montenotte e Savona hanno fornito risposta negativa mentre quelli di Arenzano e Taggia non hanno fornito risposte.

non si è trattato di verifiche specifiche bensì di carattere ordinario. In alcuni casi è stata segnalata la carenza di personale utile ai fini della gestione degli investimenti (es. Comuni di Sarzana e Sestri Levante), ed in altri è stato comunicato che al fine della gestione degli investimenti PNRR sono stati previsti nuovi piani assunzionali (Comuni di Genova e Imperia) o si è ricorso a risorse esterne (es. Comune di Ventimiglia). In altri casi, invece, come in quello dei Comuni di Savona e di Cairo Montenotte, non si è proceduto ad effettuare specifiche verifiche sulla sostenibilità in quanto la maggior parte delle opere da realizzare non comporta, a detta degli enti, oneri futuri.

iii. Controlli

La maggior parte dei comuni interpellati ha dichiarato di aver proceduto ad un'implementazione dell'*audit* (11)³⁴, mentre 8 enti hanno ritenuto sufficientemente strutturati i sistemi dei controlli interni già in essere.

Tra le risposte positive, figurano differenti modalità di implementazione dell'*audit*. Alcuni enti stanno procedendo alla creazione di unità organizzative preposte al monitoraggio e al controllo dell'attuazione dei progetti. Ad esempio, il Comune di Chiavari sta creando un apposito gruppo di lavoro che comprende i componenti dei diversi uffici coinvolti nell'attuazione di progetti PNRR e l'ufficio di ragioneria; il Comune di Finale Ligure sta revisionando il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza creando un tavolo tecnico tra i diversi responsabili che operi come nucleo di coordinamento, monitoraggio e controllo per l'attuazione del PNRR ed intende modificare il regolamento sui controlli interni per prevedere controlli specifici. La creazione di una struttura di coordinamento specifica è in corso di costituzione anche presso il Comune di La Spezia, mentre quello di Sanremo ha già istituito una "struttura di attuazione del PNRR", costituita da una cabina di regia e da una struttura organizzativa multisetoriale (deliberazione della giunta n. 150/2022) e ha, altresì, predisposto uno strumento informatico che consente di monitorare il rispetto di obiettivi e tempistiche. Il Comune di Savona ha istituito l'Unità di Verifiche di controllo amministrativo/contabile e di legalità (*ex* determina del Segretario generale n.2245 del 9 giugno 22 in attuazione della deliberazione della giunta comunale

³⁴ Comuni di Alassio, Arcola, Bordighera, Chiavari, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Rapallo, Sanremo, Sarzana e Savona. I Comuni di Albenga, Cairo Montenotte, Lavagna, Loano, Sestri Levante, Varazze e Ventimiglia hanno fornito risposta negativa mentre quelli di Arenzano e Taggia non hanno fornito risposte.

n.61/2022). L'Unità ha provveduto alla verifica di tutti gli atti emessi nel 2022 relativi al PNRR.

Il Comune di Genova, poi, sta adottando un manuale operativo per il sistema di gestione e controllo, mentre quello di Imperia sta approvando delle linee guida organizzative dei controlli interni PNRR-PNC, prevedendo attività che riguarderanno la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto del divieto di doppio finanziamento, la verifica dell'assenza del conflitto di interessi di tutti i soggetti coinvolti, il rispetto degli obblighi di trasparenza e rendicontazione, la compatibilità di tutti i pagamenti con la gestione della cassa per garantire un fondo cassa positivo a fine esercizio, il rispetto degli obblighi di conservazione e tenuta documentale degli atti, la tipologia di procedura di affidamento, il rispetto di *target* e *milestones*.

Il Comune di Rapallo, infine, ha adottato una specifica delibera (deliberazione della Giunta comunale n. 336/2022 "*Regolamentazione della governance locale per l'attuazione dei progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e adozione di misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti*") con cui è stato disciplinato un assetto organizzativo interno finalizzato ad agevolare l'azione amministrativa nei singoli segmenti di attuazione dei diversi progetti, coordinare i processi di propulsione da parte dei responsabili e garantire sia il rispetto di *target* sia l'ammissibilità di tutte le spese alla rendicontazione.

iv. Sistema ReGis


Una delle maggiori criticità emerse dall'attività istruttoria riguarda il sistema ReGis. Difatti, i comuni stanno procedendo, sebbene con qualche ritardo, ad alimentare il sistema, tuttavia numerosi enti hanno riscontrato difficoltà nell'utilizzo della piattaforma e, in particolare, nel caricamento e nella validazione dei dati. Inoltre, una segnalazione ricorrente è quella del ritardo con cui le amministrazioni centrali titolari procedono a caricare i dati riguardanti anche progetti da realizzarsi a livello locale, con conseguente impossibilità per i comuni di aggiornare il sistema. Inoltre, sono stati riscontrati casi di CUP duplicati. Un ente, poi, ha comunicato di essere ancora in attesa di ricevere le credenziali di accesso.

7. CONCLUSIONI

Dalla ricognizione effettuata sul campione esaminato, risultano attivi 690 progetti, per un finanziamento a valere sui fondi PNRR/PNC pari ad euro 1.198.232.247,55. Di questi, 198 sulla misura 5 (inclusione e coesione), 152 sulla 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), 144 sulla 6 (salute), 100 sulla 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività cultura e turismo) e 88 sulla 4 (istruzione e ricerca), mentre nessun progetto risulta attivo sulla misura 3 (infrastrutture per una mobilità sostenibile).

Sulla misura 1 risultano allocati euro 31.844.943,91, sulla 2 euro 384.017.402,61, sulla 4 euro 110.167.563, euro 459.826.271,62 sulla 5 ed euro 212.376.066,41 sulla 6.

Grafico n. 10 - Distribuzione dei progetti (a) e dei finanziamenti (b) tra le misure

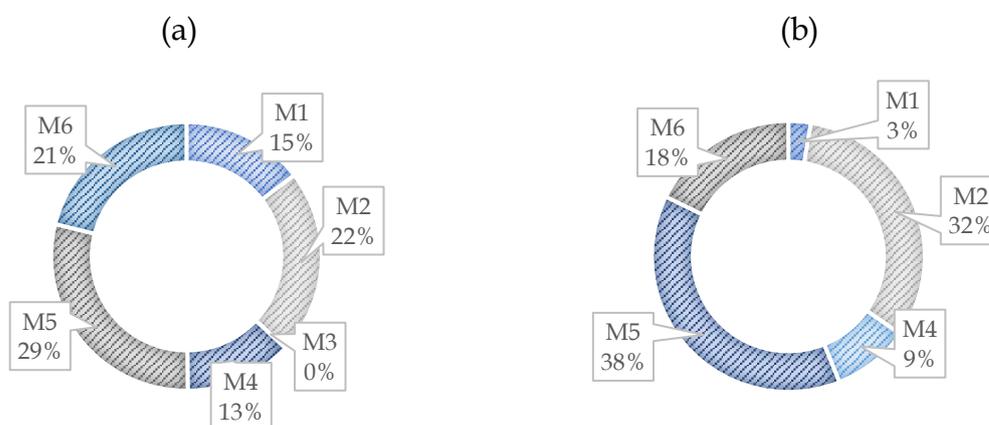

Fonte: elaborazione dati istruttoria

In termini generali, un primo dato che può trarsi da questa iniziale attività di ricognizione e di monitoraggio attiene alla difficoltà nel reperimento dei dati, o, più precisamente, alla possibilità di ottenere dati omogenei. Difatti, significative criticità sono state incontrate nell'incrociare e confrontare i diversi dati disponibili, che, molto spesso, si sono rivelati incongruenti. Sotto questo profilo, la Sezione deve rilevare come una delle principali difficoltà emerse, poiché segnalata dalla quasi totalità degli enti interpellati, attiene alla banca dati ReGis. Questa, infatti, risulta di non facile utilizzo per gli enti locali e per la Regione, che spesso hanno segnalato, altresì, il mancato inserimento dei progetti da parte delle amministrazioni titolari. Criticità sono state segnalate anche con riferimento all'attivazione delle utenze e alla validazione dei dati, nonché alla presenza di duplicazioni dei CUP.

Sempre in termini generali, dalle interlocuzioni con gli enti, è emersa la difficoltà nel gestire, con le risorse umane disponibili, le attività generate dalla gestione degli investimenti del PNRR/PNC. Tale problema, peraltro, se presente in enti di dimensioni maggiori, può rappresentare una significativa difficoltà, con conseguente impatto sulla realizzazione dei progetti, per gli enti di ridotte dimensioni, già spesso in difficoltà con la sola gestione ordinaria.

Si rileva, comunque, come molti enti abbiano costituito unità dedicate al PNRR/PNC, in alcuni casi anche ricorrendo a personale esterno. Queste iniziative sono senza dubbio commendevoli, specie laddove vengano create unità o gruppi di lavoro che coinvolgono profili che a diverso titolo sono interessati dall'attuazione dei progetti PNRR/PNC. Occorre, tuttavia, che tali unità forniscano un contributo concreto, non limitandosi a meri monitoraggi o richieste di dati, ma operando anche come coordinatori e, in una certa misura, promotori dell'attività delle diverse strutture coinvolte (e ciò, specialmente, negli enti di maggiore dimensione interessati da un numero considerevole di progetti, come la Regione). Passando ad esaminare aspetti più puntuali, dall'istruttoria effettuata emerge – per quanto attiene alla trasparenza ed alla tracciabilità degli investimenti – che la quasi totalità degli enti ha adottato una contabilizzazione specifica per i fondi del PNRR/PNC, sebbene non in tutti i casi sia stata prevista l'indicazione dei CUP anche nei capitoli di bilancio. Benché si comprenda come questo adempimento possa risultare particolarmente gravoso, specie nel caso di modifiche, va, comunque, evidenziata la necessità e l'importanza di tenere ben distinti ed individuabili i capitoli di bilancio e, in generale, le operazioni contabili relative a PNRR/PNC, al fine di evitare che i fondi a ciò dedicati vengano distratti dalla loro finalità per essere utilizzati per la gestione ordinaria. Si rimarca, poi, come assuma preminente importanza l'effettuazione di una preventiva verifica della sostenibilità, anche nel lungo periodo, degli investimenti, posto che la gestione delle opere realizzate implica dei costi che gli enti devono essere in grado di poter sostenere anche nel corso della gestione ordinaria a regime, al fine di scongiurare che gli eventuali oneri impattino, negativamente, sugli equilibri di bilancio.

Per quanto riguarda i controlli, l'indagine ha messo in luce che la maggior parte degli enti sta adeguando il proprio sistema di *audit*. Si raccomanda, comunque, di porre in essere ogni attività necessaria al fine di rendere il controllo efficace ed effettivo, invitando gli enti a

tenere in considerazione gli esiti dello stesso al fine di intervenire tempestivamente in caso si riscontrassero eventuali criticità.

Per quanto riguarda, infine, l'attuazione dei progetti, occorre rilevare che, ad eccezione di alcuni (in certi casi già in essere prima della loro inclusione nel PNRR), l'avanzamento risulta ancora ad uno stato iniziale, posto che, come emerso, la maggior parte di questi si trova alla fase della progettazione. Ciò va senz'altro messo in relazione al fatto che il 2022 è stato l'anno in cui la maggior parte dei progetti sono stati avviati, ma, allo stesso tempo, anche con le scadenze molto ravvicinate che alcuni progetti hanno e, in generale, con quella conclusiva del 2026. Ciò rileva, soprattutto, per quei progetti che prevedono la realizzazione di opere, considerando i tempi di esecuzione dei lavori e la possibilità di rischi ricorrenti come quelli dovuti al contenzioso. Essendo l'avanzamento dell'esecuzione ancora alla fase iniziale, conseguentemente anche quello finanziario risente dei ritardi nell'avvio.

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
G31B21007480006	ASS. TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE	9.635.000,00	M1C1I2.2.1	Assistenza tecnica a livello centrale e locale	Obiettivo al 31/12/2021: Completamento dell'assunzione degli esperti per l'attuazione del PNRR	30 esperti	Istituzione della Cabina di Regia regionale e adozione di eventuali disposizioni attuative- termine 10.12.2021; Inseadimento della Cabina di Regia. Definizione dei criteri di selezione, delle procedure selettive dei professionisti ed esperti nell'ambito dell'elenco fornito dal DFP e delle relative Commissioni esaminatrici- termine 17.12.2021; Conferimento degli incarichi ai professionisti ed esperti selezionati- termine 31.12.2021; Istituzione della Segreteria tecnica e delle task force territoriali e adozione di eventuali disposizioni attuative. Definizione dei relativi aspetti organizzativi/logistici- termine 21.01.2022; Designazione dei coordinatori della Segreteria tecnica e delle task force- termine 31.01.2022; Convocazione della Cabina di Regia in seduta congiunta con i Coordinatori della Segreteria tecnica e con i coordinatori delle task force - termine 31.01.2022; Adozione di un regolamento per il funzionamento della Cabina di regia e definizione del sistema per la pianificazione, gestione, verifica e monitoraggio- termine 15.02.2022; Definizione delle baseline (misurazione dei tempi effettivi delle procedure e dell'arretrato riferiti al primo semestre 2021)- termine 30.06.2022; Aggiornamento delle procedure complesse oggetto di intervento e dei relativi target- termine 30.07.2022; Report semestrale di monitoraggio- termine 31.12.2022	rinnovo di n. 27 contratti degli esperti e conferimento n.2 nuovi incarichi in sostituzione di 2 esperti cessati; modifica del Piano Territoriale di Regione Liguria	Al 31/12/2022 sono stati liquidati € 1.742.856,00	Le disposizioni di attuazione del progetto hanno posto vincoli che hanno messo seriamente in discussione l'utilità e l'efficacia dell'intervento, ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • divieto di supporto alle amministrazioni, sia regionali che locali, per l'attuazione di progetti del PNRR diversi dal progetto "1000 esperti"; • divieto di prestazione lavorativa a supporto delle strutture dell'amministrazione regionale per la gestione del progetto 1000 esperti; • divieto di rendicontazione di talune attività necessariamente propedeutiche agli obiettivi del progetto (monitoraggio, analisi della normativa, coordinamento etc); Inoltre vi è la difficoltà, da parte degli esperti, a comprendere il funzionamento della pubblica amministrazione, trattandosi di professionisti. Si evidenzia che le comunicazioni con il Dipartimento della Funzione Pubblica sono estremamente difficoltose e la piattaforma Regis da utilizzare per la rendicontazione ad oggi non è pienamente operativa.
G11B22001380009	TIRRENICA-Liguria	19.293.478,26	M2C2I4.1.1	Ciclovie Turistiche	entro il 31/12/2023: notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili (milestone); entro il 30/06/2026 realizzazione di 1 235 km di piste ciclabili aggiuntive (target) di cui 41 km in Liguria (DM n. 4 del 12/01/2022)	km di piste ciclabili aggiuntive	entro il 31/08/23 aggiudicazione definitiva di tutti i lotti funzionali mediante procedura di appalto integrato; entro il 31/09/2023 consegna sotto le riserve di legge di tutti i lotti funzionali con contestuale avvio progettazione esecutive e cantierizzazioni; entro il 31/12/2023 verifica, validazione e approvazione progetti esecutivi di tutti i lotti funzionali; entro il 30/06/2024 realizzazione di almeno il 20% del valore complessivo dei lavori; entro il 30/06/2026 emissione ed approvazione dei certificati provvisori di collaudo tecnico-amm.vo e statico (ove richiesto)			
D30F2200020008	CUP Liguria - Treni TPL	16.752.777,17	M2C2I4.4.2	Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale	milestone: sottoscrizione contratti relativi alle forniture entro il 30 giugno 2023 milestone: acquisto di almeno 1 treno entro il 31 dicembre 2024 target completamento del programma delle forniture entro il 30 giugno 2026	Numero di treni messi in servizio	30/6/2023: sottoscrizione contratti fornitura; 31/12/2023: acquisto di almeno un treno; 30/6/2026 termine della fornitura			
G48B20001870002	REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DI OPERE DI DIFESA IDRAULICA IN SPONDA DESTRA DEL FIUME VARA	930.000,00	M2C4I2.1.B	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	M2C4-00-ITA-8: Percentuale di lavori aggiudicati per interventi di tipo D (relativi alla riduzione del rischio residuo connesso all'evento) (30/06/2025) M2C4-00-ITA-11: Completamento degli interventi di tipo D (30/06/26)		Inizio Lavori 06/2023_ Fine Lavori 03/2024	PAUR conclusa Progetto esecutivo in fase di verifica	27.957,46	

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
G67H21000530001	LAVORI DI SOTTOMURAZIONE DI UN TRATTO DI ARGINATURA IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE ARGENTINA COMPRESO TRA IL PONTE ROMANICO E L'EX MERCATO COPERTO	1.000.000,00	M2C4I2.1.B	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	M2C4-00-ITA-8: Percentuale di lavori aggiudicati per interventi di tipo D (relativi alla riduzione del rischio residuo connesso all'evento) (30/06/2025) M2C4-00-ITA-11: Completamento degli interventi di tipo D (30/06/26)		Inizio Lavori 06/2023_ Fine Lavori 01/2024	Progettazione esecutiva conclusa la verifica, in attesa di validazione e approvazione del progetto, necessaria integrazione delle risorse per coprire il QE dell'intervento.	62.678,56	Necessità di reperire ulteriori € 300.000,00 da fondi non PNRR per garantire copertura q.e. a seguito adeguamento prezzi
G57H20002010001	INTERVENTO STRUTTURALE URGENTE DI SISTEMAZIONE ARGINE DISSESTATO IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME CENTA IN FREGIO A VIA LUNGOCENTA CROCE BIANCA COMPRESO TRA PIAZZA PETRARCA E VIA XXV APRILE	1.500.000,00	M2C4I2.1.B	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	M2C4-00-ITA-8: Percentuale di lavori aggiudicati per interventi di tipo D (relativi alla riduzione del rischio residuo connesso all'evento) (30/06/2025) M2C4-00-ITA-11: Completamento degli interventi di tipo D (30/06/26)		Inizio Lavori 06/2023_ Fine Lavori 02/2024	Progettazione esecutiva verificata, validata e approvata Conclusioni gara affidamento lavori con aggiudicazione da parte della SUAR con D.D. n. 8343/2022 del 28/12/2022	95.283,77	In attesa della decisione del TAR Liguria sulla sospensiva richiesta da un operatore economico escluso dalla procedura di gara
G36B20001090005	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO FOCIVO DEL TORRENTE ARGENTINA A VALLE DEL PONTE DELLA VIA AURELIA	7.348.697,05	M2C4I2.1.B	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	M2C4-00-ITA-8: Percentuale di lavori aggiudicati per interventi di tipo D (relativi alla riduzione del rischio residuo connesso all'evento) (30/06/2025) M2C4-00-ITA-11: Completamento degli interventi di tipo D (30/06/26)		Inizio Lavori 06/2023_ Fine Lavori 05/2024	Conclusa conferenza dei servizi Progettazione esecutiva in fase di verifica (progettazione finanziata con fondi non PNRR)	(progettazione finanziata con fondi non PNRR)	In attesa del completamento della progettazione degli interventi finalizzati all'eliminazione dei sottoservizi interferenti da parte dell'ente d'ambito (provincia di Imperia) per poter avviare la gara dei lavori.
G31D21000790007	LIGURIA DIGITALE - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO LIGURI IN REGIME DI POTENZIAMENTO*VIA REGIONE LIGURIA*LIGURIA DIGITALE - ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI PER I CENTRI PER L'IMPIEGO LIGURI IN REGIME DI POTENZIAMENTO	100.000,00	M5C1I1.1	Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)	1) entro il 2022, almeno 250 CPI distribuiti su tutto il territorio nazionale devono aver completato il 50% delle attività (escluse le infrastrutturali) previste nei Piani regionali; 2) Entro il 2025, almeno 500 CPI distribuiti su tutto il territorio nazionale devono aver completato tutte le attività previste nei Piani regionali.	n. 13 su 13 CPI liguri coinvolti nel potenziamento infrastrutturale in termini di sistemi informativi e di attrezzature informatiche	Dal 01/06/2021 al 31/12/2021 (durata della singola fornitura)	100%	100%	
G31D21000800007	LIGURIA DIGITALE - UPGRADE CENTRALE TELEFONICA DI REGIONE LIGURIA ACQUISIZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE PER CONSENTIRE L'UPGRADE DELLA CENTRALE TELEFONICA DI REGIONE LIGURIA A SEGUITO DELLE NUOVE ASSUNZIONI NEI CPI*VIA REGIONE LIGURIA*LIGURIA DIGITALE - UPG	210.000,00	M5C1I1.1	Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)	1) entro il 2022, almeno 250 CPI distribuiti su tutto il territorio nazionale devono aver completato il 50% delle attività (escluse le infrastrutturali) previste nei Piani regionali; 2) Entro il 2025, almeno 500 CPI distribuiti su tutto il territorio nazionale devono aver completato tutte le attività previste nei Piani regionali.	n. 13 su 13 CPI liguri coinvolti nel potenziamento infrastrutturale in termini di sistemi informativi e di attrezzature informatiche	Dal 25/05/2021 al 31/12/2021	100% acquisto server e licenze aggiuntive e 80% acquisto telefonia	88%	

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
G31D21000810007	LD - PROGETTAZIONE E SUPPORTO PER IL LAYOUT INFRASTRUTTURALE DEI CPI DI REGIONE LIGURIA*VIA REGIONE LIGURIA*LD - PROGETTAZIONE E SUPPORTO PER IL LAYOUT INFRASTRUTTURALE DEI CPI DI REGIONE LIGURIA	476.909,04	M5C1I1.1	Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)	1) entro il 2022, almeno 250 CPI distribuiti su tutto il territorio nazionale devono aver completato il 50% delle attività (escluse le infrastrutturali) previste nei Piani regionali; 2) Entro il 2025, almeno 500 CPI distribuiti su tutto il territorio nazionale devono aver completato tutte le attività previste nei Piani regionali.	n. 13 su 13 CPI liguri coinvolti nel potenziamento infrastrutturale in termini di sistemi informativi e di attrezzature informatiche	Dal 01/04/2021 al 31/12/2021 (durata della singola fornitura)	100% attività di progettazione e 5% per l'acquisto delle dotazioni necessarie al restyling dei CPI	20%	
G32E21002820005	LIGURIA DIGITALE - POTENZIAMENTO DEL SIL DI REGIONE LIGURIA*VIA REGIONE LIGURIA*DIGITALE - POTENZIAMENTO DEL SIL DI REGIONE LIGURIA	1.148.786,12	M5C1I1.1	Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES)	1) entro il 2022, almeno 250 CPI distribuiti su tutto il territorio nazionale devono aver completato il 50% delle attività (escluse le infrastrutturali) previste nei Piani regionali; 2) Entro il 2025, almeno 500 CPI distribuiti su tutto il territorio nazionale devono aver completato tutte le attività previste nei Piani regionali.	n. 13 su 13 CPI liguri coinvolti nel potenziamento infrastrutturale in termini di sistemi informativi e di attrezzature informatiche	Dal 01/07/2021 al 31/12/2022 (durata della singola fornitura)	100%	100%	
G27H21000360001	CUP 17 - ID 162 Regione Liguria	14.000,00	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale	liquidazione anticipazione del 10% dell'importo		Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
G27H21000350005	CUP 16 - ID 162 Regione Liguria	50.000,00	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale	liquidazione anticipazione del 10% dell'importo		Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
G25F2100050001	CUP 9 - ID 162 Regione Liguria	104.870,00	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
G25F2100070001	CUP 15 - ID 162 Regione Liguria	142.000,00	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
C27H21000250001	CUP 3 - ID 162 Regione Liguria	267.555,02	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
F77I2100050001	CUP 6 - ID 165 Regione Liguria	389.818,00	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 06/10/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
G29J21000270001	CUP 4 - ID 162 Regione Liguria	455.900,00	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
F77I2100060001	CUP 7 - ID 165 Regione Liguria	518.821,00	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 06/10/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
C27H21000230001	CUP 1 - ID 162 Regione Liguria	595.558,05	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
G29J21000210001	CUP 8 - ID 162 Regione Liguria	612.725,00	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
G26G21000020001	CUP 11 - ID 162 Regione Liguria	620.864,39	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
G24E21000040001	CUP 7 - ID 162 Regione Liguria	627.755,23	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
F77I21000030001	CUP 4 - ID 165 Regione Liguria	645.780,00	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 06/10/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
G24E21000050001	CUP 13 - ID 162 Regione Liguria	668.980,48	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
G27H21000340005	CUP 12 - ID 162 Regione Liguria	690.000,00	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
C27H21000240001	CUP 2 - ID 162 Regione Liguria	1.012.232,40	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
G24E21000600008	CUP 6 - ID 162 Regione Liguria	1.072.063,00	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
G23D00000000005	CUP 5 - ID 162 Regione Liguria	1.293.761,40	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
H73D21000170006	CUP 2 - ID 165 Regione Liguria	1.561.461,00	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 06/10/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
G28I21000420005	CUP 18 - ID 162 Regione Liguria	1.781.958,00	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
G25F21000040001	CUP 14 - ID 162 Regione Liguria	1.899.709,03	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
F77I21000040001	CUP 5 - ID 165 Regione Liguria	2.174.794,00	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 06/10/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
G27H21000270001	CUP 10 - ID 162 Regione Liguria	2.932.268,00	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 03/08/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Cofinanziamento di opere a carico di privati. Criticità conseguenti a variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
F77I21000020001	CUP 3 - ID 165 Regione Liguria	3.108.439,00	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 06/10/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
F77I21000010001	CUP 1 - ID 165 Regione Liguria	6.586.983,00	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 06/10/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	Variazioni conseguenti all'iter procedurale di approvazione dei progetti
C39J21003050001	CUP 1 - ID 436 Regione Liguria	14.999.985,83	M5C2I2.3.1	Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	30/06/2026: ultimazione dei lavori e collaudo finale	indicatori di impatto ambientale, sociale, culturale, urbanistico-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale	entro il 06/10/2023: determina a contrarre, o atto equivalente; 31/03/2026. ultimazione dei lavori; 30/06/2026: collaudo finale		liquidazione anticipazione del 10% dell'importo	

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
D57H22000940001	OSPEDALE S.M. DI MISERICORDIA DI ALBENGA	€ 300.000,00	M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	1) Progettazione esecutiva in corso		
G37H22000820006	CASA DELLA COMUNITÀ - EX MANIFATTURA TAB	€ 300.000,00	M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	Progettazione preliminare in corso (PFTE)	0,00 €	
I62C22000110007	NUOVO OSPEDALE DI RAPALLO*VIA SAN PIETRO	€ 477.000,00	M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle CDC di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della CDC; T1 2026 CDC messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	Progettazione definitiva in corso	0,00 €	
E77H22001880001	DISTRETTO IMPERIESE - INTERVENTO DI RIST	€ 480.000,00	M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	1) Progettazione in corso (p. definitivo)	Importo liquidato pari ad € 0,00 oneri esclusi	

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
G27H22000780006	CASA DELLA COMUNITÀ - DISTRETTO 10 FRUGO	€ 500.000,00	M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	Progettazione preliminare in corso (PFTE)	0,00 €	L'intervento è stato sostituito con l'intervento relativo alla CdC Distretto 10 - Borgo Fornari-CUP G32C22000800006
G37H22000760006	CASA DELLA COMUNITÀ - DISTRETTO 9 FIUMAR	€ 500.000,00	M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	Codice CIG "lavori" assegnato	0,00 €	
G37H22000780006	CASA DELLA COMUNITÀ - DISTRETTO 12 GENO	€ 500.000,00	M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	Codice CIG "lavori" assegnato	0,00 €	
G37H22000790006	CASA DELLA COMUNITÀ DISTRETTO 13 QUARTO	€ 500.000,00	M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	Progetto preliminare in corso (PFTE)	11.459,19 €	

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
G37H22000800006	CASA DELLA COMUNITÀ - EX TECSALDO-COPROM	€ 500.000,00	M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	Codice CIG "lavori" assegnato	0,00 €	
G37H22000810006	CASA DELLA COMUNITÀ - MARTINEZ - DISTRET	€ 500.000,00	M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	Codice CIG "lavori" assegnato	0,00 €	
G47H22001180006	CASA DELLA COMUNITÀ - DISTRETTO 8 CAMPO	€ 500.000,00	M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	Progetto preliminare in corso (PFTE)	0,00 €	
E43D22000380001	REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ DEL	€ 550.000,00	M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	progettazione in corso (PFTE secondo linee guida MIMS PNRR)	€ 0,00	REDAZIONE DEL PROGETTO IN FASE DI COMPLETAMENTO

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
E43D22000370001	REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ DEL	€ 650.000,00	M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	progettazione in corso (PFTE secondo linee guida MIMS PNRR)	€ 0,00	REDAZIONE DEL PROGETTO IN FASE DI COMPLETAMENTO
E57H22000980001	DISTRETTO IMPERIESE - INTERVENTO DI RIST	€ 900.000,00	M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	3) codice CIG "lavori" assegnato	Importo liquidato pari ad € 0,00 oneri esclusi	
E43D22000390001	REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ DIST	€ 1.000.000,00	M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	progettazione in corso (PFTE secondo linee guida MIMS PNRR)	€ 0,00	REDAZIONE DEL PROGETTO IN FASE DI COMPLETAMENTO E POSSIBILE AUMENTO COSTI PREVISTI
G37H22000770006	CASA DELLA COMUNITÀ - ISTITUTO DORIA COR	€ 1.000.000,00	M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	Codice CIG "lavori" assegnato	0,00 €	

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
G37H22000830006	CASA DELLA COMUNITÀ - CELESIA PADIGLIONE	€ 1.000.000,00	M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	Codice CIG "lavori" assegnato	0,00 €	
D57H22000950001	DISTRETTO FINALESE - CASA DI COMUNITA*V	€ 1.027.950,00	M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	1) Progettazione definitiva in corso		
E29H09000250003	COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PER SER	€ 1.050.000,00	M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	1) Progettazione in corso (p. definitivo)	Importo liquidato pari ad € 0,00 oneri esclusi	
D47H22000690001	DISTRETTO SAVONESE - VADO LIGURE - CASA	€ 1.135.200,00	M6C1I1.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	1) Progettazione definitiva in corso	0	

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
D57H22000960001	DISTRETTO SAVONESE VIA COLLODI 13 - SAVO	€ 1.284.800,00	M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	1) Progettazione definitiva in corso		
E67H22000940001	DISTRETTO SANREMESE - INTERVENTO DI RIST	€ 1.330.000,00	M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	PROGETTAZIONE AFFIDATA	Importo liquidato pari ad € 0,00 oneri esclusi	
E93D22000700001	REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ DIST	€ 1.470.000,00	M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	progettazione in corso (PFTE secondo linee guida MIMS PNRR)	€ 0,00	REDAZIONE DEL PROGETTO IN FASE DI COMPLETAMENTO
G77H22001000006	CASA DELLA COMUNITÀ - DISTRETTO 13 RECCO	€ 1.545.517,00	M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	Codice CIG "lavori" assegnato	0,00 €	

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
I13D22000290007	DISTRETTO 16 - VILLA LAURA*VIA ARNALDO T	€ 1.720.000,00	M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	PROGETTAZIONE AFFIDATA		
I22C22000190007	EX POLO OSPEDALIERO DI CHIAVARI*VIA G.B.	€ 1.805.000,00	M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle CDC di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della CDC; T1 2026 CDC messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	Codice CIG lavori assegnato	26.947,81 €	
D77H22000870001	OSPEDALE DI SANTA CORONA - CASA DI COMUN	€ 2.059.200,00	M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche			
D97H21008200001	OSPEDALE S.GIUSEPPE DI CAIRO MONTENOTTE	€ 2.196.000,00	M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	1) Progettazione definitiva in corso		

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
E21B22000830001	REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ DEL DI	€ 3.000.000,00	M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	in data 14/01/2023 è stata indetta dal Comune di Bolano la conferenza dei servizi per la valutazione del progetto definitivo/esecutivo	€ 0,00	
E34E22000200001	DISTRETTO VENTIMIGLIESE - INTERVENTO DI	€ 4.254.354,00	M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	1) Progettazione in corso (SFTE avanzato)	Importo liquidato pari ad € 0,00 oneri esclusi	
G32C22000570005	REALIZZAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ PER IL	€ 4.995.902,00	M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	Progettazione esecutiva in corso	70834,03	
G34E22000100008	PALAZZO DELLA SALUTE DELLA VAL POLCEVERA	€ 5.000.000,00	M6C111.1	Case della Comunità e presa in carico della persona	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità; Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP (ossia si è avviata almeno una gara per l'opera ma non necessariamente tutte); T3 2023 Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità; T1 2026 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche	Contratto lavori stipulato	830,540,10	
D57H22000930001	DISTRETTO SAVONESE - VIA COLLODI 13 - CE	33.330,00	M6C111.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1	T4/2022: Assegnazione progetti idonei per indizione gare per implementazione COT; Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per realizzazione COT; T2 / 2023: Stipula contratti per realizzazione COT; T1 / 2024: COT pienamente funzionanti	3) codice CIG "lavori" assegnato	0	

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
E79J22001300001	REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA TERRI	50.000,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1	T4/2022: Assegnazione progetti idonei per indizione gare per implementazione COT; Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per realizzazione COT; T2 / 2023: Stipula contratti per realizzazione COT; T1 / 2024: COT pienamente funzionanti	CIG lavori assegnato	€ 0,00	
D57H22000920001	DISTRETTO FINALESE - FINALE LIGURE - CEN	79.200,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1	T4/2022: Assegnazione progetti idonei per indizione gare per implementazione COT; Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per realizzazione COT; T2 / 2023: Stipula contratti per realizzazione COT; T1 / 2024: COT pienamente funzionanti	3) codice CIG "lavori" assegnato	0	
I34E22000320007	EX POLO OSPEDALIERO DI CHIAVARI*VIA G.B.	133.258,98	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1 (realizzazione di un sistema di interconnessione a supporto delle COT)	completamento interventi 31/03/2024 collaudo entro il 30/06/2024	progettazione e condivisione in corso a livello regionale	0	
E24E22000710001	C FABBRICATI ASL N°1 IMPERIESE*VIA AURE	133.259,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1 Realizzazione dei sistemi tecnologici di supporto delle interconnessione delle COT	Collaudo entro 30/06/2024	in fase di progettazione e condivisione a livello regionale	0%	
I24E22000650007	EX POLO OSPEDALIERO DI CHIAVARI*VIA G.B.	138.400,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024 COT PIENAMENTE FUNZIONANTI	1 (Operatività device)	T2/2024 COT PIENAMENTE FUNZIONANTI	IN ATTESA DISPONIBILITA' AGGIUDICATARIO GARE CENTRALIZZATE		
I22C22000180007	EX POLO OSPEDALIERO DI CHIAVARI*VIA G.B.	139.500,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1	T4/2022: Assegnazione progetti idonei per indizione gare per implementazione COT; Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per realizzazione COT; T2 / 2023: Stipula contratti per realizzazione COT; T1 / 2024: COT pienamente funzionanti	codice CIG "LAVORI" ASSEGNATO	4.381,95 €	
E27H22000870001	DISTRETTO SANREMESE ED INTEMELIO - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI NELLA SEDE LEGALE ASLI LIGURIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - INTERVENTO RIENTRANTE NEL PNRR*VIA AURELI, 97*OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE AFFERENTI	160.000,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1	T4/2022: Assegnazione progetti idonei per indizione gare per implementazione COT; Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per realizzazione COT; T2 / 2023: Stipula contratti per realizzazione COT; T1 / 2024: COT pienamente funzionanti	3) codice CIG "lavori" assegnato	Importo liquidato pari ad € 5.637,93 oneri esclusi	
G32C22000560005	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - DISTRE	162.181,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1	T4/2022: Assegnazione progetti idonei per indizione gare per implementazione COT; Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per realizzazione COT; T2 / 2023: Stipula contratti per realizzazione COT; T1 / 2024: COT pienamente funzionanti	Codice "CIG" lavori assegnato	0,00 €	Nuovo CUP G32C22000870006 con Importo pari a € 446.475,00 a seguito di rimodulazione.
G32C22000580005	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - DISTRE	162.181,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1	T4/2022: Assegnazione progetti idonei per indizione gare per implementazione COT; Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per realizzazione COT; T2 / 2023: Stipula contratti per realizzazione COT; T1 / 2024: COT pienamente funzionanti	Progetto idoneo approvato	0,00 €	Nuovo CUP G32C22000880006 con Importo pari a € 11.610,00 a seguito di rimodulazione

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
G32C22000590005	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - DISTRE	162.181,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1	T4/2022: Assegnazione progetti idonei per indizione gare per implementazione COT; Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per realizzazione COT; T2 / 2023: Stipula contratti per realizzazione COT; T1 / 2024: COT pienamente funzionanti	Progetto idoneo approvato	0,00 €	Nuovo CUP G32C22000890006 con Importo pari a € 38.858,00 a seguito di rimodulazione
G32C22000600005	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - DISTRE	162.181,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1	T4/2022: Assegnazione progetti idonei per indizione gare per implementazione COT; Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per realizzazione COT; T2 / 2023: Stipula contratti per realizzazione COT; T1 / 2024: COT pienamente funzionanti	Progetto idoneo approvato	0,00 €	Nuovo CUP G32C22000910006 con Importo pari a € 37.601,00 a seguito di rimodulazione
G32C22000610005	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - DISTRE	162.181,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1	T4/2022: Assegnazione progetti idonei per indizione gare per implementazione COT; Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per realizzazione COT; T2 / 2023: Stipula contratti per realizzazione COT; T1 / 2024: COT pienamente funzionanti	Progetto idoneo approvato	0,00 €	Nuovo CUP G32C22000920006 con Importo pari a € 1,00 a seguito di rimodulazione
G32C22000620005	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE - DISTRE	162.404,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1	T4/2022: Assegnazione progetti idonei per indizione gare per implementazione COT; Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per realizzazione COT; T2 / 2023: Stipula contratti per realizzazione COT; T1 / 2024: COT pienamente funzionanti	Progetto idoneo approvato	0,00 €	Nuovo CUP G32C22000900006 con Importo pari a € 250.000,00 a seguito di rimodulazione
E57H22001010001	DISTRETTO IMPERIESE - LAVORI DI ADEGUAME	164.000,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1	T4/2022: Assegnazione progetti idonei per indizione gare per implementazione COT; Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per realizzazione COT; T2 / 2023: Stipula contratti per realizzazione COT; T1 / 2024: COT pienamente funzionanti	3) codice CIG "lavori" assegnato	Importo liquidato pari ad € 0,00 oneri esclusi	L'importo complessivo dell'intervento è stato modificato a seguito approvazione del progetto e successivo affidamento lavori ad € 180.000. La copertura finanziaria dell'importo carente è stata garantita da ASL1
E44E22000400001	REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DISTRETTO 18 DEL GOLFO SEDE DELLA SPEZIA VIA XXIV MAGGIO 139*VIA XXIV MAGGIO 139*REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE	185.000,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1	T4/2022: Assegnazione progetti idonei per indizione gare per implementazione COT; Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per realizzazione COT; T2 / 2023: Stipula contratti per realizzazione COT; T1 / 2024: COT pienamente funzionanti	CIG lavori assegnato	€ 0,00	
I13D22000280007	DISTRETTO 16 - VILLA LAURA*VIA ARNALDO T	185.000,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1	T4/2022: Assegnazione progetti idonei per indizione gare per implementazione COT; Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per realizzazione COT; T2 / 2023: Stipula contratti per realizzazione COT; T1 / 2024: COT pienamente funzionanti	codice CIG "LAVORI" ASSEGNATO	7.023,62 €	CUP I13D22000280007 CANCELLATO PERCHE' DECISA DIVERSA UBICAZIONE COT. SPOSTATA DA VILLA LAURA ALL'INTERNO OSPEDALE DI SESTRI LEVANTE IL CUP CORRETTO E' I13D22000450007 COME DA RIMODULAZIONE APPROVATA CON d.g.r. 1373 del 28/12/2022
E74E21049180006	"STRUTTURA VIA BRINIATI 2 - BRUGNATO; EX	196.004,41	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1 (Operatività device)	T4/2022: Assegnazione progetti idonei per indizione gare per implementazione COT; Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per realizzazione COT; T2 / 2023: Stipula contratti per realizzazione COT; T1 / 2024: COT pienamente funzionanti	In attesa gara CONSIP	€ 0,00	Tempistica di aggiudicazione gara CONSIP
E24E22000700001	FABBRICATI ASL N°1 IMPERIESE*VIA AURELIA	197.350,83	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1 (Operatività device)	Collaudo entro 30/06/2024	Studio fi fattibilità in corso	Importo liquidato pari ad € 0,00 oneri esclusi	

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
E76G22000230006	CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI DI ASL5*	199.888,48	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	SISTEMI INFORMATIVI E BANCHE DATI INTEGRATI/MIGLIORATI	collaudo entro 30/06/2024 (in aderenza a progettazione regionale)	in fase di progettazione e condivisione a livello regionale	0	
D64E22000290006	COT-CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI*AZIE	199.888,50	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	Target (Centrali operative pienamente funzionanti): 30/06/2024	1 (Realizzazione dei sistemi tecnologici a supporto della interconnessione delle COT)	Completamento interventi: entro 31.03.2024 Collaudo: entro 30/06/2024	Progettazione e condivisione in corso a livello regionale	0,00	
E25F22000640001	REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DISTRETTO 17 RIVIERA VAL DI VARA - SEDE DI BOLANO (SP) FRAZIONE CEPARANA PIAZZA NOVELLININOVA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DA ADIBIRE A CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE	250.000,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1	T4/2022: Assegnazione progetti idonei per indizione gare per implementazione COT; Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per realizzazione COT; T2 / 2023: Stipula contratti per realizzazione COT; T1 / 2024: COT pienamente funzionanti	CIG lavori assegnato	€ 0,00	INTERVENTO ritorna quello originario in Via Brinati,2 BRUGNATO ma nuovo CUP perché il precedente revocato. Nuovo CUP E54E22000330001
D54E21003770001	COT-CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI*AZIE	264.791,25	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	Target (Centrali operative pienamente funzionanti): 30/06/2024	1 (Operatività device)	Collaudo: entro 30/06/2024	Progettazione preliminare in corso	0,00	
D97H22000810001	OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI CAIRO MONTENOTT	374.000,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1	T4/2022: Assegnazione progetti idonei per indizione gare per implementazione COT; Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per realizzazione COT; T2 / 2023: Stipula contratti per realizzazione COT; T1 / 2024: COT pienamente funzionanti	3) codice CIG "lavori" assegnato	0	
G36G22000110006	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE 3 - CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI*VIA BERTANI 4*INFRASTRUTTURE HE E SW PER INTERCONNESSIONE COT.	399.776,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	30/06/2024	1 (realizzazione di un sistema di interconnessione a supporto delle COT)	completamento interventi 31/03/2024; collaudo entro 30/06/2024	Progettazione e condivisione in corso a livello regionale	0%	
G34E22000490001	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N.3 - DIST	653.972,00	M6C1I1.2.2	Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	TARGET: 30/06/2024	1 (OPERATIVITA' DEVICE)	COLLAUDO 30/06/2024	FASE DI PROGETTAZIONE CONDIVISA A LIVELLO REGIONALE	0%	
D57H22000970001	OSPEDALE S.M. DI MISERICORDIA DI ALBENGA	500.000,00	M6C1I1.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità E Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità;T3 2023: Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2026: Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	1) Progettazione esecutiva in corso	0	

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
I67H22000980007	NUOVO OSPEDALE DI RAPALLO*VIA SAN PIETRO	1.500.000,00	M6C111.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità E Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità;T3 2023: Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2026: Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN CORSO	0	
E57H22001020001	Ospedale di Imperia - Ospedale di Comunità Distretto Imperiese -	1.800.000,00	M6C111.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità E Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità;T3 2023: Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2026: Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	1) Progettazione in corso (p. esecutivo)	Importo liquidato pari ad € 20.054,72 oneri esclusi	
E49J22001530001	Distretto 17 - Ex presidio ospedaliero San Nicolò - Levanto	2.100.000,00	M6C111.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità E Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità;T3 2023: Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2026: Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	progettazione in corso (PFTE secondo linee guida MIMS PNRR)	€ 0,00	REDAZIONE DEL PROGETTO IN FASE DI COMPLETAMENTO E POSSIBILE AUMENTO COSTI PREVISTI
G37H22000860006	OSPEDALI DI COMUNITÀ - DISTRETTO 13 - QU	2.233.407,00	M6C111.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità E Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità;T3 2023: Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2026: Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	Progettazione preliminare in corso (PFTE)	0,00 €	
E69J22001470001	Distretto 19 - Presidio Ospedaliero San Bartolomeo	2.265.000,00	M6C111.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità E Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità;T3 2023: Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2026: Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	progettazione in corso (PFTE secondo linee guida MIMS PNRR)	€ 0,00	REDAZIONE DEL PROGETTO IN FASE DI COMPLETAMENTO E POSSIBILE AUMENTO COSTI PREVISTI

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
G37H22000840006	OSPEDALI DI COMUNITÀ - CELESIA PADIGLION	2.500.000,00	M6C1I1.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità E Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità;T3 2023: Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2026: Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	Progettazione preliminare in corso (PFTE)	0,00 €	
D97H21008210001	OSPEDALE S.GIUSEPPE DI CAIRO MONTENOTTE	2.700.000,00	M6C1I1.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità E Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità;T3 2023: Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2026: Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	1) Progettazione preliminare in corso	0	
G22C22000260006	OSPEDALI DI COMUNITÀ - FRUGONE - DISTRETTO 10 BUSALLA*VIA ROMA 90*OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE PER REALIZZAZIONE OSPEDALI DI COMUNITÀ	2.776.231,00	M6C1I1.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità E Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità;T3 2023: Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2026: Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	PROGETTAZIONE AFFIDATA		
G42C22000290006	OSPEDALI DI COMUNITÀ - DISTRETTO 8 CAMPO LIGURE GENOVA*VIA A.S. ROSSI 33*OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE PER REALIZZAZIONE OSPEDALI DI COMUNITÀ	2.776.231,00	M6C1I1.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità E Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità;T3 2023: Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2026: Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	PROGETTAZIONE AFFIDATA		
I18I22000130007	POLO OSPEDALIERO DI SESTRI LEVANTE*VIA A	2.866.000,00	M6C1I1.3	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).	30/06/2026	1	T2 2022: Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2023: Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione degli Ospedali di Comunità E Assegnazione dei codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità;T3 2023: Stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per la realizzazione degli Ospedali di Comunità; T1 2026: Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche	PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN CORSO	0	

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
I29J20001550006	AMBITO TERRITORIALE AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 4*VIA G.B. GHIO 9*N. 1 AMBULANZA E SUO ALLESTIMENTO	€ -	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)		1,00 €		IN USO	74.980,00 €	INTERVENTO NON FINANZIATO DA PNRR NE' DA PNC
E29J20002360001	ASL 1 IMPERIESE*VIA BOREA 56*POMPE INFUS	53.502,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2020	1		Tecnologie acquisite e collaudate	Importo liquidato pari ad € 49.080,00 oneri esclusi	Intervento non incluso nel finanziamento PNRR ma nel finanziamento ex DL34/2020
J36G20000790001	PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSP	88.405,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2021	Lavori impiantistici/strutturali per il miglioramento delle aree di pronto soccorso presso l'Ospedale Galliera (collegato con l'intervento riga n. 29 - CUP J39J20001450001)	n.d.	Trattasi di n. 5 interventi terminati	0	Intervento non incluso nel finanziamento PNRR ma nel finanziamento ex DL34/2020. Intervento rimodulato nell'importo per € 88.370,03 Tale rimodulazione risulta tuttora in itinere di approvazione da Regione Liguria e Ministero della Salute
J36G20000780001	PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSP	119.440,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2021	Lavori impiantistici/strutturali per l'implementazione di n. 5 Posti Letto in terapia intensiva presso l'Ospedale Galliera (collegato con l'intervento riga n. 28 - CUP J39J20001440001)	n.d.	Trattasi di n. 6 interventi: 4 terminati, 2 da completare	0	Intervento non incluso nel finanziamento PNRR ma nel finanziamento ex DL34/2020. Intervento rimodulato nell'importo per € 92.959,75 Tale rimodulazione risulta tuttora in itinere di approvazione da Regione Liguria e Ministero della Salute
I67H20004180001	OSPEDALE CIVILE DI LAVAGNA, VIA DON BOBB	226.470,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2021	Implementazione di n. 6 Posti Letto in terapia semintensiva	Stima conclusione intervento marzo 2023	Lavori da avviare	1° acconto pari al 20% del contributo assegnato	Intervento non incluso nel finanziamento PNRR ma nel finanziamento ex DL34/2020. Intervento rimodulato nell'importo per € 187.170,60 Tale rimodulazione risulta tuttora in itinere di approvazione da Regione Liguria e Ministero della Salute
G39J21024400001	OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE DI GE	351.507,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2021	Miglioramento aree Pronto Soccorso	Stima conclusione intervento marzo 2023	Lavori da avviare	0%	Intervento non incluso nel finanziamento PNRR ma nel finanziamento ex DL34/2020. Intervento rimodulato nell'articolazione dei singoli importi ma con invarianza dell'importo complessivo confermato in € 351.507,00 Tale rimodulazione risulta tuttora in itinere di approvazione da Regione Liguria e Ministero della Salute
J39J20001450001	PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSP	502.358,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2023	Acquisto apparecchiature per il miglioramento delle aree di pronto soccorso presso l'Ospedale Galliera (collegato con l'intervento riga n. 27 - CUP J36G20000790001)	n.d.	Trattasi di n. 9 interventi: 2 da eliminare in fase di rimodulazione, 7 terminati	0	Intervento non incluso nel finanziamento PNRR ma nel finanziamento ex DL34/2020. Intervento rimodulato nell'importo per € 558267,15 Tale rimodulazione risulta tuttora in itinere di approvazione da Regione Liguria e Ministero della Salute

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
I67H20004190001	OSPEDALE CIVILE DI LAVAGNA, VIA DON BOBB	527.261,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2021	Miglioramento aree Pronto Soccorso	Stima conclusione intervento marzo 2023	Lavori da avviare	1° acconto pari al 20% del contributo assegnato	Intervento non incluso nel finanziamento PNRR ma nel finanziamento ex DL34/2020. Intervento rimodulato nell'importo per € 469.921,76 Tale rimodulazione risulta tuttora in itinere di approvazione da Regione Liguria e Ministero della Salute
J39J20001440001	PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSP	612.037,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2022	Acquisto apparecchiature per l'implementazione di n. 5 Posti Letto in terapia intensiva presso l'Ospedale Galliera (collegato con l'intervento riga n. 26 - CUP J36G20000780001)	n.d.	Trattasi di n. 17 interventi: 1 da eliminare in fase di rimodulazione, 14 terminati, 2 da completare	0	Intervento non incluso nel finanziamento PNRR ma nel finanziamento ex DL34/2020. Intervento rimodulato nell'importo per € 628.158,25 Tale rimodulazione risulta tuttora in itinere di approvazione da Regione Liguria e Ministero della Salute
G37H21000200002	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANT	643.565,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2021	Implementazione di n. 8 Posti Letto in terapia intensiva	n.d.	Lavori in corso	0%	Intervento non incluso nel finanziamento PNRR ma nel finanziamento ex DL34/2020. Intervento rimodulato nell'importo per € 694.004,90 Tale rimodulazione risulta tuttora in itinere di approvazione da Regione Liguria e Ministero della Salute
G35F20006160001	ISTITUTO GIANNINA GASLINI - PRONTO SOCCO	703.015,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2021	Miglioramento aree Pronto Soccorso	31/08/2022	Lavori Terminati	1° acconto pari al 20% del contributo assegnato	In attesa collaudo lavori. Attrezzature in corso di acquisizione
E51B20000670003	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI IMPERIA*VIA	1.100.000,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2020	1	Stima conclusione intervento Gennaio 2024	Lavori in corso	Importo liquidato pari ad € 524.080,66 oneri esclusi	Intervento non incluso nel finanziamento PNRR ma nel finanziamento ex DL34/2020. Con Deliberazione Direttore Generale ASL1 n. 1049 del 11/11/2021 è stata approvata rimodulazione costi intervento con spostamento fondi al progetto in oggetto da altro progetto ASL1, sempre in ambito DL34/2020 relativo a Terapia Intensiva P.O. Sanremo. Tale deliberazione è stata inoltrata a Regione Liguria, quale soggetto attuatore, in pari data. L'importo complessivo dell'intervento, così come rimodulato, è pari ad € 1.955.643,40 il cui costo è compartecipato, rispetto a fondi ex DL 34/2020, da ASL1 per € 572.739,00. Tale rimodulazione risulta tuttora in itinere di approvazione da Regione Liguria e Ministero.
D52C20000230002	OSPEDALE S. PAOLO VALLORIA SAVONA*VIA GE	1.153.788,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2021	Implementazione di n. 6 Posti Letto in terapia intensiva e n. 6 Posti Letto in terapia semintensiva	n.d.	Lavori in corso	1° acconto pari al 20% del contributo assegnato	Intervento non incluso nel finanziamento PNRR ma nel finanziamento ex DL34/2020. Intervento rimodulato nell'importo per € 1.067.575,73 Tale rimodulazione risulta tuttora in itinere di approvazione da Regione Liguria e Ministero della Salute
G36G22000100005	OSPEDALE*VIA GEROLAMO GASLINI 5*SISTEMI	€ 1.876.741,61	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	30/06/2025 (come da scheda Agenas)	1 (numero sistemi informativi realizzati/banche dati integrate)	collaudo entro il 30/06/2025	progettazione preliminare in corso a livello regionale dei sub interventi definiti nel CIS	0	Criticità in ordine agli strumenti e alle modalità attuative per gli interventi di cui alla misura in oggetto, come anche segnalato al Dipartimento Salute e Servizi Sociali che, a sua volta, ha inoltrato la richiesta all'Unità di Missione del Ministero della Salute, ad oggi in attesa di riscontro formale.

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
I77H20005040001	OSPEDALE CIVILE DI LAVAGNA, VIA DON BOBB	1.926.899,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2021	Implementazione di n. 10 Posti Letto in terapia intensiva	Stima conclusione intervento marzo 2023	Lavori da avviare	1° acconto pari al 20% del contributo assegnato	Intervento non incluso nel finanziamento PNRR ma nel finanziamento ex DL34/2020. Intervento rimodulato nell'importo per € 1.645.168,85 Tale rimodulazione risulta tuttora in itinere di approvazione da Regione Liguria e Ministero della Salute
E21B20000710005	OSPEDALE DI SAN REMO, PADIGLIONE BOREA.*VIA BOREA, 56*COVID-19: RISTRUTTURAZIONE PIANI TERRA E PRIMO LATO EST CON IMPLEMENTAZIONE POSTI LETTO TERAPIA INTENSIVA E SUB-INTENSIVA	1.955.644,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2020	1	Stima conclusione intervento dicembre 2023	Lavori in corso	Importo liquidato pari ad € 286.069,05 oneri esclusi	Intervento non incluso nel finanziamento PNRR ma nel finanziamento ex DL34/2020. Con Deliberazione Direttore Generale ASL1 n. 1049 del 11/11/2021 è stata approvata rimodulazione costi intervento con spostamento fondi dal progetto in oggetto ad altro progetto ASL1, sempre in ambito DL34/2020 relativo a Pronto soccorso P.O. Imperia. Tale deliberazione è stata inoltrata a Regione Liguria, quale soggetto attuatore, in pari data. L'importo complessivo dell'intervento, così come rimodulato, è pari ad € 1.100.000,00, interamente finanziati ex DL34/2020. Tale rimodulazione risulta tuttora in itinere di approvazione da Regione Liguria e Ministero.
G34E20008800008	IRCCS - ISTITUTO GIANNINA GASLINI*VIA G.	1.999.163,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2021	Implementazione di n. 4 Posti Letto in terapia intensiva e n. 12 Posti Letto in terapia semintensiva	31/08/2022	Lavori Terminati	1° acconto pari al 20% del contributo assegnato	In attesa collaudo lavori. Attrezzature in corso di acquisizione
G36G22000170006	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO ASL3 GENOVESE*CORSO ONOFRIO SCASSI 1*AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO SEDE DI DEA	€ 2.259.987,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	30/06/2025	1 (numero sistemi informativi/banche dati migliorati/integrati)	Collaudo entro 30/06/2025	progettazione preliminare in corso a livello regionale dei sub-interventi definiti nel CIS	0%	Criticità in ordine agli strumenti e alle modalità attuative per gli interventi di cui alla misura in oggetto come anche segnalato al Dipartimento Salute e Servizi Sociali che ha sua volta inoltrato all'Unità di Missione del Ministero Salute, ad oggi in attesa di riscontro formale.
D74E22000330002	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E D	€ 2.364.508,60	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	30/06/2025	N. sistemi informativi/banche dati migliorati/integrati	Collaudo entro il 30/06/2025	In fase di progettazione preliminare, a livello regionale, dei sub interventi definiti nel CIS	0,00	Criticità in ordine agli strumenti e alle modalità attuative per gli interventi di cui alla misura in oggetto, come anche segnalato al Dipartimento Salute e Servizi Sociali che a sua volta ha inoltrato le richieste all'Unità di Missione del Ministero della Salute, ad oggi in attesa di riscontro formale.
I64E22000690007	OSPEDALE DI LAVAGNA*VIA DON BOBBIO 25*SO	€ 2.617.682,90	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	30/06/2025 (come da scheda Agenas)	1 (numero sistemi informativi realizzati/banche dati integrate)	collaudo entro il 30/06/2025	progettazione preliminare in corso a livello regionale dei sub interventi definiti nel CIS	0	Criticità in ordine agli strumenti e alle modalità attuative per gli interventi di cui alla misura in oggetto, come anche segnalato al Dipartimento Salute e Servizi Sociali che, a sua volta, ha inoltrato la richiesta all'Unità di Missione del Ministero della Salute, ad oggi in attesa di riscontro formale.
E86G22000160006	PRESIDIO OSPEDALIERO DEL LEVANTE LIGURE*	€ 2.726.849,80	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	30/06/2025 (secondo scheda AGENAS)	numero sistemi informativi / numero banche dati connesse integrate / migliorati (indicatore scheda REGIS)	collaudo entro 30/06/2025 (limitatamente alla data di collaudo 30/06/2025 considerato che si è ancora in fase di progettazione preliminare)	in fase di progettazione preliminare a livello regionale dei sub interventi definiti nel CIS	0	Criticità in ordine agli strumenti e alle modalità attuative per gli interventi di cui alla misura in oggetto, come segnalato al Dipartimento Salute e Servizi Sociali che a sua volta ha inoltrato le richieste all'Unità di Missione del Ministero della Salute, ad oggi in attesa di riscontro formale.

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
D54E22000330002	AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E D	€ 2.840.662,10	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	30/06/2025	N. sistemi informativi/banche dati migliorati/integrati	Collaudo entro il 30/06/2025	In fase di progettazione preliminare, a livello regionale, dei sub interventi definiti nel CIS	0,00	Criticità in ordine agli strumenti e alle modalità attuative per gli interventi di cui alla misura in oggetto, come anche segnalato al Dipartimento Salute e Servizi Sociali che a sua volta ha inoltrato le richieste all'Unità di Missione del Ministero della Salute, ad oggi in attesa di riscontro formale.
C34E20003050002	COD. 892 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO REP	3.000.000,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2020	Implementazione di n. 23 Posti Letto in terapia semintensiva	Stima conclusione intervento dicembre 2023	Lavori in corso	1° acconto pari al 20% del contributo assegnato	Intervento non incluso nel finanziamento PNRR ma nel finanziamento ex DL34/2020. Intervento rimodulato nell'importo per € 2.500.000 Tale rimodulazione risulta tuttora in itinere di approvazione da Regione Liguria e Ministero della Salute
D51B20000830002	OSPEDALE S. PAOLO SAVONA*VIA GENOVA, 30*	3.216.448,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2020	Miglioramento aree Pronto Soccorso	n.d.	Lavori da avviare	1° acconto pari al 20% del contributo assegnato	Intervento non incluso nel finanziamento PNRR ma nel finanziamento ex DL34/2020. Intervento rimodulato nell'importo per € 1.326.488,27 Tale rimodulazione risulta tuttora in itinere di approvazione da Regione Liguria e Ministero della Salute
C31B20001120002	RISTRUTTURAZIONE SHOCK ROOM PRESSO DEA P	3.610.000,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2020	Implementazione di n. 25 Posti Letto in terapia intensiva	Stima conclusione intervento dicembre 2023	Lavori in corso	1° acconto pari al 20% del contributo assegnato	Intervento non incluso nel finanziamento PNRR ma nel finanziamento ex DL34/2020. Intervento rimodulato nell'importo per € 2.298.360 Tale rimodulazione risulta tuttora in itinere di approvazione da Regione Liguria e Ministero della Salute
C38I20000410002	PAD. SPECIALITÀ PIANO 1 LEVANTE OSPEDAL	3.874.300,00	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	Intervento non incluso nel DM 6-8-2021 ma nel DL 34/2020	Implementazione di n. 35 Posti Letto in terapia semintensiva	Stima conclusione intervento dicembre 2023	Lavori da avviare	1° acconto pari al 20% del contributo assegnato	Intervento non incluso nel finanziamento PNRR ma nel finanziamento ex DL34/2020. Intervento rimodulato nell'importo per € 5.711.640,01 Tale rimodulazione risulta tuttora in itinere di approvazione da Regione Liguria e Ministero della Salute
E26G22000110001	DIGITALIAZZAZIONE DEA DI PRIMO LIVELLO -	€ 4.085.629,30	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	30/06/2025 (secondo scheda Agenas)	Numero di Sistemi Informativi/banche dati migliorati/integrati	Collaudo entro 30/06/2025	In fase di progettazione preliminare dei sub interventi definiti nel CIS	0%	Criticità in ordine agli strumenti e alle modalità attuative per gli interventi di cui alla misura in oggetto, come anche segnalato al Dipartimento Salute e Servizi Sociali, che a sua volta ha inoltrato le richieste all'Unità di Missione del Ministero della Salute, ad oggi in attesa di riscontro formale.
C36G22001860006	OSPEDALE SAN MART OSPEDALE SAN MARTINO*R	16.055.040,64	M6C2I1.1.1	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	30/06/2025	1 (numero sistemi informativi/banche dati migliorati/integrati)	T1/2025 - DEA di II Livello Digitalizzato	Condivisione regionale dei sub-interventi definiti a livello del CIS	0%	Criticità in ordine agli strumenti e alle modalità attuative per gli interventi di cui alla misura in oggetto, come anche segnalato al Dipartimento Salute e Servizi Sociali che a sua volta ha inoltrato le richieste all'Unità di Missione del Ministero della Salute, ad oggi in attesa di riscontro formale.
C34E22000250006	ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE*LARGO ROSANNA	82.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024 OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	1	T4/2022 - Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	Cod. CIG 95699425F7 assegnato Apparecchiatura Collaudata	0	
D54E22000280003	PRESIDIO DI LEVANTE*VIA GENOVA, 30*ECOGR	82.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET (OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE): 31.12.2024	1	ORDINE EMESSO COLLAUDO: ENTRO T1 2023	ORDINE EMESSO, IN ATTESA DI CONSEGNA E COLLAUDO APPARECCHIATURA	0,00	
E24E22000670001	RADIOLOGIA P.O. SANREMO*VIA BOREA 56*ECO	82.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	APPARECCHIATURA OPERATIVA ENTRO IL 30/01/2023	AFFIDAMENTO AVVENUTO	0	Importo intervento rimodulato a complessivi € 45.087,00 con DGR Regione Liguria n.1373/2022 del 28/12/2022

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
E44E21053260006	P.O. DEL LEVANTE LIGURE C/O AZIENDA SOCI	82.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	COLLAUDATA	€ 53.073,77 + IVA 22%	
G34E22000320001	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 3 POU	82.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET: 31/12/2024	1 (OPERATIVITA' GRANDE APPARECCHIATURA)	COLLAUDO 31/12/2022	APPARECCHIATURA INSTALLATA E IN USO	€ 66.034,50	
G34E22000330001	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 3 POU	82.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET: 31/12/2024	1 (OPERATIVITA' GRANDE APPARECCHIATURA)	COLLAUDO 31/12/2022	APPARECCHIATURA INSTALLATA E IN USO	€ 66.034,50	
G37G22000010002	ISTITUTO GIANNINA GASLINI REPARTO DI RAD	82.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	COLLAUDATA - MACCHINA IN ESERCIZIO	€ 50.380,00 + IVA 22%	
I69J22001380007	OSPEDALE CIVILE DI LAVAGNA, VIA DON BOBB	82.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024 OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	1	T4/2022 - Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature. T4/2024 - Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	APPARECCHIATURA COLLAUDATA		
J39I22000110006	AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO GRANDI	82.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	COLLAUDATO il 30/08/2022 - MACCHINA IN ESERCIZIO	€ 39.200,00	
C34E22000260006	SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DI	244.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024 OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	1	T4/2022 - Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature. T4/2024 - Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	Cod. CIG 950331233 assegnato Gara Aggiudicata	0	
C34E22000270006	SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGI DIG	244.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024 OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	1	T4/2022 - Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature. T4/2024 - Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	Cod. CIG 950331233 assegnato Gara Aggiudicata	0	
E54E22000120001	RADIOLOGIA P.O: IMPERIA*VIA SANT'AGATA 5	244.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	APPARECCHIATURA OPERATIVA ENTRO IL 30/06/2023	AFFIDAMENTO AVVENUTO	0	Importo intervento rimodulato a complessivi €267.304 con DGR Regione Liguria n.1373/2022 del 28/12/2022
G34E22000380001	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 3 POU	244.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET: 31/12/2024	1 (OPERATIVITA' GRANDE APPARECCHIATURA)	COLLAUDO 31/12/2023	DA ACQUISTARE	€ 0,00	
G34E22000400001	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 3 POU	244.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET: 31/12/2024	1 (OPERATIVITA' GRANDE APPARECCHIATURA)	COLLAUDO 31/12/2023	DA ACQUISTARE	€ 0,00	
G34E22000410001	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 3 POLI	244.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET: 31/12/2024	1 (OPERATIVITA' GRANDE APPARECCHIATURA)	COLLAUDO 31/12/2023	DA ACQUISTARE	€ 0,00	
G34E22000420001	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 3 POU	244.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET: 31/12/2024	1 (OPERATIVITA' GRANDE APPARECCHIATURA)	COLLAUDO 31/12/2023	DA ACQUISTARE	€ 0,00	
G34E22000430001	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 3 POLI	244.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET: 31/12/2024	1 (OPERATIVITA' GRANDE APPARECCHIATURA)	COLLAUDO 31/12/2023	DA ACQUISTARE	€ 0,00	
G34E22000440001	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 3 POLI	244.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET: 31/12/2024	1 (OPERATIVITA' GRANDE APPARECCHIATURA)	COLLAUDO 31/12/2024	DA ACQUISTARE	€ 0,00	

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
G74E22000800001	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 3 POLI	244.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET: 31/12/2024	1 (OPERATIVITA' GRANDE APPARECCHIATURA)	COLLAUDO 31/12/2024	DA ACQUISTARE	€ 0,00	
I29J22000930007	EX POLO OSPEDALIERO DI CHIAVARI*VIA G.B.	244.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024 OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	1	T4/2022 - Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature. T4/2024 - Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	GARA CENTRALIZZATA AGGIUDICATA. IN ATTESA PREDISPOSIZIONE AMBIENTI DI INSTALLAZIONE		
E44E21053270006	P.O. DEL LEVANTE LIGURE C/O AZIENDA SOCI	247.700,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	ORDINE ACQUISTO EFFETTUATO	€ 0,00	
G37G22000030005	"ISTUTO GIANNINA GASLINI ISTITUTO GIANN	247.700,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	PROSSIMA ADESIONE PROCEDURA REGIONALE - COME DA ACCORDI CON SUAR. ATTESA RISCONTRO E DETTAGLI FORNITORE PER APPROVARE DELIBERA AFFIDAMENTO	€ 0,00	
D54E22000260003	PRESIDIO DI LEVANTE*VIA GENOVA, 30*MAMMO	274.500,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET (OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE): 31.12.2024	1	T2 2023 ORDINE SU CONSIP T4 2023 COLLAUDO	IN ATTESA DI AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CONSIP	0,00	
D74E22000290003	PRESIDIO DI PONENTE*VIA XXV APRILE, 38*M	274.500,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET (OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE): 31.12.2024	1	T2 2023 ORDINE SU CONSIP T4 2023 COLLAUDO	IN ATTESA DI AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CONSIP	0,00	
E44E21053230006	P.O. DEL LEVANTE LIGURE C/O AZIENDA SOCI	274.500,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	PROCEDURA CONSIP IN CORSO	€ 176.709,02 + IVA 22%	
E44E21053250006	P.O. DEL LEVANTE LIGURE C/O AZIENDA SOCI	274.500,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici	ORDINE ACQUISTO EFFETTUATO	€ 0,00	Gara CONSIP in corso, non aggiudicata (Gara "AQ Mammografi con tomosintesi (ed. 3)")
G34E22000310001	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 3 POLI	274.500,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET: 31/12/2024	1 (OPERATIVITA' GRANDE APPARECCHIATURA)	COLLAUDO 31/12/2023	DA ACQUISTARE	€ 0,00	
I19J22001250007	POLO OSPEDALIERO DI SESTRI LEVANTE*VIA D	274.500,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024 OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	1	T4/2022 - Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature. T4/2024 - Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	IN ATTESA DISPONIBILITA' AGGIUDICATARIO GARA CENTRALIZZATE E PREDISPOSIZIONE AMBIENTI DI INSTALLAZIONE		
C34E22000280006	SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DI	280.600,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024 OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	1	T4/2022 - Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	Cod. CIG 93153462B4 assegnato Apparecchiatura Collaudata	0	
D54E22000290003	PRESIDIO DI LEVANTE - PRONTO SOCCORSO*VI	280.600,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET (OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE): 31.12.2024	1	T2 2023 ORDINE SU CONSIP T3 2024 COLLAUDO	IN ATTESA DI AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CONSIP	0,00	
G34E22000360001	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 3 POU	280.600,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET: 31/12/2024	1 (OPERATIVITA' GRANDE APPARECCHIATURA)	COLLAUDO 31/12/2023	DA ACQUISTARE	€ 0,00	
G36G22000010006	FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARECCHIO R	280.600,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	Obiettivo - M6C2-6 - 31/12/2024	M6C2-6 - Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie		0%	0%	In attesa di determinazioni da parte di ASL3 in relazione alla procedura di acquisto dell'apparecchiatura per conto di O.E.I. come previsto dalla DGR 666/2022
J39I22000120006	AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO GRANDI	280.600,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	IN FASE DI ADEGUAMNTO LOCALE DI INSTALLAZIONE		

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
E24E22000690001	P.O.SANREMO*VIA BOREA 56*ANGIOGRAFO CARD	503.976,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	APPARECCHIATURA OPERATIVA ENTRO IL 28/02/2023	IN FASE DI INSTALLAZIONE	0	Importo intervento rimodulato a complessivi € 513.690,00 con DGR Regione Liguria n.1373/2022 del 28/12/2022
D74E22000270003	PRESIDIO DI PONENTE - MEDICINA NUCLEARE*	525.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET (OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE): 31.12.2024	1	ORDINE EMESSO COLLAUDO: ENTRO T4 2023	ORDINE EMESSO, IN ATTESA DI ADEGUAMENTO LOCALI E CONSEGNA APPARECCHIATURA	0,00	
C34E22000190006	TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO (CT SCANS) - 12	530.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024 OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	1	T4/2022 - Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature. T4/2024 - Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	IN ATTESA DI AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CONSIP	0	Adozione accordo quadro da parte di Consip
C34E22000200006	TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO (CT SCANS) - 12	530.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024 OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	1	T4/2022 - Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature. T4/2024 - Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	Cod. CIG 9487162DBD assegnato Gara Pubblicata	0	
D94E22000340003	PRESIDIO DI LEVANTE*CORSO MARTIRI DELLA	530.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET (OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE): 31.12.2024	1	T2 2023 ORDINE SU CONSIP T4 2023 COLLAUDO	IN ATTESA DI AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CONSIP	0,00	
E44E21053210006	P.O. DEL LEVANTE LIGURE C/O AZIENDA SOCI	530.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	ORDINE ACQUISTO EFFETTUATO	€ 0,00	
E44E21053220006	P.O. DEL LEVANTE LIGURE C/O AZIENDA SOCI	530.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	ORDINE ACQUISTO EFFETTUATO	€ 0,00	
E54E22000130001	RADIOLOGIA P.O. IMPERIA*VIA SANT'AGATA 5	530.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	APPARECCHIATURA OPERATIVA ENTRO IL 28/02/2023	IN FASE DI INSTALLAZIONE	0	Importo intervento rimodulato a complessivi €369.024,8 con DGR Regione Liguria n.1373/2022 del 28/12/2022
G31B22001330006	FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN SOSTITUZI	530.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	Obiettivo - M6C2-6 - 31/12/2024	M6C2-6 - Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie		0%	0%	In attesa di determinazioni da parte di ASL3 in relazione alla procedura di acquisto dell'apparecchiatura per conto di O.E.I. come previsto dalla DGR 666/2022
G34E22000230001	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 3 POU	530.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET: 31/12/2024	1 (OPERATIVITA' GRANDE APPARECCHIATURA)	COLLAUDO 31/12/2023	APPARECCHIATURA ACQUISTATA DA INSTALLARE	€ 241.124,84	
I69J22001360007	POLO OSPEDALIERO N.S. DI MONTALLEGRO - R	530.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024 OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	1	T4/2022 - Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature. T4/2024 - Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	IN ATTESA DISPONIBILITA' AGGIUDICATARIO GARA CENTRALIZZATE E PREDISPOSIZIONE AMBIENTI DI INSTALLAZIONE		
J39I22000090006	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA DI GE	530.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	IN ATTESA DI AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CONSIP		In analogia quanto correttamente riportato su Regis (nella sezione Gestione Fonti) occorre dare evidenza della quota finanziata da RL pari a 23.050,00. Pertanto il finanziamento pubblico complessivo previsto è pari a 553.052,00
J39I22000100006	PIANO DI AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO	530.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	COLLAUDATA il 25/11/2022 - MACCHINA IN ESERCIZIO		In analogia quanto correttamente riportato su Regis (nella sezione Gestione Fonti) occorre dare evidenza della quota finanziata da RL pari a 23.050,00. Pertanto, il finanziamento pubblico complessivo previsto è pari a 553.052,00
G39J22000450005	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 3 - P.O	589.015,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET: 31/12/2024	1 (OPERATIVITA' GRANDE APPARECCHIATURA)	COLLAUDO 31/12/2022	APPARECCHIATURA INSTALLATA E IN USO	€ 580.500,78	

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
C39J22000440005	AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 3 - P.O	594.566,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET: 31/12/2024	1 (OPERATIVITA' GRANDE APPARECCHIATURA)	COLLAUDO 31/12/2022	APPARECCHIATURA INSTALLATA E IN USO	€ 586.051,78	
C34E22000240006	ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO COD. 925*LARGO R	608.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024 OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	1	T4/2022 - Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature. T4/2024 - Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	Cod. CIG 9331121CA2 assegnato Gara Aggiudicata	0	
D54E22000270003	PRESIDIO DI LEVANTE*VIA GENOVA, 30*ANGIO	608.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET (OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE): 31.12.2024	1	T2 2023 ORDINE SU CONSIP T4 2024 COLLAUDO	IN ATTESA DI AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CONSIP	0,00	
D74E22000300003	PRESIDIO DI PONENTE*VIA XXV APRILE, 38*A	608.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET (OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE): 31.12.2024	1	T2 2023 ORDINE SU CONSIP T4 2024 COLLAUDO	IN ATTESA DI AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CONSIP	0,00	
E44E21053240006	P.O. DEL LEVANTE LIGURE C/O AZIENDA SOCI	608.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	ORDINE ACQUISTO EFFETTUATO	€ 0,00	
I69J22001370007	OSPEDALE CIVILE DI LAVAGNA, VIA DON BOBB	608.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024 OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	1	T4/2022 - Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature. T4/2024 - Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	ORDINATIVO DI FORNITURA EMESSE. APPARECCHIATURA IN ATTESA DI INSTALLAZIONE		
C34E22000220006	GAMMA CAMERA/CT*LARGO ROSANNA BENZI, 10*	793.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024 OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	1	T4/2022 - Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature. T4/2024 - Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	Cod. CIG 9450365FE4 assegnato Gara Aggiudicata	0	
C34E22000210006	TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA (MRI) -	914.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024 OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	1	T4/2022 - Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature. T4/2024 - Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	Cod. CIG 95515994D8 assegnato Gara Pubblicata	0	
D54E22000250003	PRESIDIO DI LEVANTE*VIA GENOVA, 30*R.M.N	914.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET (OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE): 31.12.2024	1	T2 2023 ORDINE SU CONSIP T4 2024 COLLAUDO	IN ATTESA DI AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CONSIP	0,00	
E24E22000680001	RADIOLOGIA P.O. SANREMO*VIA BOREA 56*TOM	914.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	APPARECCHIATURA OPERATIVA ENTRO IL 30/09/2023	AFFIDAMENTO AVVENUTO	0	Importo intervento rimodulato a complessivi € 1.078.870,20 con DGR Regione Liguria n.1373/2022 del 28/12/2022
E74E21049170006	P.O. DEL LEVANTE LIGURE C/O AZIENDA SOCI	914.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici	PROCEDURA CONSIP IN CORSO	€ 0,00	Gara CONSIP in corso, non aggiudicata (Gara per affidamento "AQ Tomografi a risonanza magnetica (RM) e Tomografi computerizzati (TC) ed.3")
G37G22000040005	ISTITUTO GIANNINA GASLINI REPARTO DI NEU	914.000,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024	1	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	IN ATTESA DI AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO CONSIP	€ 0,00	
C34E22000230006	PET TC*LARGO ROSANNA BENZI, 10*PET TC	2.403.400,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	31/12/2024 OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE	1	T4/2022 - Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi attrezzature. T4/2024 - Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie	Cod. CIG 9450365FE4 assegnato Gara Pubblicata	0	
D74E22000280003	PRESIDIO DI PONENTE - MEDICINA NUCLEARE*V	2.743.423,00	M6C2I1.1.2	Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	TARGET (OPERATIVITA' DELLE GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE): 31.12.2024	1	ORDINE EMESSE COLLAUDO: ENTRO T4 2023	ORDINE EMESSE, IN ATTESA DI ADEGUAMENTO LOCALI E CONSEGNA APPARECCHIATURA	0,00	
D91B22000730001	OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI CAIRO MONTENOTT	800.000,00	M6C2I1.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	30/06/2026	1	T1 2023 Pubblicazione gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T3 2023 Sottoscrizione dei contratti da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T4 2023 Avvio dei lavori da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T2 2026 Completamento interventi antisismici nelle strutture	1) Progettazione esecutiva in corso	0	

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
C31B22001290006	COD. 976 - PNRR - M6 1.2 - OSPEDALE SICU	859.680,00	M6C211.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	30/06/2026	1	T1 2023 Pubblicazione gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T3 2023 Sottoscrizione dei contratti da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T4 2023 Avvio dei lavori da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T2 2026 Completamento interventi antisismici nelle strutture	PFTE IN CORSO E ADEGUAMENTO VULNERABILITA SISMICA		
D71B22001030001	OSPEDALE S. CORONA DI PIETRA LIGURE - CO	1.000.000,00	M6C211.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	30/06/2026	1	T1 2023 Pubblicazione gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T3 2023 Sottoscrizione dei contratti da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T4 2023 Avvio dei lavori da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T2 2026 Completamento interventi antisismici nelle strutture	1) Progettazione esecutiva in corso	0	
G32C22000220006	ADEGUAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE 9 DEL	1.080.358,00	M6C211.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	30/06/2026	1	T1 2023 Pubblicazione gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T3 2023 Sottoscrizione dei contratti da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T4 2023 Avvio dei lavori da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T2 2026 Completamento interventi antisismici nelle strutture	Progettazione preliminare in corso (PFTE)	0,00 €	
G32C22000230006	ADEGUAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE MONTE	1.716.561,00	M6C211.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	30/06/2026	1	T1 2023 Pubblicazione gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T3 2023 Sottoscrizione dei contratti da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T4 2023 Avvio dei lavori da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T2 2026 Completamento interventi antisismici nelle strutture	Progettazione preliminare in corso (PFTE)	0,00 €	
G36G22000020006	ADEGUAMENTO SISMICO P.S.S. QUARTO*VIA G.	2.500.000,00	M6C211.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	30/06/2026	1	T1 2023 Pubblicazione gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T3 2023 Sottoscrizione dei contratti da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T4 2023 Avvio dei lavori da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T2 2026 Completamento interventi antisismici nelle strutture	Progettazione preliminare in corso (PFTE)	0,00 €	
E51B22001640001	"INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO SU	3.604.077,00	M6C211.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	30/06/2026		CAPACITÀ DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA SANITARIA NUOVE O MODERNIZZATE	3) codice CIG "lavori" assegnato	Importo liquidato pari ad € 0,00 oneri esclusi	
I86G22000060007	EX POLO OSPEDALIERO DI CHIAVARI OSPEDALE	3.782.526,00	M6C211.2	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	30/06/2026	1	T1 2023 Pubblicazione gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T3 2023 Sottoscrizione dei contratti da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T4 2023 Avvio dei lavori da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T2 2026 Completamento interventi antisismici nelle strutture	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA IN CORSO	0,00 €	TEMPI PER LA PROGETTAZIONE COSI' COME DEFINITA DAL D.I.P. NON CONFORMI AL RISPETTO DELLA MILESTONE DEL 31/03/2023

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Descrizione Misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
G34D22000340001	CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2021/2024*CORSO PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE*CORSO TRIENNALE	0,01	M6C2I2.2.A	Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale	30/06/2024	N. 22 borse PNRR per il corso Triennio 2021/2024	T2 2022 Assegnazione di 900 borse aggiuntive per il Corso di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio formativo 2021/2024; T4 2022 Pubblicazione del decreto annuale di assegnazione risorse economiche per finanziare 900 borse di studio per i Medici di Medicina Generale; T2 2023 Assegnazione di 1800 borse aggiuntive per il Corso di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio formativo 2021/2024 e 2022- 2025; T4 2023 Pubblicazione del decreto annuale di assegnazione risorse economiche per finanziare 900 borse di studio per i Medici di Medicina Generale; T2 2024 Assegnazione di 2700 borse aggiuntive per il Corso di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio formativo 2021/2024, 2022- 2025 e 2023-2026.	Il corso Triennio 2021/2024 in Regione Liguria è stato avviato il 27/04/2022.	(DM 2/11/2021) - Con DGR 325/2022 è stata impegnata la somma PNRR di € 276.963,72= per n. 22 borse del primo anno del Triennio 2021/2024; con DGR 1235/2022 è stata impegnata la somma PNRR di € 276.963,72= per n. 22 del secondo anno del Triennio 2021/2024.	
TOTALE GENERALE		280.775.535,88								

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNC

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	Cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	Stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
I66G22000050006	ANTISISMICA CORPO MORGUE E NORD - P.O. LAVAGNA	1.086.225,00	M6C2I1.2	30/06/2026	1	T1 2023 Pubblicazione gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T3 2023 Sottoscrizione dei contratti da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T4 2023 Avvio dei lavori da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T2 2026 Completamento interventi antisismici nelle strutture	PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN CORSO	0,00	INTERVENTO INSERITO DA ASL4 NEL PRESENTE FOGLIO DI LAVORO
I15F22000480003	ADEGUAMENTO SISMICO DEL POLO OSPEDALIERO DI SESTRI LEVANTE	2.862.439,00	M6C2I1.2	30/06/2026	1	T1 2023 Pubblicazione gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T3 2023 Sottoscrizione dei contratti da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T4 2023 Avvio dei lavori da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T2 2026 Completamento interventi antisismici nelle strutture	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO NON FINANZIATA DA PNRR	0,00	Inoltrata richiesta a regione per modifica dei contenuti del D.I.P. relativi al grado di progettazione posto a base di gara per l'appalto integrato----intervento inserito nel presente foglio da asl4 - l'attività di progettazione fino al livello del progetto di fattibilità tecnico economico e' stato dato in affidamento esterno con fondi propri asl
G62C22000130001	COLLETTA Tutta la struttura	5.178.851,00	M6C2I1.2		1	T1 2023 Pubblicazione gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T3 2023 Sottoscrizione dei contratti da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T4 2023 Avvio dei lavori da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T2 2026 Completamento interventi antisismici nelle strutture	PFTE IN CORSO	0,00	
C31B22001300001	IRCCS AOU S.MARTINO - IST PAD.13 (Cod. Az. 977)	1.192.379,00	M6C2I1.2		1	T1 2023 Pubblicazione gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T3 2023 Sottoscrizione dei contratti da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T4 2023 Avvio dei lavori da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T2 2026 Completamento interventi antisismici nelle strutture	PFTE IN CORSO E ADEGUAMENTO VULNERABILITA SISMICA	0,00	
C31B22001310001	IRCCS AOU S.MARTINO - IST PAD. SPECIALITA' (Cod. Az. 978)	3.910.410,00	M6C2I1.2		1	T1 2023 Pubblicazione gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T3 2023 Sottoscrizione dei contratti da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T4 2023 Avvio dei lavori da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T2 2026 Completamento interventi antisismici nelle strutture	PFTE IN CORSO E ADEGUAMENTO VULNERABILITA SISMICA	0,00	

REGIONE LIGURIA PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNC

Cup	Titolo Progetto	Importo autorizzato	Codice misura	Target/milestone previsti dal dm 6 agosto 2021	Indicatore quantitativo	Cronoprogramma	Stato di avanzamento fisico	Stato di avanzamento finanziario	Criticità rilevate dall'amministrazione
C31B22001320001	IRCCS AOU S.MARTINO - IST PAD. MONOBLOCCO (Cod. Az. 979)	8.161.816,00	M6C2I1.2		1	T1 2023 Pubblicazione gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T3 2023 Sottoscrizione dei contratti da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T4 2023 Avvio dei lavori da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T2 2026 Completamento interventi antisismici nelle strutture	PFTE IN CORSO E ADEGUAMENTO VULNERABILITA SISMICA	0,00	
E66G22000180001	ASL5 OSPEDALE SAN NICOLO Tutta la Struttura	2.468.693,00	M6C2I1.2		1	T1 2023 Pubblicazione gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T3 2023 Sottoscrizione dei contratti da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T4 2023 Avvio dei lavori da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T2 2026 Completamento interventi antisismici nelle strutture	PFTE IN CORSO		
G35F21001800004	ISTITUTO GIANNINA GASLINI Interventi sui Padiglioni 17-18-DEA e Realizzazione del Padiglione 0	8.334.309,00	M6C2I1.2		1	T1 2023 Pubblicazione gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T3 2023 Sottoscrizione dei contratti da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T4 2023 Avvio dei lavori da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T2 2026 Completamento interventi antisismici nelle strutture	PFTE IN CORSO		
G33D21005740008	ISTITUTO GIANNINA GASLINI Padiglione 4 (Psichiatria)	1.629.338,00	M6C2I1.2		1	T1 2023 Pubblicazione gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T3 2023 Sottoscrizione dei contratti da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T4 2023 Avvio dei lavori da parte di Regione, anche attraverso gli Enti del SSN; T2 2026 Completamento interventi antisismici nelle strutture	PFTE IN CORSO		
TOTALE		34.824.460,00							

REGIONE LIGURIA BILANCIO 2022-2024 ENTRATA

CODICE_CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESC_MISSIONE_PNRR	DESC_COMPONENTE_PNRR	DESC_INVESTIMENTO_RIFORMA	DESC_SUB_INVESTIMENTO	CONTO FINANZIARIO	PERIMETRO SANITARIO	COMPETENZA_2022	COMPETENZA_2023	COMPETENZA_2024
ECPNRR00001	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI - BUS - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - M2.C2. I4.4.1	Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile	4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi	4.4.1: Rinnovo flotte Bus	E.2.01.01.01.000	ORDINARIO	1.795.693,00	2.333.937,00	4.596.477,00
ECPNRR00002	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - M2.C3.I	Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	Investimento		E.2.01.01.01.000	ORDINARIO	7.068.381,91	6.184.834,17	6.184.834,17
ECPNRR00003	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO " VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE" - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - M6.C2.I1.2	Missione 6 - Salute	M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile		E.4.02.01.01.000	SANITA'	34.824.460,18	0,00	0,00
ECPNRR00004	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO " SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA" - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - M6.C1.I	Missione 6 - Salute	M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	Investimento		E.4.02.01.01.000	SANITA'	1.500.000,00	3.500.000,00	4.200.000,00
EPNRR000001	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER LA TASK FORCE DIGITALIZZAZIONE, MONITORAGGIO E PERFORMANCE - ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE - PNRR - M1.C1.I2.2.1	Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	2.2.1: Assistenza tecnica a livello centrale e locale	E.2.01.01.01.000	ORDINARIO	323.544,00	3.558.984,00	2.517.032,00
EPNRR000002	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI - TRENI - PNRR - M2.C2. I4.4.2	Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile	4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi	4.4.2: Rinnovo flotte treni	E.2.01.01.01.000	ORDINARIO	3.601.847,09	3.874.079,72	3.874.079,72
EPNRR000003	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE - PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI DEL SISTEMA SANITARIO - BORSE AGGIUNTIVE IN FORMAZIONE DI MEDICINA GENERALE - PNRR - M6.C2.I2.2a	Missione 6 - Salute	M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale	E.2.01.01.01.000	SANITA'	830.891,16	553.927,44	276.963,72
EPNRR000004	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA (CICLOVIE TURISTICHE) - PNRR - M2.C2.I4.1	Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile	4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica		E.4.02.01.01.000	ORDINARIO	19.293.478,26	0,00	0,00

REGIONE LIGURIA BILANCIO 2022-2024 ENTRATA

CODICE_CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESC_MISSIONE_PNRR	DESC_COMPONENTE_PNRR	DESC_INVESTIMENTO_RIFORMA	DESC_SUB_INVESTIMENTO	CONTO FINANZIARIO	PERIMETRO SANITARIO	COMPETENZA_2022	COMPETENZA_2023	COMPETENZA_2024
EPNRR000005	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER IL SOCIAL HOUSING - PIANO INNOVATIVO PER LA QUALITA' ABITATIVA (PINQUA) - RIQUALIFICAZIONE E INCREMENTO DELL'EDILIZIA SOCIALE, RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DELLA SOCIETA' URBANA, MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E SICUREZZA URBANA, MITIGAZIONE DELLA CARENZA ABITATIVA E AUMENTO DELLA QUALITA' AMBIENTALE, UTILIZZO DI MODELLI E STRUMENTI INNOVATIVI PER LA GESTIONE, L'INCLUSIONE E IL BENESSERE URBANO - PNRR - M5.C2.I2.3	Missione 5 - Coesione e inclusione	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	2.3: Programma innovativo della qualità dell'abitare		E.4.02.01.01.000	ORDINARIO	52.749.604,65	10.805.335,39	17.707.024,56
EPNRR000006	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - PNRR - M6.C1.I1.1	Missione 6 - Salute	M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona		E.4.02.01.01.000	SANITA'	44.030.926,66	0,00	0,00
EPNRR000007	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO DESTINATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT) - PNRR - M6.C1.I1.2.2	Missione 6 - Salute	M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	1.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina	1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	E.4.02.01.01.000	SANITA'	5.112.939,71	0,00	0,00
EPNRR000008	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO DESTINATI AL RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - PNRR - M6.C1.I1.3	Missione 6 - Salute	M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).		E.4.02.01.01.000	SANITA'	24.016.869,09	0,00	0,00
EPNRR000009	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO DESTINATI ALL'AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - PNRR - M6.C2.I1.1	Missione 6 - Salute	M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero		E.4.02.01.01.000	SANITA'	63.386.882,00	0,00	0,00
EPNRR000010	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE" - PNRR - M6.C2.I1.2	Missione 6 - Salute	M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile		E.4.02.01.01.000	SANITA'	15.343.202,84	0,00	0,00
EPNRR000011	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI (GOL) NELL'AMBITO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL	Missione 5 - Coesione e inclusione	M5C1: Politiche per il lavoro	1.1 Politiche attive del lavoro e formazione		E.2.01.01.01.000	ORDINARIO	21.296.000,00	21.296.000,00	21.296.000,00

REGIONE LIGURIA BILANCIO 2022-2024 ENTRATA

CODICE_CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESC_MISSIONE_PNRR	DESC_COMPONENTE_PNRR	DESC_INVESTIMENTO_RIFORMA	DESC_SUB_INVESTIMENTO	CONTO FINANZIARIO	PERIMETRO SANITARO	COMPETENZA_2022	COMPETENZA_2023	COMPETENZA_2024
	LAVORO E FORMAZIONE - PNRR - M5.C1.R1.1									
EPNRR000012	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO DESTINATI ALL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA DEL MDS E ANALISI DEI DATI, MODELLO PREDITTIVO PER LA VIGILANZA LEA - REINGEGNERIZZAZIONE NSIS A LIVELLO LOCALE - ADOZIONE DI 4 NUOVI FLUSSI INFORMATIVI NAZIONALI - PNRR - M6.C2.I1.3.2	Missione 6 - Salute	M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK □.)	E.4.02.01.01.000	SANITA'	727.711,13	0,00	0,00
EPNRR000013	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE - PROFESSIONALI, DIGITALI E MANAGERIALI DEL SISTEMA SANITARIO - CORSO DI FORMAZIONE IN INFEZIONI OSPEDALIERE - PNRR - M6.C2.I2.2B	Missione 6 - Salute	M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere	E.2.01.01.01.000	SANITA'	2.447.719,33	0,00	0,00
EPNRR000014	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER LA PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE - PNRR - M1.C3.I2.2	Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C3 - Turismo e cultura 4.0	2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale		E.4.02.01.01.000	ORDINARIO	15.272.009,68	0,00	0,00
EPNRR000015	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DUALE - PNRR - M5.C1.I1.4	Missione 5 - Coesione e inclusione	M5C1: Politiche per il lavoro	1.4 Sistema duale		E.2.01.01.01.000	ORDINARIO	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
EPNRR000016	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " STRATEGIE E PIATTAFORME DIGITALI PER IL PATRIMONIO CULTURALE - DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE" - PNRR - M1.C3.I1.1.5	Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C3 - Turismo e cultura 4.0	1.1:Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	1.1.5: Digitalizzazione	E.4.02.01.01.000	ORDINARIO	2.090.692,33	0,00	0,00
EPNRR000017	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER "GIARDINIERI D'ARTE" - PNRR- M1.C3.I2.3	Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C3 - Turismo e cultura 4.0	2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici		E.2.01.01.01.000	ORDINARIO	601.400,00	0,00	0,00

REGIONE LIGURIA BILANCIO 2022-2024 ENTRATA

CODICE_CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESC_MISSIONE_PNRR	DESC_COMPONENTE_PNRR	DESC_INVESTIMENTO_RIFORMA	DESC_SUB_INVESTIMENTO	CONTO FINANZIARIO	PERIMETRO SANITARIO	COMPETENZA_2022	COMPETENZA_2023	COMPETENZA_2024
EPNRR000018	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER IL POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DIGITALE DEI SISTEMI SANITARI - FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO - PNRR- M6.C2.I1.3.1	Missione 6 - Salute	M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)	E.4.02.01.01.000	SANITA'	10.541.780,82	4.312.546,70	3.354.202,99
EPNRR000019	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO "MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - PNRR- M2.C4.I2.1b	Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.1 Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	E.4.02.01.01.000	ORDINARIO	20.861.457,13	0,00	0,00
EPNRR000020	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" - PNRR- M1.C1.I1.7.2	Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.7: Competenze digitali di base	1.7.2: Rete di servizi di facilitazione digitale	E.2.01.01.01.000	ORDINARIO	312.085,40	624.170,80	873.839,12
EPNRR000021	FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER L'INCREMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEI PROFESSIONISTI DEL SISTEMA SANITARIO - FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO - PNRR- M6.C2.I1.3.1	Missione 6 - Salute	M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)	E.4.02.01.01.000	SANITA'	746.616,00	2.319.842,57	2.319.842,57
Totale								352.276.192,37	61.863.657,79	69.700.295,85

REGIONE LIGURIA BILANCIO 2022-2024 SPESA

CODICE_CAPITOLO	CONTO FINANZIARIO	MISSIONE PROGRAMMA	PERIMETRO SANITARIO	CAPITOLO ENTRATA RELAZIONATO	COMPETENZA_2022	COMPETENZA_2023	COMPETENZA_2024	DESC_MISSIONE_PNRR	DESC COMPONENTE PNRR	DESC INVESTIMENTO RIFORMA	DESC SUB INVESTIMENTO
UCPNRR00001	U.2.03.03.03.000	U.10.006.000	ORDINARIO	ECPNRR00001	1.795.693,00	2.333.937,00	4.596.477,00	Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile	4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi	4.4.1: Rinnovo flotte Bus
UCPNRR00002	U.2.03.03.01.000	U.08.003.000	ORDINARIO	ECPNRR00002	5.751.202,24	5.032.301,95	5.032.301,95	Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	Investimento	
UCPNRR00003	U.2.03.01.02.000	U.08.003.000	ORDINARIO	ECPNRR00002	1.317.179,67	1.152.532,22	1.152.532,22	Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	Investimento	
UCPNRR00004	U.2.03.01.02.000	U.13.008.000	SANITA'	ECPNRR00003	34.824.460,18	0,00	0,00	Missione 6 - Salute	M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile	
UCPNRR00005	U.2.03.03.01.000	U.08.003.000	ORDINARIO	AVANZO VINC.	2.875.601,12	0,00	0,00	Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	Investimento	
UCPNRR00006	U.2.03.01.02.000	U.08.003.000	ORDINARIO	AVANZO VINC.	658.589,84	0,00	0,00	Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	Investimento	
UCPNRR00007	U.2.03.01.02.000	U.13.008.000	SANITA'	ECPNRR00004	1.500.000,00	3.500.000,00	4.200.000,00	Missione 6 - Salute	M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	Investimento	
UPNRR000001	U.1.03.02.11.000	U.01.012.000	ORDINARIO	EPNRR000001	323.544,00	3.558.984,00	2.517.032,00	Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	2.2.1: Assistenza tecnica a livello centrale e locale

REGIONE LIGURIA BILANCIO 2022-2024 SPESA

CODICE_CAPITOLO	CONTO FINANZIARIO	MISSIONE PROGRAMMA	PERIMETRO SANITARIO	CAPITOLO ENTRATA RELAZIONATO	COMPETENZA_2022	COMPETENZA_2023	COMPETENZA_2024	DESC_MISSIONE_PNRR	DESC COMPONENTE PNRR	DESC INVESTIMENTO RIFORMA	DESC SUB INVESTIMENTO
UPNRR000002	U.2.03.03.03.000	U.10.006.000	ORDINARIO	EPNRR000002	3.601.847,09	3.874.079,72	3.874.079,72	Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile	4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi	4.4.2: Rinnovo flotte treni
UPNRR000003	U.1.04.01.02.000	U.13.008.000	SANITA'	EPNRR000003	830.891,16	553.927,44	276.963,72	Missione 6 - Salute	M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Submisura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale
UPNRR000004	U.2.02.01.09.000	U.10.006.000	ORDINARIO	EPNRR000004	19.293.478,26	0,00	0,00	Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile	4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica	
UPNRR000005	U.2.03.01.02.000	U.08.003.000	ORDINARIO	EPNRR000005	44.575.902,42	5.857.095,56	12.311.732,71	Missione 5 - Coesione e inclusione	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	2.3: Programma innovativo della qualità dell'abitare	
UPNRR000006	U.2.03.01.02.000	U.13.008.000	SANITA'	EPNRR000006	44.030.926,66	0,00	0,00	Missione 6 - Salute	M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	
UPNRR000007	U.2.03.01.02.000	U.13.008.000	SANITA'	EPNRR000007	5.112.939,71	0,00	0,00	Missione 6 - Salute	M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	1.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina	1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)
UPNRR000008	U.2.03.01.02.000	U.13.008.000	SANITA'	EPNRR000008	24.016.869,09	0,00	0,00	Missione 6 - Salute	M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).	
UPNRR000009	U.2.03.01.02.000	U.13.008.000	SANITA'	EPNRR000009	63.386.882,00	0,00	0,00	Missione 6 - Salute	M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	
UPNRR000010	U.2.03.01.02.000	U.13.008.000	SANITA'	EPNRR000010	15.343.202,84	0,00	0,00	Missione 6 - Salute	M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile	
UPNRR000011	U.1.04.01.02.000	U.15.004.000	ORDINARIO	EPNRR000011	21.296.000,00	21.296.000,00	21.296.000,00	Missione 5 - Coesione e inclusione	M5C1: Politiche per il lavoro	1.1 Politiche attive del lavoro e formazione	
UPNRR000012	U.2.03.01.02.000	U.13.008.000	SANITA'	EPNRR000012	727.711,13	0,00	0,00	Missione 6 - Salute	M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK □.)	1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK □.)
UPNRR000013	U.1.04.01.02.000	U.13.008.000	SANITA'	EPNRR000013	2.447.719,33	0,00	0,00	Missione 6 - Salute	M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Submisura: corso di formazione in infezioni ospedaliere
UPNRR000014	U.2.03.02.01.000	U.05.003.000	ORDINARIO	EPNRR000014	6.381.193,94	0,00	0,00	Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C3 - Turismo e cultura 4.0	2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	
UPNRR000015	U.1.04.01.02.000	U.04.008.000	ORDINARIO	EPNRR000015	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Missione 5 - Coesione e inclusione	M5C1: Politiche per il lavoro	1.4 Sistema duale	
UPNRR000016	U.2.02.03.99.000	U.05.003.000	ORDINARIO	EPNRR000016	2.090.692,33	0,00	0,00	Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C3 - Turismo e cultura 4.0	1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	1.1.5: Digitalizzazione

REGIONE LIGURIA BILANCIO 2022-2024 SPESA

CODICE_CAPITOLO	CONTO FINANZIARIO	MISSIONE PROGRAMMA	PERIMETRO SANITARIO	CAPITOLO ENTRATA RELAZIONATO	COMPETENZA_2022	COMPETENZA_2023	COMPETENZA_2024	DESC_MISSIONE_PNRR	DESC COMPONENTE PNRR	DESC INVESTIMENTO RIFORMA	DESC SUB INVESTIMENTO
UPNRR000017	U.1.04.03.99.000	U.15.004.000	ORDINARIO	EPNRR000017	601.400,00	0,00	0,00	Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C3 - Turismo e cultura 4.0	2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici	
UPNRR000018	U.2.03.01.02.000	U.13.008.000	SANITA'	EPNRR000018	10.541.780,82	4.312.546,70	3.354.202,99	Missione 6 - Salute	M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)
UPNRR000019	U.2.02.01.09.000	U.09.009.000	ORDINARIO	EPNRR000019	5.000.000,00	0,00	0,00	Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.1 Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico
UPNRR000020	U.2.02.03.06.000	U.09.009.000	ORDINARIO	EPNRR000019	600.000,00	0,00	0,00	Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.1 Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico
UPNRR000021	U.2.03.01.02.000	U.09.009.000	ORDINARIO	EPNRR000019	15.261.457,13	0,00	0,00	Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.1 Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico
UPNRR000022	U.1.03.02.19.000	U.01.012.000	ORDINARIO	EPNRR000020	312.085,40	624.170,80	873.839,12	Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.7: Competenze digitali di base	1.7.2: Rete di servizi di facilitazione digitale
UPNRR000023	U.2.03.03.01.000	U.08.003.000	ORDINARIO	EPNRR000005	8.173.702,23	4.948.239,83	5.395.291,85	Missione 5 - Coesione e inclusione	M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	2.3: Programma innovativo della qualità dell'abitare	
UPNRR000024	U.2.03.01.02.000	U.13.008.000	SANITA'	EPNRR000021	746.616,00	2.319.842,57	2.319.842,57	Missione 6 - Salute	M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale	1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)
UPNRR000025	U.2.03.04.01.000	U.05.003.000	ORDINARIO	EPNRR000014	6.157.209,78	0,00	0,00	Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C3 - Turismo e cultura 4.0	2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	
UPNRR000026	U.2.03.03.03.000	U.05.003.000	ORDINARIO	EPNRR000014	2.733.605,96	0,00	0,00	Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	M1C3 - Turismo e cultura 4.0	2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	

Totale

355.810.383,33

61.863.657,79

69.700.295,85

CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA- PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE- ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ RILEVATE DALL'AMMINISTRAZIONE	NOTE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M1C1I0104	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI SPID E CIE	14.000,00	14.000,00	D31F22002430006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	-	-			
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C1I0101	IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PER I COMUNI DI SESTRI LEVANTE, CSARZA LIGURE E CASTIGLIONE CHIAVARESE*VIA PER SANTA VITTORIA, 66*TRATTAMENTO ED ESSICCAZIONE FANGHI DI DEPURAZIONE.			D11B21007200005	ALTRO - NON FINANZIATO						Costo progetto 2.172.395
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C1I0101	BACINO DI AFFIDAMENTO DEL GENOVESATO*VIA AREA DI INTERESSE DEL PROGETTO*CASSONETTI CON ACCESSO CONTROLLATO			D29J22000890001	ALTRO - LINEA A - pubblicata graduatoria provvisoria (19/01/2023), in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	-	-			Costo progetto 1.000.000 Importo finanziato 1.000.000
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C1I0101	BACINO DEL GENOVESATO*VIA AREA DI INTERESSE DEL PROGETTO*SISTEMI DI GEOREFERENZIAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER TRACCIATURA DEI CONFERIMENTI			D29J22000900001	ALTRO - LINEA A - pubblicata graduatoria provvisoria (19/01/2023), in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	-	-			Costo progetto 1.000.000 Importo finanziato 1.000.000
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C1I0101	TRATTAMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DI GENOVA CON AFFINAMENTO MEDIANTE IDROLISI TERMICA.*STRADA EX ILVA*TRATTAMENTO ED ESSICCAZIONE FANGHI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DI GENOVA CON AFFINAMENTO MEDIANTE IDROLISI TERMICA.	21.915.000,00	10.000.000,00	D31B18000600005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	-	-	importo finanziato ammissibile relativo alla sola quota PNRR M2C1I1.1C pari a 10.000.000 €- costo progetto 21.915.000		
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C1I0101	CENTRO DI RACCOLTA VIA BARTOLOMEO BIANCO (GENOVA)*VIA BARTOLOMEO BIANCO*POLO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE DI VIA BARTOLOMEO BIANCO: CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA			D31B22000820001	ALTRO - LINEA A - pubblicata graduatoria provvisoria (19/01/2023), in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	-	-			Costo progetto 1.000.000 Importo finanziato 1.000.000
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C1I0101	CENTRO DI RACCOLTA DI VOLPARA*VIA LUNGOBISAGNO DALMAZIA 3*POLO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE DI VOLPARA			D31B22000830001	ALTRO - LINEA A - pubblicata graduatoria provvisoria (19/01/2023), in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	-	-			Costo progetto 1.000.000 Importo finanziato 1.000.000
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C1I0101	IMPIANTO DI VIA SARDORELLA (GENOVA)*VIA SARDORELLA 51*IMPIANTO ALTAMENTE AUTOMATIZZATO PER LA SELEZIONE DELLA PLASTICA			D31E22000180001	ALTRO - LINEA B - NON FINANZIATO per esaurimento plafond						Costo progetto 10.088.088
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C1I0101	POLO IMPIANTISTICO DI SCARPINO (GE)*VIA MILITARE DI BORZOLI*IMPIANTO DI BIODIGESTIONE			D32F22000870001	ALTRO - LINEA B - NON FINANZIATO per esaurimento plafond						Costo progetto 20.865.147

CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA- PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE- ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ RILEVATE DALL'AMMINISTRAZIONE	NOTE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C1I0101	CENTRO DEL RIUSO VIA BARTOLOMEO BIANCO*VIA BARTOLOMEO BIANCO*POLO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE DI VIA BARTOLOMEO BIANCO: CENTRO DEL RIUSO			D33D22000530001	ALTRO - LINEA A - pubblicata graduatoria provvisoria (19/01/2023), in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	-	-			Costo progetto 1.000.000 Importo finanziato 1.000.000
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C1I0101	CENTRO DEL RIUSO DI VOLPARA*VIA LUNGOBISAGNO DALMAZIA 3*POLO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE DI VOLPARA			D34H22000800001	ALTRO - LINEA A - pubblicata graduatoria provvisoria (19/01/2023), in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	-	-			Costo progetto 936.615 Importo finanziato 936.615
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C1I0101	IMPIANTO DI CORSO PERRONE (GENOVA)*VIA CORSO PERRONE 124*STAZIONE DI TRASFERENZA			D37B22000310001	ALTRO - LINEA B - NON FINANZIATO per esaurimento plafond		--				Costo progetto 5.093.569
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C1I0101	COMUNE DI GENOVA - MUNICIPI LEVANTE, CENTRO, PONENTE, VALPOLCEVERA*VIA COMUNE DI GENOVA*ECOISOLE AD ACCESSO CONTROLLATO			D39J22001480001	ALTRO - LINEA A - pubblicata graduatoria provvisoria (19/01/2023), in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	-	-			Costo progetto 1.000.000 Importo finanziato 1.000.000
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C1I0101	CITTÀ DI GENOVA (VALBISAGNO, MEDIOLEVANTE, CENTRO)*VIA COMUNE DI GENOVA*ECOISOLE AD ACCESSO CONTROLLATO			D39J22001490001	ALTRO - LINEA A - pubblicata graduatoria provvisoria (19/01/2023), in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	-	-			Costo progetto 1.000.000 Importo finanziato 1.000.000
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C1I0101	COMUNE DI GENOVA*VIA COMUNE DI GENOVA*ECOISOLE INTERRATE			D39J22001510001	ALTRO - LINEA A - pubblicata graduatoria provvisoria (19/01/2023), in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	in attesa pubblicazione graduatoria definitiva	-	-			Costo progetto 1.000.000 Importo finanziato 1.000.000
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C1I0101	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CENTRIFUGHE FANGHI NEI DEPURATORI DI GENOVA PRÀ-VOLTRI, ROSSIGLIONE E RONCO SCRIVIA*VIA DON GIOVANNI VERITÀ (GE), VIA MILITE IGNOTO (RONCO SCRIVIA), VIA FRATELLI PESCE (ROSSIGLIONE)*NUOVE CENTRIFUGHE FANGHI			D51D22000000001	ALTRO - NON FINANZIATO		--				Costo progetto 1.290.400
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C1I0101	IMPIANTO DI TRATTAMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE PER L'AGGLOMERATO DI ARENZANO, COGOLETO E GENOVA VESIMA*STRADA STATALE N° 1 AURELIA, LOCALITÀ CAVA LUPARA*TRATTAMENTO ED ESSICCAZIONE FANGHI DI DEPURAZIONE.			D61B21009000005	ALTRO - NON FINANZIATO		--				Costo progetto 3.406.598

CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA- PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE- ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ RILEVATE DALL'AMMINISTRAZIONE	NOTE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C3I0101	EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA*VIA SPERONI N. 37*LAS.21.00019.SER.0001.PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L' INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO EX " MAESTRE PIE" VIA GEROLAMO SPERONI, 37 - 16036 RECCO (GE)			D79J21014800003	ALTRO				CUP in fase di dismissione / costo progetto definitivo da ricomprendere nel CUP di progetto D76I20000010001 (RIGA 42), intervento "LOCALI A DISPOSIZIONE - EX COMPLESSO MAESTRE PIE - GEROLAMO SPERONI - 37 - RECCO - CAP 16036*VIA GEROLAMO SPERONI 37 - RECCO*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO"		Costo progetto 371.460
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C4I0301	TERRENI DA RIMBOSCHIRE NEI COMUNI DI COGOLETO ARENZANO E RONCO SCRIVIA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA*VIA COMUNI DI COGOLETO, ARENZANO E RONCO SCRIVIA*MIGLIORAMENTI FORESTALI TRAMITE PIANTAGIONE DI ALBERI ED ARBUSTI	1.728.882,00	1.728.882,00	D12F22000550006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	362.282,96	-			
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C4I0404	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI CHIAVARI IN ZONA COLMATA A SERVIZIO DEI COMUNI DI CHIAVARI, LAVAGNA, COGORNO, LEIVI, COREGLIA, ZOAGLI, SAN COLOMBANO, CARASCO, BORZONASCA, MEZZANEGO E NE.*ZONA COLMATA*REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E RETI CONNESSE.			D22E18000460005	ALTRO - non risulta effettuata richiesta di finanziamenti da questo ente per questo intervento		--		non risulta effettuata richiesta di finanziamenti da questo ente per questo intervento		Costo progetto 116.928.725
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M2C4I0301	TERRENI DA RIMBOSCHIRE E RINFOLTIRE IN AREE DI CRINALE ZONE BRIC TEIOLO , ALTURE SESTRI Ponente MUNICIPIO 6 - MEDIO Ponente*VIA COMUNE DI GENOVA*MIGLIORAMENTI FORESTALI IN ACCORDO AL VIGENTE PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE TRAMITE PIANTAGIONE DI ALBERI E ARBUSTI	1.291.157,00	1.291.157,00	D32F22000770006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	16.446,78	-			

CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA- PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ RILEVATE DALL'AMMINISTRAZIONE	NOTE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0303	EDIFICIO SCOLASTICO DI COMPETENZA DELLA CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA - ISTITUTO CABOTO*VIA GHIO 2*INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CORPO LATERALE (LOTTO II)	787.066,00	787.066,00	D21B21000810001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	-	86.706,67	importo finanziato in colonna G NON corrisponde all'importo finanziato dell'intervento pari a 867.066,70 €. L'importo originario era stato incrementato di 80.000,00 € in fase di richiesta di rimodulazione interventi. RUP precedente BURRONI Roberta, cambiato gennaio 2023		
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0303	LICEO E.LUZZATI - VIA GHIO 14 - CHIAVARI (GE)*VIA GHIO 14 - CHIAVARI*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI DELL'EDIFICIO MEDIANTE RIPRISTINO DELLE OPERE IN C.A.E RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI	890.000,00	890.000,00	D28B20000690001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	22.050,09	178.000,00	importo finanziato va maggiorato del 10% di pre-assegnazione Art. 26 D.L. 4 50/2022 Fondo Opere Indifferibili. Nuovo importo del finanziamento 979.000 €		
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0303	LICEO ANNESSO AL CONVITTO COLOMBO - CONVITTO COLOMBO - SCUOLA ELEMENTARE ANNESSA AL CONVITTO COLOMBO - SCUOLA MEDIA ANNESSA AL CONVITTO COLOMBO*VIA BELLUCCI DINO 4-6 - GENOVA*INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA	300.000,00	300.000,00	D31D20000560001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	70.947,26	186.000,00	importo finanziato in colonna G NON corrisponde all'importo finanziato dell'intervento pari a 1.860.000 €. Inoltre l'importo finanziato va maggiorato del 10% di pre-assegnazione Art. 26 D.L. 4 50/2022 Fondo Opere Indifferibili. Nuovo importo del finanziamento 2.046.000 €		
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0303	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE & INDUSTRIALE STATALE MAJORANA-GIORGI, SEDE DI VIA TIMAVO, E ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE EINAUDI-CASAREGGI GALILEI, PLESSO DI PIAZZA SOPRANIS*PIAZZA SOPRANIS 5 GENOVA*INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI	1.050.000,00	1.050.000,00	D31D20000570001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	238.954,64	118.093,22	importo finanziato in colonna G NON corrisponde all'importo finanziato dell'intervento pari a 1.180.932,15 €		

CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA- PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ RILEVATE DALL'AMMINISTRAZIONE	NOTE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0303	ISTITUTO ODERO - VIA BRISCATA N.4 - GENOVA*VIA BRISCATA 4 - GENOVA*INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA	720.000,00	720.000,00	D31D20000580001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	70.032,85	175.000,00	importo finanziato in colonna G NON corrisponde all'importo finanziato dell'intervento pari a 1.750.000 €. Inoltre l'importo finanziato va maggiorato del 10% di pre-assegnazione Art. 26 D.L. 4 50/2022 Fondo Opere Indifferibili. Nuovo importo del finanziamento 1.925.000 €		
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0303	ISTITUTO FIRPO VIA CANEVARI GENOVA*VIA CANEVARI GENOVA*INTERVENTO DIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONEDELLE COPERTURE E DEI SERRAMENTI	1.275.000,00	1.275.000,00	D31D20000590001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	38.748,85	198.210,00	importo finanziato in colonna G NON corrisponde all'importo finanziato dell'intervento pari a 1.982.100 €. Inoltre l'importo finanziato va maggiorato del 10% di pre-assegnazione Art. 26 D.L. 4 50/2022 Fondo Opere Indifferibili. Nuovo importo del finanziamento 2.180.310,00 €. RUP precedente Burroni Roberta, cambiato gennaio 2023		
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0103	ISTITUTO KLEE PAUL / BARABINO NICOLÒ - NUOVA PALESTRA*VIA G.MAGGIO 11 - GENOVA*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	1.200.000,00	1.200.000,00	D35E22000030006	ATTIVO	FASE DI ATTUAZIONE	-	-			
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0103	I.I.S.MAJORANA/MARSANO E LICEO DA VINCI*VIA SALVATOR ALLENDE 41-42-44-48, 16138 GENOVA*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE			D35E22000110006	ALTRO - NON FINANZIATO						Costo progetto 1.260.000
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0303	LICEO DA VINCI LEONARDO - VIA BARTOLOMEO ARECCO, 2 - GENOVA.*VIA ARECCO 2 GENOVA*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONEDELLE COPERTURE IN ARDESIA DELL'EDIFICIO, DELLA COPERTURE DELL'INGRESSO E RECUPERO DEL SOTTOTETTO	1.300.000,00	1.300.000,00	D36I20000010001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	54.689,99	260.000,00	importo finanziato va maggiorato del 10% di pre-assegnazione Art. 26 D.L. 4 50/2022 Fondo Opere Indifferibili. Nuovo importo del finanziamento 1.430.000 €. RUP precedente BURRONI Roberta, cambiato gennaio 2023		

CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA- PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ RILEVATE DALL'AMMINISTRAZIONE	NOTE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0303	PALAZZINA DI CORSO DOGALI N.1/D - GENOVA*CORSO DOGALI 1/D - GENOVA*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONEDELL'EDIFICIO	3.000.000,00	3.000.000,00	D36I20000020001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	-	600.000,00	importo finanziato va maggiorato del 10% di pre-assegnazione Art. 26 D.L. 4 50/2022 Fondo Opere Indifferibili. Nuovo importo del finanziamento 3.300.000 €		
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0303	ISTITUTO MAJORANA ETTORE/GIORGI G. - LICEO DA VINCI LEONARDO SUCCURSALE - AUDITORIUM - CENTRO DI ASCOLTO - IST. MARSANO BERNARDO SUCCURSALE*VIA SALVADOR ALLENDE 44 - GENOVA*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONEDELLE COPERTURE E DEI SERRAMENTI	2.400.000,00	2.400.000,00	D38B20000950001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	64.198,63	480.000,00	importo finanziato va maggiorato del 10% di pre-assegnazione Art. 26 D.L. 4 50/2022 Fondo Opere Indifferibili. Nuovo importo del finanziamento 2.640.000 €		
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0303	L'ISTITUTO GASLINI PIERO / MEUCCI ANTONIO - PIAZZALE PAUL VALERY, 5 - GENOVA*PIAZZA VALERY N.5 GENOVA*INTERVENTO PER RIPRISTINARE LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI FALDA	300.000,00	300.000,00	D38B20000960001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	-	60.000,00	importo finanziato va maggiorato del 10% di pre-assegnazione Art. 26 D.L. 4 50/2022 Fondo Opere Indifferibili. Nuovo importo del finanziamento 330.000 €		
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0303	IPCSA MARCO POLO SEZIONE ASSOCIATA VIA SAN ROCCO, 1 CAMOGLI (GE)*VIA S.ROCCO 1 CAMOGLI*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONEDELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI	735.000,00	735.000,00	D38B20000980001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	27.533,69	147.000,00	importo finanziato va maggiorato del 10% di pre-assegnazione Art. 26 D.L. 4 50/2022 Fondo Opere Indifferibili. Nuovo importo del finanziamento 808.500 €. RUP precedente BURRONI Roberta, cambiato gennaio 2023		
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0303	L.S.S./L.C.S. - KIN MARTIN LUTHER - SEDE - VIA STURLA N. 63 - GENOVA*VIA STURLA N.63 - GENOVA*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONEDEI PROSPETTIDELL'EDIFICIOMEDIA NTE SOSTITUZIONE DELLE CURTAIN WALL E DEI SOFFITTI	1.050.000,00	1.050.000,00	D38B20001000001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	31.586,68	210.000,00	importo finanziato va maggiorato del 10% di pre-assegnazione Art. 26 D.L. 4 50/2022 Fondo Opere Indifferibili. Nuovo importo del finanziamento 1.155.000 €. RUP precedente BURRONI Roberta, cambiato gennaio 2023		
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0303	ISTITUTO NAUTICO SANGIORGIO DI CALATA DARSENA*VIA CALATA DARSENA - GENOVA*INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA AI CANALI DI GRONDA	250.000,00	250.000,00	D38B20001010001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	51.570,73	50.000,00			

CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA- PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE- ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ RILEVATE DALL' AMMINISTRAZIONE	NOTE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0303	ISTITUTO MONTALE DI VIA ARCHIMEDE, 42, 44,46 GENOVA*VIA ARCHIMEDE 42-44-46*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI DELL'EDIFICIO E RIQUALIFICAZIONE DEI SOFFITTI	601.075,00	601.075,00	D38B20001020001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	26.586,09	120.215,03	importo finanziato va maggiorato del 10% di pre-assegnazione Art. 26 D.L. 4 50/2022 Fondo Opere Indifferibili. Nuovo importo del finanziamento 661.182,64 €. RUP precedente BURRONI Roberta, cambiato gennaio 2023		
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0103	LICEO KING MARTIN LUTHER*VIA STURLA 63 - 16131 GENOVA (GE)*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE			D39I22000010006	ALTRO - NON FINANZIATO						Costo progetto 526.000
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0303	EDIFICIO SCOLASTICO DI COMPETENZA DELLA CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA - ISTITUTO MARCO POLO SUCCURSALE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI (GE)*VIA SORACCO 7*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PIANO TERRA PER REALIZZAZIONE LABORATORI CUCINA E SERVIZI ANNESSI CON EFFICIENTAMENTO IMPIANTI E STRUTTURE.	610.000,00	610.000,00	D39J21003540001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	105.002,04	61.000,00	importo finanziato va maggiorato del 10% di pre-assegnazione Art. 26 D.L. 4 50/2022 Fondo Opere Indifferibili. Nuovo importo del finanziamento 671.000 €		
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0303	EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA*VIA BELLUCCI 4*LAS.21.00022.SER.00001.PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DELL' INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE E RESTAURO ORATORIO E GALLERIA NAPOLEONICA VIA BELLUCCI, 4 (GE)			D39J21022040003	ALTRO				CUP in fase di dismissione / costo progetto definitivo da ricomprendere nel CUP di progetto D31D20000560001 (RIGA 25 del presente file excel) intervento "LICEO ANNESSO AL CONVITTO COLOMBO - CONVITTO COLOMBO - SCUOLA ELEMENTARE ANNESSA AL CONVITTO COLOMBO - SCUOLA MEDIA ANNESSA AL CONVITTO COLOMBO*VIA BELLUCCI DINO 4-6 - GENOVA*INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA"		Costo progetto 159.942

CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA- PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ RILEVATE DALL'AMMINISTRAZIONE	NOTE
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0303	LOCALI A DISPOSIZIONE - EX COMPLESSO MAESTRE PIE - GEROLAMO SPERONI - 37 - RECCO - CAP 16036*VIA GEROLAMO SPERONI 37 - RECCO*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONEDELL'EDIFICIO	7.500.000,00	7.500.000,00	D76I20000010001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	97.076,93	560.000,00	importo finanziato in colonna G NON corrisponde all'importo finanziato dell'intervento pari a 5.600.000 €. L'importo originario era stato decurtato di 80.000,00 € in fase di richiesta di rimodulazione interventi. Inoltre l'importo finanziato va maggiorato del 10% di pre-assegnazione Art. 26 D.L. 4 50/2022 Fondo Opere Indifferibili. Nuovo importo del finanziamento 6.160.000 €		
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M4C1I0103	ISTITUTO LICEO DA VIGO GIOVANNI /DA RECCO NICOLOSO - PALESTRA*VIA GUGLIELMO MARCONI 41 - RECCO (GE)*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE			D79I22000040006	ALTRO - NON FINANZIATO						Costo progetto 469.000
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M5C2I0202	POLO SCOLASTICO DEL PONENTE-VIA GIOTTO*VIA GIOTTO*INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DEL PONENTE VIA GIOTTO 2, 8 E 10 16154 (GE)	27.278.000,00	27.278.000,00	D34D22000190006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	2.926.040,76	2.727.799,98	importo finanziato originario è stato maggiorato tramite procedura ordinaria di adeguamento prezzi Art. 26 D.L. 4 50/2022 Fondo Opere Indifferibili. Nuovo importo del finanziamento 30.392.258,90 €, RUP precedente BURRONI Roberta, cambiato gennaio 2023		
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	M5C2I0202	INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL NODO URBANO E INFRASTRUTTURALE DI LOCALITÀ GEO*LOCALITÀ GEO, SP 52*RIGENERAZIONE DEL NODO URBANO DI GEO PER RAFFORZARE LA COESIONE E L'INTEGRAZIONE SOCIALE, INCREMENTARE LA SICUREZZA DELLA MOBILITÀ E L'ACCESSIBILITÀ AL SANTUARIO N.S. DELLA GUARDIA/AREE PRODUTTIVE ESISTENTI, ATTRAVERSO LA RIORGANIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE	7.202.751,00	7.202.751,00	D41B19000560001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	-	720.275,10	importo finanziato originario è stato maggiorato tramite procedura ordinaria di adeguamento prezzi Art. 26 D.L. 4 50/2022 Fondo Opere Indifferibili. Nuovo importo del finanziamento 8.973.708,15 €	Rischi tempi lunghi per le procedure di esproprio che possono partire solo a progetto definitivo approvato. Non esistono procedure di semplificazione PNRR sugli espropri	

CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA- PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ RILEVATE DALL'AMMINISTRAZIONE	NOTE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M1C1I0104	MISURA 1.4.4. - SPIDE CIE - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE*VIALE GIACOMO MATTEOTTI 147*MISURA 1.4.4. - SPIDE CIE - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	14.000,00	14.000,00	I51C22000980006	ATTIVO	PROGETTAZIONE					
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M1C3I0203	PARCO DEL PALAZZO DEL GOVERNO, SEDE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA EX GRAND HOTEL RIVIERA PALACE*VIALE MATTEOTTI N. 147*INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE STORICA DEL PARCO DEL PALAZZO SEDE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA EX GRAND HOTEL RIVIERA PALACE			I56C22000010006					NON AMMESSO A FINANZIAMENTO		Costo del progetto 451.827
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M2C3I0101	EDIFICIO SEDE IIS LICEO " C. AMORETTI" E ISTITUTO COMPRENSIVO " M. NOVARO" DI IMPERIA*PIAZZA DE NEGRI*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO			I52C22000060006					NON AMMESSO A FINANZIAMENTO - COMUNICAZIONE MINISTERO ISTRUZIONE - UNITA' DI MISSIONE PNRR PROT. 11615/09,05,2022		Costo del progetto 4.566.680
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M4C1I0303	LICEO APROSIO DI VENTIMIGLIA, LICEO CASSINI DI SANREMO, LICEO AMORETTI DI SANREMO E LICEO ARTISTICO IMPERIA*VIA INDIRIZZI VARI*RIFACIMENTO E CONVERSIONE A GAS CENTRALI TERMICHE LICEO APROSIO DI VENTIMIGLIA, LICEO CASSINI DI SANREMO, LICEO AMORETTI DI SANREMO E LICEO ARTISTICO IMPERIA	407.000,00	407.000,00	I15H20000210001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	233.499,66	81.400,00			
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M4C1I0103	LICEO A. APROSIO*VIA DON B. CORTI 7*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	507.500,00	507.500,00	I39I22000000006	ALTRO	PROGETTAZIONE				FINANZIAMENTO CON DECRETO 320/2022 SCORRIMENTO GRADUATORIE - IN FASE DI REGISTRAZIONE	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M4C1I0303	LICEO A.APROSIO "VIA DON B. CORTI 7 PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE	507.500,00	507.500,00	I39I22000000006	ALTRO	PROGETTAZIONE				FINANZIAMENTOM CON DECRETO 320/2022 SCORRIMENTO GRADUATORIE - IN FASE DI REGISTRAZIONE	

CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA- PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ RILEVATE DALL' AMMINISTRAZIONE	NOTE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M4C1I0303	IIS G.RUFFINI E LICEO G.P.VIEUSSEUX DI IMPERIA*VIA TERRE BIANCHE*ADEGUAMENTO NORMATIVO E SPOSTAMENTO CENTRALE TERMICAE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA IST.TECN. G. RUFFINI E LICEO G.P.VIEUSSEUX DI IMPERIA	590.000,00	590.000,00	158B20000320001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	474.581,75	118.000,00			
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M4C1I0103	IPSIA G. MARCONI IMPERIA*VIA GIBELLI 4*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE			I59I22000070006					NON AMMESSO A FINANZIAMENTO - COMUNICAZIONE MINISTERO ISTRUZIONE - UNITA' PNRR PROT. 20247/16,08,2022		Costo del progetto 127.000
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M4C1I0303	IPSSAR " RUFFINI - AICARDI " *VIA S. FRANCESCO SN*REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCOLASTICA	3.535.969,00	3.535.969,00	I61B21000860001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	74.213,35	707.193,80	ASSEGNATO ANCHE EXTRAFINANZIAMENTO 10% OPERE INDIFFERIBILI		
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M4C1I0303	SEDE IIS C. COLOMBO / IPSSAR E.RUFFINI DI TAGGIA (PLESSO EX CASERME REVELLI) *VIA S.FRANCESCO*ADATTAMENTO SPAZI AD USO DIDATTICO PRESSO IST. C. COLOMBO E IPSSAR E.RUFFINI DI TAGGIA (PLESSO EX CASERME REVELLI)	1.400.000,00	1.400.000,00	I68B20000330001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	33.600,20	280.000,00	ASSEGNATO ANCHE EXTRAFINANZIAMENTO 10% OPERE INDIFFERIBILI		
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M4C1I0303	IIS E.MONTALE DI BORDIGHERA*VIA CAGLIARI*RIFACIMENTO IMPIANTI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO I.I.S. E. MONTALE DIBORDIGHERA	290.000,00	290.000,00	I91D20000560001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	8.305,00	58.000,00	ASSEGNATO ANCHE EXTRAFINANZIAMENTO 10% OPERE INDIFFERIBILI		
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M4C1I0303	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DENOMINATO "I.T.I. GALILEI" - POLO TECNOLOGICO IMPERIESE	827.000,00	827.000,00	I52C21000960003	ALTRO	PROGETTAZIONE				IN ATTESA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO DEL MIMS	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M4C1I0303	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DENOMINATO "I.T.I. GALILEI" - POLO TECNOLOGICO IMPERIESE	827.000,00	827.000,00	I52C21000960003	ALTRO	PROGETTAZIONE				IN ATTESA DEL FINANZIAMENTO DEL MIMS	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M5C3I0101	STRADA INTERCOMUNALE MONTEGROSSO PIAN LATTEMENDATICA*TERRITORI COMUNALI*LAVORI DI COMPLETAMENTO			I17H22000940001					NON AMMESSO A FINANZIAMENTO (DECR. 394/2021 ART.6 c.1)	PROGETTO A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL PNC	Costo del progetto 63.000
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M5C3I0101	S.P. 100*DAL KM 0+000 AL KM 3+000*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI			I27H22001240001					NON AMMESSO A FINANZIAMENTO (DECR. 394/2021 ART.6 c.1)	PROGETTO A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL PNC	Costo del progetto 105.000
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M5C3I0101	S.P. 3 ACQUETICO-MENDATICA ED S.P. 5 DI PORNASSIO*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI	300.000,00	300.000,00	I27H22001250001	ATTIVO	PROGETTAZIONE				PROGETTO A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL PNC	

CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA- PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ RILEVATE DALL'AMMINISTRAZIONE	NOTE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M5C3I0101	S.P. 6 DI ARMO, S.P. 8 DI LOVEGNO, S.P. 84 DI NIRASCA, S.P. 85 DI TROVASTA E S.P. 95*DAL KM 0+000 AL KM 5+000*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI	400.000,00	400.000,00	I37H22001480001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	-	400.000,00		PROGETTO A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL PNC	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M5C3I0101	S.P. 10 VESSALICO-LENZARI, S.P. 12 BORGHETTO D' ARROSCIA GAZZO, S.P. 13 BORGHETTO D' ARROSCIA GAVENOLA, S.P. 14 DI AQUILA, S.P. 15 AQUILA D' ARROSCIA-LEVERONE ED S.P. 16 DI COSTA BACELEGA*TERRITORI COMUNALI*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI	500.000,00	500.000,00	I47H22001000001	ATTIVO	PROGETTAZIONE				PROGETTO A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL PNC	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M5C3I0101	S.P. 3 MENDATICA-COSIO D' ARROSCIA*TERRITORI COMUNALI*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI	126.705,00	126.705,00	I57H22001250001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	-	126.705,00		PROGETTO A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL PNC	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M5C3I0101	S.P. 17 REZZO-PASSO TEGLIA ES.P. 18 DI CENOVA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI	316.023,00	316.023,00	I57H22001260001	ATTIVO	PROGETTAZIONE				PROGETTO A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL PNC	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M5C3I0101	S.P. 17 REZZO PASSO TEGLIA E S.P. 18 DI CENOVA*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI	316.023,00	316.023,00	I57H22001260001	ATTIVO	PROGETTAZIONE					
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M5C3I0101	S.P. 9 DI SIGLIOLI, S.P. 11 BORGHETTO D' ARROSCIA-UBAGHETTA, S.P. 83 UBAGA-MONTECALVO*TERRITORI COMUNALI*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI	253.410,00	253.410,00	I57H22001270001	ATTIVO	PROGETTAZIONE				PROGETTO A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL PNC	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M5C3I0101	S.P. 19 S. BERNARDO DI CONIO-CASE CASTELLARO*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI			I57H22001280001					NON AMMESSO A FINANZIAMENTO (DECR. 394/2021 ART.6 c.1)	PROGETTO A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL PNC	Costo del progetto 105.000
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M5C3I0101	S.P. 3*TRATTO COSIO D' ARROSCIA-S.S. 28*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI			I67H22001220001					NON AMMESSO A FINANZIAMENTO (DECR. 394/2021 ART.6 c.1)	PROGETTO A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL PNC	Costo del progetto 105.000
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M5C3I0101	S.P. 100 DI MONESI*TERRITORI COMUNALI*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI	300.000,00	300.000,00	I77H22000890001	ATTIVO	PROGETTAZIONE				PROGETTO A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL PNC	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M5C3I0101	S.P. 95*DAL KM 0+000 AL KM 5+000*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI			I77H22000900001					NON AMMESSO A FINANZIAMENTO (DECR. 394/2021 ART.6 c.1)	PROGETTO A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL PNC	Costo del progetto 210.000
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M5C3I0101	S.P. 7 DI MUZIO, S.P. 8 DI LOVEGNO, S.P. 84 DI NIRASCA, S.P. 85 DI TROVASTA E S.P. 95*DAL KM 0+000 AL KM 5+000*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI	226.705,00	226.705,00	I77H22000920001	ATTIVO	PROGETTAZIONE				PROGETTO A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL PNC	

CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA- PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ RILEVATE DALL' AMMINISTRAZIONE	NOTE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M5C3I0101	S.P. 74 MENDATICA - S.BERNARDO DI MENDATICA ED S.P. 100 DI MONESI*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE BITUMATO	210.682,00	210.682,00	I87H22000760001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	172.886,46	210.682,00		PROGETTO A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL PNC	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M5C3I0101	S.P. 78 DI MEZZACOSTA*TERRITORI COMUNALI*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI	226.705,00	226.705,00	I97H22001280001	ATTIVO	PROGETTAZIONE				PROGETTO A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL PNC	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	M5C3I0101	S.P. 78 DI MEZZACOSTA*TRATTO GAVENOLA-CONFINE PROVINCIA*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI	300.000,00	300.000,00	I97H22001290001	ATTIVO	PROGETTAZIONE				PROGETTO A VALERE ESCLUSIVAMENTE SUL PNC	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	M1C1I0104	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI SPID E CIE	14.000,00	14.000,00	J51F22002490006	ATTIVO	PROGETTAZIONE					
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	M2C4I0404	LAVORI DI CONFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO DEI REFLUI DEL COMUNE DI ALASSIO, E DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE STESSO*ALASSIO*SI TRATTA DI COLLETTARE I REFLUI PROVENIENTI DALL'AGGLOMERATO DI ALASSIO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE SITO IN COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO			J41B15000630005					Finanziamento non richiesto a valere sui fondi PNRR. CUP di massima preso per accelerare al massimo le procedure in caso di concessione. Non concesso		Costo del progetto 59.683.000
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	M4C1I0303	LICEO G. CALASANZIO*PIAZZA CALASANZIO 3*INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO	1.300.000,00	1.300.000,00	J34I18000410001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	-	260.000,00		Si precisa che l'importo totale ammesso a finanziamento è pari ad Euro 1.430.000 a seguito di preassegnazione FOI Art. 26 DL 50/2022 (+10%).L'importo dell'anticipazione è stato incassato per 130.000 su richiesta d'ufficio e per 130.000 quando non si aveva notizia che il decreto Miur 217/2021 fosse confluito in PNRR	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	M4C1I0303	LICEO STATALE G. CALASANZIO*PIAZZA CALASANZIO 3*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI ALLA NORMATIVADI PREVENZIONE INCENDI	320.000,00	320.000,00	J35H20000100001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	18.720,00	64.000,00		Si precisa che l'importo totale ammesso a finanziamento è pari ad Euro 352.000 a seguito di preassegnazione FOI Art. 26 DL 50/2022 (+10%)	

CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA- PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ RILEVATE DALL'AMMINISTRAZIONE	NOTE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	M4C1I0303	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE GIANCARDI-GALILEI-AICARDI - SEZIONE ALBERGHIERO DI ALASSIO - ALA VECCHIA*VIA PETRARCA 7*INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO	1.780.000,00	1.780.000,00	J43H18000260001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	4.098,36	356.000,00		L'importo dell'anticipazione è stato incassato per 178.000 su richiesta d'ufficio e per 178.000 quando non si aveva notizia che il decreto Miur 217/2021 fosse confluito in PNRR	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	M4C1I0303	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE MAZZINI-DA VINCI - SEZIONE ODONTOTECNICI-OTTICI*VIA NINO OXILIA 26*INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO	800.000,00	800.000,00	J53H18000300001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	-	160.000,00		Si precisa che l'importo totale ammesso a finanziamento è pari ad Euro 880.000 a seguito di preassegnazione FOI Art. 26 DL 50/2022 (+10%)	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	M4C1I0303	LICEO SCIENTIFICO 'O. GRASSI' - ALA NUOVA*VIA CORRIDONI 2 R*INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO	390.000,00	390.000,00	J53H18000310001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	-	78.000,00		Si precisa che l'importo totale ammesso a finanziamento è pari ad Euro 429.000 a seguito di preassegnazione FOI Art. 26 DL 50/2022 (+10%)	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	M4C1I0303	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BOSELLI-ALBERTI*VIA S. GIOVANNI BOSCO 6*ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	500.000,00	500.000,00	J54E21000430001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	-	100.000,00		Si precisa che l'importo totale ammesso a finanziamento è pari ad Euro 550.000 a seguito di preassegnazione FOI Art. 26 DL 50/2022 (+10%). L'importo dell'anticipazione è stato incassato per 50.000 su richiesta d'ufficio e per 50.000 quando non si aveva notizia che il decreto Miur 217/2021 fosse confluito in PNRR	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	M4C1I0303	LICEO SCIENTIFICO O. GRASSI*VIA CORRIDONI 2 R*ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	373.330,00	373.330,00	J54E21000440001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	-	74.666,00		L'importo dell'anticipazione è stato incassato per 37.333 su richiesta d'ufficio e per 37.333 quando non si aveva notizia che il decreto Miur 217/2021 fosse confluito in PNRR	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	M4C1I0303	LICEO "CHIABRERA-MARTINI" -- SEZIONE ARTISTICO - ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "MAZZINI-DA VINCI" - SEZ. AZIENDALE TURISTICA*VIA AONZO 2*INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO	800.000,00	800.000,00	J54I18000320001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	20.800,00	160.000,00		Si precisa che l'importo totale ammesso a finanziamento è pari ad Euro 880.000 a seguito di preassegnazione FOI Art. 26 DL 50/2022 (+10%)	

CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA- PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ RILEVATE DALL'AMMINISTRAZIONE	NOTE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	M4C1I0303	LICEO DELLA ROVERE - SUCCURSALE*VIA MANZONI 5*INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO	800.000,00	800.000,00	J54I18000330001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	19.136,05	160.000,00		Si precisa che l'importo totale ammesso a finanziamento è pari ad Euro 880.000 a seguito di preassegnazione FOI Art. 26 DL 50/2022 (+10%)	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	M4C1I0103	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ALLA ROCCA 35 SAVONA SEDE DELL'I.S.S. FERRARIS-PANCALDO*VIA ALLA ROCCA 35*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	200.000,00	200.000,00	J57G22000000006	ATTIVO	FASE DI ATTUAZIONE	-				
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	M4C1I0303	LICEO SCIENTIFICO ISSEL*VIA FIUME 42*ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	300.000,00	300.000,00	J57H21001100001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	60.000,00		Si precisa che l'importo totale ammesso a finanziamento è pari ad Euro 330.000 a seguito di preassegnazione FOI Art. 26 DL 50/2022 (+10%). In liquidazione € 24.628,37 alla data di compilazione della presente tabella. L'importo ricevuto in anticipazione è stato incassato per 30.000 su richiesta d'ufficio e per 30.000 quando non si aveva notizia che il decreto Miur 217/2021 fosse confluito in PNRR	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	M4C1I0303	ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE FERRARIS-PANCALDO- SEZIONE INDUSTRIALE*VIA ALLA ROCCA 35*INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI	120.000,00	120.000,00	J58B20000310001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	101.212,85	24.000,00			
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	M4C1I0103	PALESTRA 'DANIELE GHIONE' DI VIA ALLA ROCCA 35 UTILIZZATA DALL'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE FERRARIS-PANCALDO E DALL'ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE MAZZINI-FERRARIS*VIA ALLA ROCCA 35*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	2.145.000,00	2.145.000,00	J59I22000110006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	-	214.500,00			

CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA- PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE- ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ RILEVATE DALL' AMMINISTRAZIONE	NOTE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	M2C4I0404	COLLEGAMENTO TRA L'IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO DI VADINO ELA CIVICA FOGNATURA IN VIA DEL ROGGETTO, CON VASCA DI LAMINAZIONE DELLE PORTATE SITA NEL PIAZZALE DELL'EX TRIBUNALE IN VIA BOLOGNA*LOCALITÀ VADINO*COLLEGAMENTO TRA L'IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO DI VADINO E LA CIVICA FOGNATURA IN VIA DEL ROGGETTO, CON VASCA DI LAMINAZIONE DELLE PORTATE SITA NEL PIAZZALE DELL'EX TRIBUNALE IN VIA BOLOGNA			G52E21000990005						ALTRO: la procedura ministeriale per il finanziamento è in atto, non è ancora conclusa. Il costo del progetto, arrotondato all'intero, è € 3.923.689,43 + IVA € 863.211,67 =€4.786.901.	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	M2C4I0404	IMPIANTO CONSORTILE DI DEPURAZIONE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO*LOC. CAPPELLOTTI*OPERE DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO			E65H22001430006						ALTRO: la procedura ministeriale per il finanziamento è in atto, non è ancora conclusa. Il costo del progetto, arrotondato all'intero, è € 5.654.687,09 + IVA € 1.244.031,16= € 6.898.718 Ulteriori chiarimenti nella nostra nota prot. 3190/2023 del 20/01/2023 trasmessa via pec a liguria.controllo@corteconticert.it	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA	M1C1I0104	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE SPID E CIE	14.000,00	14.000,00	I41F22002450006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	-	-			
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA	M2C3I0101	ISTITUTO SCOLASTICO CAPELLINI SAURO*VIA DORIA 2*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO			I41B22000270006						effettuata richiesta fondi - in attesa di riscontro su assegnazione finanziaria	Costo del progetto 14.950.950
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA	M4C1I0303	ISTITUTO SCOLASTICO EINAUDI*VIA LAMARMORA*INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	1.300.610,00	1.300.610,00	I41B21000770001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	91.628,17	130.060,93		procedura di affidamento avviata entro 31/12/2022	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA	M4C1I0303	ISTITUTO SCOLASTICO FOSSATI DA PASSANO EDIFICIO NUOVO PIGNONE*VIA FEDERICI*INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2.340.000,00	2.340.000,00	I41B21000780001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	4.554,67	234.000,00		procedura di affidamento avviata entro 31/12/2022	

CITTÁ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA, IMPERIA, LA SPEZIA- PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR/PNC

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ RILEVATE DALL'AMMINISTRAZIONE	NOTE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA	M4C1I0303	ISTITUTO SCOLASTICO CASINI*VIA FONTEVIVO*INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO SISMICO EMESSA IN SICUREZZA EDILIZIA DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FACCIATA	905.000,00	905.000,00	I42E20000100001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	16.651,19	181.000,00		procedura di affidamento avviata entro 31/12/2022	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA	M4C1I0303	ISTITUTO SCOLASTICO CAPELLINI/SAURO*VIALE ITALIA*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA	342.363,00	342.363,00	I45H20000100001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	15.474,68	-		procedura di affidamento avviata entro 31/12/2022	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA	M4C1I0303	ISTITUTO SCOLASTICO CARDARELLI*VIA CARDUCCI*INTERVENTO ORGANICO DI MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA ED ANTINCENDIO	150.000,00	150.000,00	I45H20000110001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	8.128,36	30.000,00		procedura di affidamento avviata entro 31/12/2022	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA	M4C1I0303	ISTITUTO SCOLASTICO FOSSATI*VIA BRAGARINA*MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA	800.000,00	800.000,00	I48B20000410001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	3.338,54	160.000,00		procedura di affidamento avviata entro 31/12/2022	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA	M4C1I0103	' ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E TECNOLOGICO "A. FOSSATI - M. DA PASSANO*VIA BRAGARINA*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE			I49I22000030007						effettuata richiesta fondi - in attesa di riscontro su assegnazione finanziaria	Costo del progetto 638.000
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA	M4C1I0303	ISTITUTO SCOLASTICO ARZELA'/ARENTUCELLI*VIA DEI MOLINI*MESSA IN SICUREZZA RIMOZIONE FRANGISOLE PER COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO STATICO SISMICO	69.500,00	69.500,00	I72E20000060001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	69.500,00	13.900,00			
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA	M4C1I0303	ISTITUTO SCOLASTICO PARENTUCELLI/ARZELA*VIA DEI MOLINI*MESSA IN SICUREZZA EDILIZIA DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA E DELLA PISCINA E RIPRISTINO DELLA FACCIATA DELLA PALESTRA	500.000,00	500.000,00	I78B20000200001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	9.347,14	100.000,00		procedura di affidamento avviata entro 31/12/2022	
			112.043.956,00	100.128.956,00				5.583.425,40	11.480.407,73			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI ALASSIO - SAVONA -	M1C1I0102	DATA CENTER COMUNE DI ALASSIO*PIAZZA LIBERTÀ 3*TRASFERIMENTO IN CLOUD DELLE APPLICAZIONI GESTIONALI PRINCIPALI DELL'ENTE	121.992,00	121.992,00	E41C22001050006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI ALASSIO - SAVONA -	M1C1I0104	DATA CENTER COMUNALE*PIAZZA LIBERTÀ 3*ACCESSO AL SITO WEB TRAMITE C.I.E.	14.000,00	14.000,00	E41F20000060006	Intervento già realizzato con fondi propri dopo il 01/02/2020.	INTERVENTO CONCLUSO	0,00	0,00			
COMUNE DI ALASSIO - SAVONA -	M1C1I0104	DATA CENTER COMUNALE*PIAZZA LIBERTÀ 3*SERVIZI DI PAGAENTO ELETTRONICO IN AMBITO PAGOPA	12.855,00	12.855,00	E41F22002110006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI ALASSIO - SAVONA -	M1C1I0104	DATA CENTER COMUNALE*PIAZZA LIBERTÀ 3*SERVIZI INFORMATIVI DA ATTIVARE SULLA APP IO	17.150,00	17.150,00	E41F22002120006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI ALASSIO - SAVONA -	M2C4I0202	LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI CITTADINI (VIA IGNAZIO DELL'ORO, C.SO EUROPA, VIALE HANBURY) SUL TERRITORIO COMUNALE.*TERRITORIO COMUNALE*LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	90.000,00	90.000,00	E43D20003000001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	67.505,22				
COMUNE DI ALASSIO - SAVONA -	M2C4I0202	PROGETTO ESECUTIVO DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE CON LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA GRAMSCI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.*VIA GRAMSCI*MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA GRAMSCI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	252.000,00	180.000,00	E43D21002860005	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	232.759,63				
COMUNE DI ALASSIO - SAVONA -	M2C4I0202	RIPRISTINO DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE DI VIA NAM DANNEGGIATA A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALE CON AUMENTO DI RESILIENZA DA RISCHIO DI FRANA.*VIA NAM*RIPRISTINO DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE DI VIA NAM DANNEGGIATA A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALE CON AUMENTO DI RESILIENZA DA RISCHIO DI FRANA.	200.000,00	200.000,00	E44H20000970001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	151.275,64				

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI ALASSIO - SAVONA -	M2C4I0202	RIPRISTINO DELL'INFRASTRUTTURA DI PASSEGGIATA CICCIONE NEL TRATTO DI PONENTE DANNEGGIATA A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALE CON AUMENTO DI RESILIENZA DA RISCHIO IDRAULICO-MARITTIMO*PASSEGGIATA CICCIONE*RICOSTRUZIONE DELLE STRUTTURE DELLA PASSEGGIATA	920.000,00	920.000,00	E44H20000980001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	39.888,00				
COMUNE DI ALASSIO - SAVONA -	M2C4I0202	RIPRISTINO DELL'INFRASTRUTTURA DI PASSEGGIATA CICCIONE NEL TRATTO BAGNI VALTER-MIRAMARE DANNEGGIATA A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALE CON AUMENTO DI RESILIENZA DA RISCHIO IDRAULICO-MARITTIMO*PASSEGGIATA CICCIONE*RICOSTRUZIONE DELLE STRUTTURE DELLA PASSEGGIATA	1.180.000,00	980.000,00	E44H20000990001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	229.300,00				
COMUNE DI ALASSIO - SAVONA -	M2C4I0202	STRADA COMUNALE LORETO ALTA*VIA LORETO ALTA*MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A PROTEZIONE DELLA STRADA IN REG.LORETO ALTA	400.000,00	400.000,00	E47H20001460001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	1.649,50				
COMUNE DI ALASSIO - SAVONA -	M2C4I0202	SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE CON INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITRIO COMUNALE.*TERRITORIO COMUNALE*SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE CON INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SUL TERRITRIO COMUNALE.	90.000,00	90.000,00	E47H22002390006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00				
COMUNE DI ALASSIO - SAVONA -	M4C1I0101	LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO "DENOMINATO VILLA FISKE" DA DESTINARE A SCUOLA DELL'INFANZIA RELATIVA AL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER GLI INVESTIMENTI DEL PNRR.*REGIONE COSTA LUPARA*CONTRIBUTO PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.1 SCUOLE DELL'INFANZIA	1.423.200,00	1.423.200,00	E45E22000000006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00				
COMUNE DI ALASSIO - SAVONA -	M4C1I0101	REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - SEZIONE PRIMAVERA CON ANNESSI SERVIZI INEGRATIVI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER GLI INTERVENTI DEL PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE RICERCA*VIA G.B. PERA*REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - SEZIONE PRIMAVERA .	636.000,00	636.000,00	E45E22000230006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	63.600,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI ALASSIO - SAVONA -	M4C1I0303	SCUOLA VIA GASTALDI*VIA GASTALDI*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA GASTALDI INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA	8.135.000,00	4.250.411,57	E43H19001230005	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	3.325.994,17	850.082,31			NB: 1) valori AVANZAMENTO FINANZIARIO netti e da calcolarsi oltre parte IVA 10%, parte IVA 22% e parte IVA esente e parte al lordo rit.acconto e oneri a carico Ente per spese tecniche ed incentivi art.113 2) Anticipazione esercizio 2020 fondi Ministero dell'Istruzione
COMUNE DI ALBENGA - SAVONA -	M1C1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 14 SERVIZI DA MIGRARE	252.118,00	252.118,00	F51C22000910006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00	NESSUNA	NESSUNA	
COMUNE DI ALBENGA - SAVONA -	M2C4I0202	STRADE COMUNALI*TERRITORIO COMUNALE*RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SEDI VIARIE DI PIAZZA SACCO E VANZETTI FRAZ. LECA, STRADA CAMPOLAU FRAZ. SAN FEDELE, VIA II^ COSTA REALE	130.000,00	130.000,00	F53D20001200001	RIMODULAZIONE IN QUANTO FINANZIATO CON RISORSE STATALI	INTERVENTO CONCLUSO 28/04/2021	100.150,88	130.000,00	NESSUNA	NESSUNA	€ 4.809,53 ECONOMIA ALTRI PAGAMENTI IVA 22% € 22.033,19 ACC. ART. 113 € 2.006,40
COMUNE DI ALBENGA - SAVONA -	M2C4I0202	STRADE COMUNALI*VIA TERRITORIO COMUNALE*SISTEMAZIONE PIANI VIABILI, ASFALTATURE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	130.000,00	130.000,00	F53D22000190001	RIMODULAZIONE IN QUANTO FINANZIATO CON RISORSE STATALI	ESECUZIONE LAVORI INIZIO 15/09/2022	0,00	0,00	NESSUNA	NESSUNA	
COMUNE DI ALBENGA - SAVONA -	M4C1I0101	ASILO NIDO COMUNALE "ROBERTO DI FERRO"*VIA TORINO*ADEGUAMENTO SISMICO, COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO	1.430.000,00	1.430.000,00	F58I22000350006	ATTIVO	IN FASE DI AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00	NESSUNA	NESSUNA	
COMUNE DI ALBENGA - SAVONA -	M5C2I0101	DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.4 ALBENGANESE DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.5 FINALESE*VIA ALBENGANESE E FINALESE*SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE	211.500,00	211.500,00	F14H22000380007	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	0,00	NESSUNA	NESSUNA	
COMUNE DI ALBENGA - SAVONA -	M5C2I0102	DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.4 ALBENGANESE VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ N.1 17031 ALBENGA (SV)*VIA DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.4 ALBENGANESE*PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ABITAZIONE LAVORO	572.000,00	572.000,00	F74H22000150005	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	0,00	NESSUNA	NESSUNA	

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI ALBENGA - SAVONA -	M5C2I0103	DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.4 ALBENGANESE*VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ N.1 - 17031 ALBENGA (SV)*CENTRO SERVIZI/STAZIONE DI POSTA	545.000,00	545.000,00	F74H22000160007	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00	NESSUNA	NESSUNA	
COMUNE DI ALBENGA - SAVONA -	M5C2I0201	STRADA COMUNALE*VIA MARTIRI DELLA FOCE*REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	770.000,00	660.000,00	F51B19000400005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	60.000,00		NESSUNA	
COMUNE DI ALBENGA - SAVONA -	M5C2I0201	EDIFICI CONFISCATI*VIA CARLOFORTE*PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DI VIA CARLOFORTE	455.943,00	455.943,00	F56H22000000006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00	NESSUNA	NESSUNA	
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M1C1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N.14 SERVIZI DA MIGRARE			H61C22001310006							Nessuna informazione fornita dall'Ente. Costo progetto 121.992
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M1C1I0104	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI			H61F22002840006							Nessuna informazione fornita dall'Ente. Costo progetto 4.802
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI			H61F22002850006							Nessuna informazione fornita dall'Ente. Costo progetto 42.850
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M1C3I0203	PARCO DI VILLA NEGROTTO CAMBIASO SAULI PALLAVICINI*VIA SAULI PALLAVICINO 39*VALORIZZAZIONE			H66C22000080006	NON FINANZIATO				INTERVENTO NON FINANZIATO		Costo progetto 1.985.844
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M2C3I0101	DEMOLIZIONE EDIFICIO SCOLASTICO E NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN ALTRA ZONA*PIAZZA PIERLUCA CALCAGNO E PAOLO RODOCANACHI*DEMOLIZIONE EDIFICIO SCOLASTICO E NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN ALTRA ZONA			H62C21000840001	NON FINANZIATO				INTERVENTO NON FINANZIATO		Costo progetto 4.700.000
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M2C4I0202	IMMOBILE COMUNALE EX MUVITA*VIA MARCONI 165*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO	23.920,00	23.920,00	H63H19001160001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	15.869,30	11.960,00			
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M2C4I0202	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CHIOSSONE*PIAZZA CALCAGNO, 3*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	90.000,00	90.000,00	H64D21000080006	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	52.060,70	0,00			
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M2C4I0202	AREA EX CAVA LUPARA*LOCALITÀ LUPARA*LAVORI NECESSARI AL CONTENIMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO AREA EX CAVA LUPARA E CONTESTUALE MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO RIO LUPARA. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO.	600.000,00	600.000,00	H64H20000890004	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	242.248,35	120.000,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M2C4I0202	PISCINA COMUNALE*PIAZZA RODOCANACHI*MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA PISCINA COMUNALE SITA IN PIAZZA RODOCANACHI AD	66.080,00	66.080,00	H65D2000020001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	51.117,18	33.040,00			
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M2C4I0202	STRADA COMUNALE LOC. MOTTA*VIA VAL LERONE*MESSA IN SICUREZZA			H65F21001270001	NON FINANZIATO				INTERVENTO NON FINANZIATO		Costo progetto 220.000
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M2C4I0202	STRADE COMUNALI*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA			H65F21001280001	NON FINANZIATO				INTERVENTO NON FINANZIATO		Costo progetto 350.000
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M2C4I0202	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CHIOSSONE*PIAZZA CALCAGNO, 3*RIFACIMENTO COPERTURA CON RIMOZIONE AMIANTO			H65F21001310001	NON FINANZIATO				INTERVENTO NON FINANZIATO		Costo progetto 750.000
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M2C4I0202	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. CHIOSSONE*PIAZZA CALCAGNO 3*CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE SCOLASTICO	76.760,00	76.760,00	H66J19000040004	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	62.166,02	15.352,00			
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M2C4I0202	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE PRESSO I CIVICI DAL 20 AL 27 DI VIA PECORARA*VIA PECORARA*LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE PRESSO I CIVICI DAL 20 AL 27 DI VIA PECORARA	302.120,00	302.120,00	H67H20001280004	ATTIVO	COLLAUDO	171.344,23	60.424,00		CUP ERRATO IL CUP CORRETTO H67H20002170004	
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M2C4I0202	STRADA COMUNALE*VIA FILATOIO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI MURI DI CONTENIMENTO	200.000,00	200.000,00	H67H20001310004	IN RIMODULAZIONE	AGGIUDICAZIONE	8.627,27	40.000,00			
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M4C1I0101	ASILO NIDO CUCCIOLI*VIA GUGLIELMO MARCONI 182*RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE	405.025,00	405.025,00	H68H22000030006	ATTIVO	PROGETTAZIONE		0,00			
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M4C1I0303	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. CHIOSSONE*PIAZZA CALCAGNO 3*CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI ALCUNI PILASTRI E TRAVI			H61B21004780004	NON FINANZIATO				INTERVENTO NON FINANZIATO		Costo progetto 120.000
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M5C2I0203	ALLOGGI ERP*VIA ZUNINO E VIA BATTISTI*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI ERP PRESSO VILLA MINA AD ARENZANO	250.000,00	250.000,00	H69J21012000004	IN RIMODULAZIONE	AGGIUDICAZIONE		23.374,61			
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M2C4I0202	SCUOLA PRIMARIA DE CALBOLI*PIAZZA ANSELMO 4*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	90.000,00	90.000,00	H69J20002120001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	51.067,80	0,00			
COMUNE DI ARENZANO - GENOVA -	M2C4I0202	PISCINA COMUNALE SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA	90.000,00	90.000,00	H69J20001670001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	54.780,60	0,00			
COMUNE DI ARCOLA - LA SPEZIA -	M1C1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 14 SERVIZI DA MIGRARE	121.992,00	121.992,00	I91C22001230006	ATTIVO	FASE DI ATTUAZIONE	0,00	0,00		STANZIAMENTO IN FASE DI BILANCIO DI PREVISIONE	

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI ARCOLA - LA SPEZIA -	M2C4I0202	VIA VASAROLO*VIA VASAROLO*DISSESTO IDROGEOLOGICO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CERRI-TREBIANO - 1° LOTTO - VIA VASAROLO	596.412,19	596.412,19	I97H18000220004	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	270.915,79		INCONGRUENZA LEGATA ALL'IMPORTO DEL CUP CHE STIAMO VERIFICANDO E PROVVEDENDO EVENTUALMENTE A RETTIFICARE		
COMUNE DI ARCOLA - LA SPEZIA -	M2C4I0202	VIA VISSANO*VIA VISSANO*INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VISSANO	470.000,00	470.000,00	I97H18001160001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	140.067,28		INCONGRUENZA LEGATA ALL'IMPORTO DEL CUP CHE STIAMO VERIFICANDO E PROVVEDENDO EVENTUALMENTE A RETTIFICARE		
COMUNE DI ARCOLA - LA SPEZIA -	M4C1I0101	PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA PIAZZA 2 GIUGNO*PIAZZA II GIUGNO*INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN PIAZZA 2 GIUGNO COMUNE DI ARCOLA	2.118.168,00	2.118.168,00	I95E21000280006	ATTIVO						
COMUNE DI BORDIGHERA - IMPERIA -	M1C1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 14 SERVIZI DA MIGRARE	108.082,00	108.082,00	B91C22000500006	ATTIVO	progettazione	0,00	0,00			
COMUNE DI BORDIGHERA - IMPERIA -	M1C1I0104	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA XX SETTEMBRE, 32*SITO INTERNET COMUNALE E SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	155.234,00	155.234,00	B91F22000390006	ATTIVO	progettazione	3.000,00	0,00			
COMUNE DI BORDIGHERA - IMPERIA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI			B91F22000770006	REVOCATO		0,00	0,00			importo progetto 11.141
COMUNE DI BORDIGHERA - IMPERIA -	M1C1I0104	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI SPID E CIE			B91F22001030006	REVOCATO		0,00	0,00			Importo progetto 14.000
COMUNE DI BORDIGHERA - IMPERIA -	M1C3I0103	TEATRO DEL PALAZZO DEL PARCO DI BORDIGHERA*CORSO VIA VITTORIO EMANUELE / VIA ROBERTO*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DEL PALAZZO DEL PARCO CON OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE	818.133,00	818.133,00	B94J22000120001	ATTIVO	aggiudicazione	6.760,00	40.000,00			
COMUNE DI BORDIGHERA - IMPERIA -	M2C4I0202	VIA PASTEUR TRATTO VIA DUE STRADE/ VIA DEL LAVORO*VIA PASTEUR*REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO CONDOTTA FOGNARIA VIA PASTEUR, CON ELIMINAZIONE FOGNATURA IN ALVEO RIO BORGHETTO	405.000,00	405.000,00	B94H20001810004	ATTIVO	PROGETTAZIONE	640,98	81.000,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI BORDIGHERA - IMPERIA -	M2C4I0202	VIA DEI COLLI*VIA DEI COLLI*REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA E LINEA ACQUEDOTTO	147.000,00	147.000,00	B94H20001840004	ATTIVO	progettazione	0,00	29.400,00			
COMUNE DI BORDIGHERA - IMPERIA -	M2C4I0202	PALAZZETTO DELLO SPORT EMILIO BIANCHERI*VIA DIAZ*REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL LASTRICO SOLARE PALAZZETTO DELLO SPORT EMILIO BIANCHERI	90.000,00	90.000,00	B94J22000440006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	4.110,00	0,00			
COMUNE DI BORDIGHERA - IMPERIA -	M2C4I0202	VIA DEGLI INGLESI*VIA DEGLI INGLESI*REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE PIOVANE DI VIA DEGLI INGLESI	850.000,00	850.000,00	B97H20001420004	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	170.000,00			
COMUNE DI BORDIGHERA - IMPERIA -	M2C4I0202	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MARIA PRIMINA*VIA PASTEUR*INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE PER CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNALE	100.000,00	100.000,00	B99J20001950001	ATTIVO	COLLAUDO	82.092,49	90.000,00			
COMUNE DI BORDIGHERA - IMPERIA -	M2C4I0202	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ARZIGLIA E VIA PASTEUR*VIA ARZIGLIA E VIA PASTEUR*LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	80.000,00	80.000,00	B99J21017160005	ATTIVO	COLLAUDO	59.496,98	66.424,49			
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - SAVONA -	M1C1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 14 SERVIZI DA MIGRARE	83.044,00	83.044,00	F91C22000090001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - SAVONA -	M1C1I0104	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	3.430,00	3.430,00	F91F22000210006	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	3.430,00	0,00	PAGAMENTI ANTICIPATI CON FONDI DEL COMUNE	OCCORRE PROCEDERE ALLA RICHIESTA DI PAGAMENTO FONDI PNRR	
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - SAVONA -	M1C1I0104	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI SPID E CIE	14.000,00	14.000,00	F91F22000220006	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	14.000,00	0,00	PAGAMENTI ANTICIPATI CON FONDI DEL COMUNE	OCCORRE PROCEDERE ALLA RICHIESTA DI PAGAMENTO FONDI PNRR	
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - SAVONA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	7.713,00	7.713,00	F91F22000230006	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	7.413,00	0,00	PAGAMENTI ANTICIPATI CON FONDI DEL COMUNE	OCCORRE PROCEDERE ALLA RICHIESTA DI PAGAMENTO FONDI PNRR	
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - SAVONA -	M2C2I0401	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI PER COLLEGAMENTO CAPOLUOGO CON FRAZIONI (ROCCHETTA, SAM GIUSEPPE, BRAGNO, FERRANIA E LOC. VILLE)*VIA VARIE*CONCORSO DI IDEE IN DUE FASI - (FINO AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA)	58.043,00	58.043,00	F94E22000600006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	0,00	NESSUNA	NESSUNA	

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - SAVONA -	M2C4I0202	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEI MARCIAPIEDI LOCALIZZATI IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ', CORSO DANTE ED ALCUNE TRAVERSE DI COLLEGAMENTO, IN PROSSIMITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO G. MAZZINI*VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ' + ALTRI*SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEI MARCIAPIEDI	90.000,00	90.000,00	F93D20000160001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	67.524,44	45.000,00	NESSUNA	NESSUNA	
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - SAVONA -	M2C4I0202	EDIFICIO SCOLASTICO FRAZ. ROCCHETTA E FRAZ. BRAGNO*VIA COLLETO FRAZ. ROCCHETTA E CORSO STALINGRADO FRAZ. BRAGNO*INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA DI ROCCHETTA E LA SCUOLA DI BRAGNO	20.000,00	20.000,00	F94D22000020006	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	13.189,34	0,00	NESSUNA	NESSUNA	
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - SAVONA -	M2C4I0202	INTERVENTI MANUTENTIVI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITÀ ED AREE COMUNALI:- ANNO 2021*VIA VARIE STRADA CARNOVALE/BELLINI, VIA A. SANGUINETTI ECC.*SOSTITUZIONE E POSA DI BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA, REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI, SISTEMAZIONE AREA BORDO STRADA	122.000,00	110.000,00	F95F21000470001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	95.707,51	55.000,00		necessità di cofinanziamento comunale	
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - SAVONA -	M2C4I0202	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLE CENTRALI TERMICHE DEL BOCCIODROMO, DEL COMANDO DI P.M. E DELLA SCUOLA MATERNA DEL BUGLIO*VIA TECCHIO*LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLE CENTRALI TERMICHE	70.000,00	70.000,00	F97H21004940001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	57.847,53	35.000,00	0	NESSUNA	
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - SAVONA -	M2C4I0202	EDIFICIO DI PALAZZO DI CITTA*PIAZZA DELLA VITTORIA*LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL' EDIFICIO DI PALAZZO DI CITTA' AI FINI DEL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	70.000,00	70.000,00	F98C22000060006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	13.650,84	0,00	costo totale del progetto 81.500,00 (Euro 70.000,00 PNRR + 11.500,00 di fondi comunali).	necessità integrazione fondi comunali	
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - SAVONA -	M4C1I0101	EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO VIA MEDAGLIE D'ORO*VIA MEDAGLIE D'ORO*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, VULNERABILITÀ SISMICA ED ALTRE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA	1.200.000,00	1.112.093,17	F93D21005060001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - SAVONA -	M5C2I0101	DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 6 BORMIDE*VIA DISTRETTO SOCIO SANITARIO 6 BORMIDE*SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	211.500,00	211.500,00	F94H22000240005	ATTIVO	EMESSI BANDI DI COPROGETTAZIONE, IN CORSO D'OPERA. SI PREVEDE COMPLETARE AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO 2023.	IN RELAZIONE A QUANTO IN CASSELLA PRECEDENTA NON E' STATO EMESSO ALCUN PAGAMENTO				
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - SAVONA -	M5C2I0102	DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 6 BORMIDE*VIA DISTRETTO SOCIO SANITARIO 6 BORMIDE*PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	420.000,00	420.000,00	F94H22000250005	ATTIVO	EMESSI BANDI DI COPROGETTAZIONE, IN CORSO D'OPERA. SI PREVEDE COMPLETARE AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO 2023.	EFFETTUATA RICHIESTA DI ANTICIPO, IN ATTESA DI EROGAZIONE				
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - SAVONA -		ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	51.654,00	51.654,00	F91F22003790006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00	NESSUNA	NESSUNA	
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE - SAVONA -		DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	32.589,00	32.589,00	F91C22000090001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00	NESSUNA	NESSUNA	
COMUNE DI CHIAVARI - GENOVA -	M1C1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 11 SERVIZI DA MIGRARE CON AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONI IN CLOUD	208.807,00	208.807,00	J21C22000360006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE					
COMUNE DI CHIAVARI - GENOVA -	M1C1I0104	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*PIAZZA N. S. DELL'ORTO 1*ENTRAMBI	203.632,00	203.632,00	J21F22000520006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE					
COMUNE DI CHIAVARI - GENOVA -	M1C3I0203	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO BOTANICO DI VILLA ROCCA A CHIAVARI" *PIAZZA MATTEOTTI 10*RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO BOTANICO DI VILLA ROCCA A CHIAVARI"	2.000.000,00	2.000.000,00	J27B22000010006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	0,00	NESSUNA	NESSUNA	
COMUNE DI CHIAVARI - GENOVA -	M2C4I0202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PALAZZO DI CORSO DE MICHEL N. 79 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO*CORSO DE MICHEL 79*SOSTITUZIONE DI N.3 MACCHINE ESTERNE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	128.100,00	128.100,00	J22E22000210006	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	97.000,00	0,00		NESSUNA	

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI CHIAVARI - GENOVA -	M2C4I0202	PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DELLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO RSU, PRESSO LA EX CAVA DI BAZEZZA IN VIA CASE SPARSE DI SAMPIERDICANNE*CASE SPARSE DI SAMPIERDICANNE*PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA	36.000,00	36.000,00	J24D22000060006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	36.000,00	IN RIFERIMENTO ALLA VOCE COSTO PROGETTO SI PRECISA CHE IL COSTO TOTALE DEL PROGETTO DA QUADRO ECONOMICO AMMONTA AD EURO 29.182,40		
COMUNE DI CHIAVARI - GENOVA -	M2C4I0202	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON TRASFORMAZIONE A LED, DI PARTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINI -*VIA AURELIA*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON TRASFORMAZIONE A LED, DI PARTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINI -	96.000,00	96.000,00	J28I20000040001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	93.449,47	65.000,00	NESSUNA	NESSUNA	
COMUNE DI CHIAVARI - GENOVA -	M4C1I0101	NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA MAZZINI EST*MALPERTUSO*NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA MAZZINI EST	2.350.000,00	2.350.000,00	J21B21005240006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00	NESSUNA	NESSUNA	
COMUNE DI CHIAVARI - GENOVA -	M4C1I0303	SCUOLA PRIMARIA UMBERTO I DI SANPIERDICANNE. CHIAVARI*VIA SANPIERDICANNE 74*MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEI RISCHI, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	1.700.000,00	1.085.000,00	J29F18000220006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	326.322,40	0,00	SI PRECISA CHE RELATIVAMENTE ALLA VOCE "COSTO PROGETTO" L'IMPORTO DA QUADRO ECONOMICO AMMONTA AD EURO 1.700.000,00; L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE E "FINANZIATO" DA FONDI PNRR AMMONTA AD EURO 1.085.000,00	NESSUNA	
COMUNE DI CHIAVARI - GENOVA -	M5C2I0101	CONFERENZA DEI SINDACI A.S.L. N.4 "SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA"*PIAZZA N.S. DELL'ORTO N. 1 - 16043 CHIAVARI (GE)*1.1.1- SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	211.500,00	211.500,00	J64H22000430006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE			- il presente template non è adattabile alla procedura scelta dal Settore 6 del Comune di Chiavari - Servizi alla persona - che, nell'ambito di questa linea di investimento, ha avviato un procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art.55 del d.lgs. n.117/2017. Per "aggiudicazione" (cfr. colonna K), si intende la stipula della Convenzione con l'Ente del Terzo Settore coinvolto.	Nonostante i reiterati solleciti all'Amministrazione e titolare dell'intervento, il progetto non risulta abbinato, sulla piattaforma REGIS, al CUP e pertanto non è visualizzabile; uno degli operatori di cui è stato richiesto l'accertamento, non risulta ancora abilitato.	

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI CHIAVARI - GENOVA -	M5C2I0101	CONFERENZA DEI SINDACI ASL N.4 "SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA"*PIAZZA N.S. DELL'ORTO N. 1 - 16043 CHIAVARI (GE)*1.1.3 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L' OSPEDALIZZAZIONE	329.892,00	329.892,00	J64H22000440006	ATTIVO	PROGETTAZIONE			- il presente template non è adattabile alla procedura scelta dal Settore 6 del Comune di Chiavari - Servizi alla persona - che, nell'ambito di questa linea di investimento, ha avviato un procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art.55 del d.lgs. n.117/2017. La "progettazione" di cui alla colonna K, è attualmente al vaglio ministeriale.	- Nonostante i reiterati solleciti all'Amministrazione e titolare dell'intervento, il progetto non risulta abbinato, sulla piattaforma REGIS, al CUP e pertanto non è visualizzabile; uno degli operatori di cui è stato richiesto l'accertamento, non risulta ancora abilitato.	
COMUNE DI CHIAVARI - GENOVA -	M5C2I0102	DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.15 "CHIAVARESE"*PIAZZA N.S. DELL'ORTO N. 1 - 16043 CHIAVARI (GE)*1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - AZIONI: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO.	466.312,50	466.312,50	J84H22000980006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE			- il presente template non è adattabile alla procedura scelta dal Settore 6 del Comune di Chiavari - Servizi alla persona - che, nell'ambito di questa linea di investimento, ha avviato anche un procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art.55 del d.lgs. n.117/2017. Per la parte relativa alla co-progettazione, con "aggiudicazione" (cfr. colonna K), si intende la stipula della Convenzione con l'Ente del Terzo Settore coinvolto. Per quanto riguarda la quota destinata alla realizzazione del target, in particolare la ristrutturazione di spazi domestici, si è attualmente in fase di <u>progettazione</u> (approvato lo studio di fattibilità).	- Nonostante i reiterati solleciti all'Amministrazione e titolare dell'intervento, il progetto non risulta abbinato, sulla piattaforma REGIS, al CUP e pertanto non è visualizzabile; uno degli operatori di cui è stato richiesto l'accertamento, non risulta ancora abilitato. - Nella colonna "I" è stato indicato "attivo", anche se si vorrebbe procedere alla rimodulazione, in quanto, a seguito delle disposizioni emanate di recente dall'Amm. titolare dell'intervento, è necessario riallocare le risorse (sia sotto l'aspetto finanziario che temporale); ciò risulta attualmente impraticabile per le ragioni suesposte.	
COMUNE DI CHIAVARI - GENOVA -	M5C2I0201	PISCINA DEL LIDO*VIA TITO GROPPA*RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELL'ANTICA PISCINA OLIMPIONICA DEL "LIDO" E DEGLI SPAZI ADIACENTI	5.670.000,00	5.000.000,00	J23D21000600004	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	500.000,00		NESSUNA	

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI CHIAVARI - GENOVA -	M2C4I0202	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON TRASFORMAZIONE A LED, DI PARTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINI -*VIA AURELIA*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON TRASFORMAZIONE A LED, DI PARTE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTADINI -	191.100,00	191.100,00	J29J21000110001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	58.917,48	0,00	CUP NON PRESENTE NEL FILE TRASMESSO SI PRECISA CHE RELATIVAMENTE ALLA VOCE "COSTO PROGETTO" L'IMPORTO DA QUADRO ECONOMICO AMMONTA AD EURO 260.000,00	NESSUNA	
COMUNE DI CHIAVARI - GENOVA -	M2C2I0401	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE DA PIAZZA LEONARDI A LARGO C.SO VALPARAISO C/O CIV. 66 (ROTATORIA ANTISTANTE LORD NELSON PUB)	625.000,00	625.000,00	J21B21000490003	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	136.164,36	127.670,55	CUP NON PRESENTE NEL FILE TRASMESSO, SOMME RICEVUTE IN ANTICIPAZIONE PRIMA CHE I FINANZIAMENTI ENTRASSERO ALL'INTERNO DEL PNRR	NESSUNA	
COMUNE DI CHIAVARI - GENOVA -	M2C2I0401	DECRETO MIT 12 AGOSTO 2020 'RISORSE DESTINATE ALLE CICLOVIE URBANE'. INTERVENTI A FAVORE DELLA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CICLOVIE E CICLOSTAZIONI E DI INTERVENTI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLA CICLABILITÀ CITTADINA - TRATTO DI PISTA CICLABILE C.SO ASSAROTTI - C.SO GIANELLI FINO ALL'INCROCIO CON C.SO MILLO	69.792,00	69.792,00	J21B21003810003	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	46.780,63	31.508,17	CUP NON PRESENTE NEL FILE TRASMESSO, SOMME RICEVUTE IN ANTICIPAZIONE PRIMA CHE I FINANZIAMENTI ENTRASSERO ALL'INTERNO DEL PNRR. L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE E FINANZIATO E IL COSTO DEL PROGETTO RISULTA PARI AD EURO 116.624,25	NESSUNA	
COMUNE DI CHIAVARI - GENOVA -	M2C2I0401	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE VIALE MARCONI - CORSO DE MICHEL DI COLLEGAMENTO TRA CHIAVARI E LAVAGNA	38.417,00	38.417,00	J21B22000830003	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00	CUP NON PRESENTE NEL FILE TRASMESSO L'EFFETTIVO COSTO DEL PROGETTO RISULTA ESSERE PARI AD EURO 53.817,06, MENTRE L'IMPORTO FINANZIATO DA FONDI PNRR RISULTA PARI AD EURO 37.521,26	NESSUNA	
COMUNE DI CHIAVARI - GENOVA -	M1C1I0104	MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI	59.966,00	59.966,00	J21F22004380006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI FINALE LIGURE - SAVONA -	M1C1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 14 SERVIZI DA MIGRARE	121.992,00	121.992,00	C51C22000850006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE- ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI FINALE LIGURE - SAVONA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	39.422,00	39.422,00	C51F22002010006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	0,00			
COMUNE DI FINALE LIGURE - SAVONA -	M1C1I0104	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*TERRITORIO COMUNALE*IL SERVIZIO RIGUARDA SIA IL SITO COMUNALE CHE N. 4 SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	155.234,00	155.234,00	C51F22002990006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI FINALE LIGURE - SAVONA -	M2C4I0202	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.*VIA VIE CITTADINE A PONENTE DEL CENTRO STORICO*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTESTUALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITI A PONENTE DEL CS DI MARINA	90.000,00	90.000,00	C52E22000180001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	4.356,29	0,00	Progetto non ancora inserito in Regis dal Ministero		
COMUNE DI FINALE LIGURE - SAVONA -	M2C4I0202	ARCHIVI PLESSI SCOLASTICI*VIA BRUNENGHI*INTEREVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LOCALI ED ARCHIVI DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI	49.712,00	29.389,12	C54E21002050005	ATTIVO	COLLAUDO	0,00	0,00			
COMUNE DI FINALE LIGURE - SAVONA -	M2C4I0202	ARENILE FINALMARINA*ARENILE FINALMARINA*INTERVENTO INFRASTRUTTURALE URGENTE FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO/MARITTIMO ED ALL'AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DELL'ARENILE DI FINALMARINA. 1° LOTTO	2.375.000,00	2.375.000,00	C54H20000980001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	65.265,04	500.000,00			
COMUNE DI FINALE LIGURE - SAVONA -	M2C4I0202	PORTO CAPO SAN DONATO*VIA AURELIA*COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PORTO CAPO SAN DONATO	160.000,00	150.610,88	C54I21000000004	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	48.375,95	90.000,00			
COMUNE DI FINALE LIGURE - SAVONA -	M2C4I0202	PORTO CAPO SAN DONATO*VIA AURELIA*NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA	90.000,00	90.000,00	C57H20000980005	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	81.164,64	90.000,00			
COMUNE DI FINALE LIGURE - SAVONA -	M4C1I0101	SCUOLA DELL'INFANZIA FINALE LIGURE MARINA - SVIC 81800X - SVAA 81801R*VIA BRUNENGHI 64*REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO PER L'INFANZIA IN FINALMARINA A COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA ESISTENTE	2.866.710,00	2.866.710,00	C51B22001460006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00	Progetto non ancora inserito in Regis dal Ministero		
COMUNE DI FINALE LIGURE - SAVONA -	M4C1I0103	SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI FINALPIA - SVIC 81800X - SVEE 818012*PIAZZA ABBAZIA 5*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE			C55F22000540006	ALTRO - INTERVENTO NON FINANZIATO		0,00	0,00			costo progetto 98,287

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI FINALE LIGURE - SAVONA -	M4C1I0103	PALESTRA SCOLASTICA VIA XXV APRILE - COD ED. 0090290564*VIA XXV APRILE*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE			C55F22000550006	ALTRO - INTERVENTO NON FINANZIATO		0,00	0,00			Costo progetto 322.486
COMUNE DI FINALE LIGURE - SAVONA -	M4C1I0303	ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO AYCARDI-GHIGLIERI .*PIAZZA DELEDDA 2*INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE AYCARDI-GHIGLIERI	1.405.266,00	477.893,96	C51B20000920005	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	75.186,76	286.671,00			
COMUNE DI FINALE LIGURE - SAVONA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	32.589,00	32.589,00	C51F22003400006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00	Progetto inserito in aggiunta da ufficio CED		
COMUNE DI FINALE LIGURE - SAVONA -	M5C2I0102	DISTRETTO SOCIALE N.5 FINALESE*VIA PERTICA N.29*PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)	595.831,00	595.831,00	C54H22000260006	AMMESSO/ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00	Progetto non ancora inserito in Regis dal Ministero		
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M1C1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 21 SERVIZI DA MIGRARE	4.566.860,00	4.566.860,00	B31C22000060007	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	215.109,00	215.109,00	B31F22000210007	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M1C1I0104	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	92.423,00	92.423,00	B31F22000220007	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M1C1I0104	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA COMUNE DI GENOVA*ENTRAMBI	1.277.000,00	1.277.000,00	B31F22000540007	ATTIVO	FASE DI ATTUAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M1C3I0103	AUDITORIUM E. MONTALE*PASSO E. MONTALE 4*AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	250.000,00	250.000,00	B34J22000050006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M1C3I0103	TEATRO COMUNALE DELL'OPERA "CARLO FELICE"*PASSO E. MONTALE 4*AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	650.000,00	650.000,00	B34J22000070006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M1C3I0103	TEATRO DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA RENATO NEGRI 6*AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	1.835.978,00	1.835.978,00	B34J22000090006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	0,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C4I0202	STRADA TRA S. EUSEBIO E BAVARI, VIA MONTELONGO-VIA SERINO, NEL BACINO DEL TORRENTE BISAGNO - 2° LOTTO*VIA VARIE VIE*RIASSETTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO STRADE	800.000,00	800.000,00	B32H18001070004	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	170.694,01	240.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C4I0202	RIO GAXI*RIO GAXI*SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA - 2° LOTTO	500.000,00	500.000,00	B32H18001080004	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	234.914,27	150.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C4I0202	RIO DI PO A MOREGO*RIO DI PO*ADEGUAMENTO IDRAULICO	800.000,00	800.000,00	B32H18001100004	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	240.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C4I0202	VIA DEL BRASILE*VIA DEL BRASILE*STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI CIVICA PROPRIETÀ	450.000,00	450.000,00	B32H18001110004	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	262.941,08	135.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C4I0202	PIAZZALE ADRIATICO*PIAZZA ADRIATICO*SISTEMAZIONE	800.000,00	520.000,00	B37H15000690004	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	260.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C4I0202	VIA BUOZZI-VIA ADUA*VIA VARIE VIE*IMPERMEABILIZZAZIONE E GIUNTI - 2° LOTTO	500.000,00	500.000,00	B37H18008690004	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	250.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C4I0202	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE DI VIA SUPERIORE RAZZARA E RICOSTRUZIONE DEL PONTE CARRABILE SUL VARENNA*VIA SUPERIORE RAZZARA*MESSA IN SICUREZZA STRADA E RICOSTRUZIONE PONTE	424.000,00	424.000,00	B37H18008780004	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	200.604,18	127.200,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C4I0202	VIA LODI: LAVORI DI MESA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO - 2° LOTTO*VIA LODI*MESSA IN SICUREZZA	500.000,00	500.000,00	B37H20000200004	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	240.885,27	150.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C4I0202	STRADA ALDO MORO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTALINI IN C.A. E INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE STRUTTURE METALLICHE DELLA STRADA SOPRAELEVATA - 4° LOTTO*GENOVA*MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE	500.000,00	500.000,00	B37H20000240004	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	250.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C4I0202	SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO E MATERNA COMUNALE CORONATA*VIA CORONATA 48*INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	250.000,00	250.000,00	B37H21001600001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	135.668,36	125.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C4I0202	SCUOLA INFANZIA GARBARINO*VIA ALL'ASILO GARBARINO 17*RIFACIMENTO LINEE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	70.000,00	70.000,00	B37H21004740001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	42.391,83	35.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C4I0202	CORSO ITALIA - CARREGGIATA LATO MARE*CORSO ITALIA*INTERVENTI DI MOBILITÀ COMPLEMENTARI ALLA PISTA CICLABILE	250.000,00	250.000,00	B37H22003750006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	196.304,41	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C4I0202	EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE H.C. ANDERSEN, PRIMARIA MIMOSA, MEDIA LUCARNO, VIA MOGADISCIO 67: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO*VIA MOGADISCIO 67*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	250.000,00	250.000,00	B39E20000040001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	114.754,71	125.000,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C4I0202	POLO TURSINO*VIA GARIBALDI*INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	180.000,00	180.000,00	B39J21023060001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	30,00	90.000,00		Il progetto è diventato PNRR quando ormai era già avviato e quindi non rispetta completamente gli standard PNRR	
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M4C1I0101	VILLA GRUBER, PALAZZINA LIBERTY*CORSO SOLFERINO 29*REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO	1.799.200,00	1.799.200,00	B31B22000410006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M4C1I0101	ASILO NIDO LA RONDINE*PIAZZA SOLARI 103*RIQUALIFICAZIONE	2.532.400,00	2.532.400,00	B33D22000370006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M4C1I0101	ASILO NIDO FATA MORGANA*VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 1*RIQUALIFICAZIONE	1.136.200,00	1.136.200,00	B33D22000380006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M4C1I0101	ASILO NIDO NELLA EX CASERMA GAVOGLIO*VIA DEL LAGACCIO*REALIZZAZIONE	1.566.000,00	1.566.000,00	B33D22000460006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M4C1I0101	EDIFICIO EX ISTITUTO NAUTICO*PIAZZA PALERMO*REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO AL PIANO TERRA	1.261.000,00	1.261.000,00	B35E22000430006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M4C1I0101	SCUOLA MATERNA COMUNALE ARCOBALENO*VIA FRATELLI DI CORONATA 11*RIQUALIFICAZIONE	2.730.000,00	2.730.000,00	B37G22000000006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M4C1I0101	ASILO NIDO CASTELLO RAGGIO*VIA FEDERICA GATTORNO 6*RIQUALIFICAZIONE	1.137.500,00	1.137.500,00	B37G22000240006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M4C1I0101	ASILO NIDO CENTOFIORI*PIAZZA VITTIME DI BOLOGNA 10*RIQUALIFICAZIONE	1.030.900,00	1.030.900,00	B37G22000250006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M4C1I0101	VILLA STALDER*VIA PRIARUGGIA 50*RIQUALIFICAZIONE LOCALI AL 1° PIANO PER RICOLLOCAZIONE ASILO NIDO	1.319.500,00	1.319.500,00	B37G22000260006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M4C1I0102	SCUOLA D' INFANZIA ALBARO*VIA MONTE ZOVETTO 7*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	332.000,00	332.000,00	B35E22000140006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0101	COMUNE DI GENOVA-DIREZIONE POLITICHE SOCIALI*VIA GARIBALDI, 9 16124 GENOVA*INVESTIMENTO 1.1.1- SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI.	211.000,00	211.000,00	B34FH21000090001	ATTIVO	FASE DI ATTUAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0101	COMUNE DI GENOVA-DIREZIONE POLITICHE SOCIALI*VIA GARIBALDI 9 16124 GENOVA*INVESTIMENTO 1.1.2- AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	2.460.000,00	2.460.000,00	B34FH21000120001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0101	COMUNE DI GENOVA-DIREZIONE POLITICHE SOCIALI*VIA GARIBALDI 9 16124 GENOVA*1.1.3-RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L' OSPEDALIZZAZIONE	330.000,00	330.000,00	B34H21000130001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0102	COMUNE DI GENOVA-DIREZIONE POLITICHE SOCIALI*VIA GARIBALDI, 9 16124 GENOVA*TEMATICA PNRR (514-M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - 1.2: PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ	715.000,00	715.000,00	B34H21000100001	ATTIVO	FASE DI ATTUAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0103	COMUNE DI GENOVA-DIREZIONE POLITICHE SOCIALI*VIA GARIBALDI, 9 16124 GENOVA*INVESTIMENTO 1.3.1-POVERTÀ ESTREMA - HOUSING FIRST	710.000,00	710.000,00	B34H21000110001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0103	COMUNE DI GENOVA-DIREZIONE POLITICHE SOCIALI*VIA GARIBALDI 9 16124 GENOVA*INVESTIMENTO 1.3.2-POVERTÀ ESTREMA - STAZIONI DI POSTA	1.090.000,00	1.090.000,00	B34H21000150001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	21.308,23	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0201	PIAZZA PICCAPIETRA E VIA VII OTTOBRE*PIAZZA PICCAPIETRA E VIA VII OTTOBRE*RIGENERAZIONE	1.500.000,00	1.500.000,00	B33D21002130001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	150.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0201	EDIFICIO SCOLASTICO CÀ DI VENTURA*VIA SAN FELICE 19*MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA	2.940.000,00	2.940.000,00	B35B18010350005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	78.728,71	294.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0201	EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI-COLOMBO*VIA SALITA CARBONARA 51*RIFACIMENTO INFISSI	1.440.000,00	1.440.000,00	B35B18010360004	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	144.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0201	SCUOLA SAN FRANCESCO DA PAOLA*VIA SAN MARINO 219-221*MANUTENZIONE	3.000.000,00	2.770.000,00	B35B18010440005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	35.155,34	277.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0201	PONTE MONUMENTALE*VIA XX SETTEMBRE*RESTAURO	3.000.000,00	3.000.000,00	B35F21000420001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	300.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0201	PALAZZINA EX SATI*VIA DEL LAGACCIO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO COMPRESO NUOVO ASCENSORE DI COLLEGAMENTO TRA IL NUOVO PARCO DI VALLETTA CINQUE SANTI E VIA VENTOTENE	3.100.000,00	3.100.000,00	B37H21001560001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	310.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0201	SCUOLA ELSA MORANTE*VIA LINNEO 232*COMPLETAMENTO RIFACIMENTO SERRAMENTI	500.000,00	500.000,00	B38B21000050004	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	50.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0201	EX MERCATO COMUNALE DI BOLZANETO*BOLZANETO*RIQUALIFICAZIONE	1.000.000,00	1.000.000,00	B38C21000080004	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	100.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0201	EX ISITITO DORIA*VIA STRUPPA*REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA E SERVIZI	3.000.000,00	3.000.000,00	B38E18000310005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	300.000,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0201	CENTRO CIVICO BURANELLO: RIFACIMENTO COPERTURA*VIA BURANELLO*RIFACIMENTO	750.000,00	750.000,00	B39E2000030004	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	75.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0202	VOLTINI FERROVIARI*VIA BURANELLO*RIQUALIFICAZIONE A FINI CULTURALI, SOCIALI, SPORT, SPAZI PER GIOVANI	5.500.000,00	5.500.000,00	B32B22000050006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	550.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0202	PALAZZO GRIMALDI DETTO LA FORTEZZA*VIA PALAZZO DELLA FORTEZZA 14*COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RECUPERO PER REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE PER ASSOCIAZIONI ED ARTE	3.800.000,00	3.800.000,00	B32F22000130006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	380.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0202	IMMOBILE EX MAGAZZINI DEL SALE*VIA SAMPIERDARENA 261R*COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE E SPAZI CIRCOSTANTI	4.200.000,00	4.200.000,00	B32F22000140006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	420.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0202	NUOVO PARCO URBANO*LUNGOMARE CANEPA*REALIZZAZIONE SULLA SOMMITÀ DI UN VIADOTTO A COPERTURA DELLE DUE CARREGGiate	40.000.000,00	40.000.000,00	B32H22002310006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	4.000.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0202	VIA GIOTTO*VIA GIOTTO*REALIZZAZIONE DI SPAZI URBANI E PERCORSI DI CONNESSIONE CON IL POLO SCOLASTICO DI VIA GIOTTO	1.014.274,00	1.014.274,00	B33D22001040006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	101.427,36			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0202	EDIFICIO*VIA FELICITA NOLI CIVV. 24R-26R-28R*ACQUISTO E DEMOLIZIONE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE	3.800.000,00	3.800.000,00	B36J22000010006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	680.000,01	380.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0202	EDIFICIO*VIA GIUSEPPE SPATARO CIVV. 32R-32AR-34*ACQUISTO E DEMOLIZIONE PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VERDE	4.200.000,00	4.200.000,00	B36J22000020006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	272.000,00	420.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0202	PALAZZO CARPANETO*PIAZZA NICOLÒ MONTANO 4*ACQUISTO E RECUPERO IMMOBILE STORICO CON AFFRESCHI DELLO STROZZI	4.000.000,00	4.000.000,00	B37B22000070006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	450.000,00	400.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0202	LOCALE*VIA PRETE NICOLÒ DASTE CIVV. 24R-24AR-24BR-24CR-26R*ACQUISTO E RECUPERO PER SPAZIO GIOVANI E ATTIVITÀ CULTURALI	1.300.000,00	1.300.000,00	B37G22000120006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	470.000,00	130.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0202	EX AREA FERROVIARIA*AREA ADIACENTE A VIA DEL CAMPASSO*RIQUALIFICAZIONE PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	7.000.000,00	7.000.000,00	B37H22001630006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	187.068,65	700.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0202	PERCORSI PEDONALI*ZONA CENTRALE SAMPIERDARENA, DA VIA CANTORE A VIA SAMPIERDARENA*RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE	5.000.000,00	5.000.000,00	B37H22001660006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	500.000,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0202	VIA SAMPIERDARENA*VIA SAMPIERDARENA*RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE	3.500.000,00	3.500.000,00	B37H22001670006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	350.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0202	PERCORSO STORICO*SALITA BELVEDERE E SALITA MILLELIRE*RIQUALIFICAZIONE	2.500.000,00	2.500.000,00	B37H22001680006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	3.200,00	250.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0202	VILLA IMPERIALE SCASSI, DETTO "LA BELLEZZA"*LARGO GOZZANO 3*RESTAURO CONSERVATIVO DEL NINFEO E RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO STORICO	1.600.000,00	1.600.000,00	B38E22000040006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	160.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0202	VILLA PALLAVICINI*VIA GASTONE PISONI 22*ACQUISTO E RESTAURO IMMOBILE STORICO PER FUNZIONI PUBBLICHE	4.800.000,00	4.800.000,00	B38E22000050006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	480.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	PARCO URBANO DI PRÀ PALMARO*VIA PRÀ*REALIZZAZIONE	6.744.396,00	6.744.396,00	B31B21001250005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	674.439,60			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL CENTRO STORICO*VIE VARIE*NUOVA REALIZZAZIONE	3.780.000,00	3.780.000,00	B31B21001740001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	378.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	PORTALI PER CONTROLLO ACCESSI E STAZIONAMENTO VEICOLI NEL CENTRO STORICO*VIE VARIE*NUOVA REALIZZAZIONE	1.128.000,00	1.128.000,00	B31B21001750001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	27.000,22	112.800,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	GALLERIA MAZZINI*GALLERIA MAZZINI*RESTAURO, RECUPERO E RISANAMENTO STRUTTURA DI COPERTURA, MIGLIORAMENTO MICROCLIMA E ARREDO URBANO	7.330.000,00	7.330.000,00	B33D21001070005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	60,00	733.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	SPAZI PUBBLICI AD USO SPORTIVO E AREE BOSCHIVE*QUARTIERE VIA NOVELLA*RIQUALIFICAZIONE E RIFORESTAZIONE	2.116.443,00	2.116.443,00	B33D21001080005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	4.680,00	211.644,30			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	PERCORSI PEBA (PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE)*VIA VARIE DEL CENTRO STORICO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	671.249,00	671.249,00	B33D21001810001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	67.124,90			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	TRATTO DI STRADA*VIA N.S. ASSUNTA DI PALMARO*PEDONALIZZAZIONE	336.802,00	336.802,00	B37H21000440005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	33.680,20			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	SPAZI PUBBLICI*CENTRO STORICO DI PRÀ' PALMARO*COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE	705.481,00	705.481,00	B37H21000450005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	70.548,10			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	VILLA DE MARI*VIA PRÀ 61*RECUPERO CON REALIZZAZIONE ALLOGGI DI CO-HOUSING, SPAZI PER EVENTI E RIQUALIFICAZIONE PARCO PUBBLICO	3.773.592,00	3.773.592,00	B37H21000460005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	44.772,95	377.359,20			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	ALLOGGI E.R.P.*VIA NOVELLA*RECUPERO	1.500.000,00	1.500.000,00	B37H21000470005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	600,00	150.000,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	CREUZE E PARCO PUBBLICO DELLE SORGENTI SULFUREE*QUARTIERE DI PRÀ*VALORIZZAZIONE CREUZE E RIQUALIFICAZIONE PARCO	423.289,00	423.289,00	B37H21000480005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	42.328,90			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	ALLOGGI DI E.R.P. DA DESTINARSI ALL'ABITARE GIOVANILE*VIA PRÈ*RECUPERO E ADEGUAMENTO	876.978,00	876.978,00	B37H21000490005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	87.697,80			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	ALLOGGI DA DESTINARSI A SOCIAL HOUSING, SERVIZI ALL'ABITARE E DI QUARTIERE*VIA BALBI 9*ACQUISIZIONE EDIFICIO E RECUPERO	9.028.272,00	9.028.272,00	B37H21000500005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	2.010.306,45	902.827,20			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	EX CINEMA TEATRO FOSSATELLO*PIAZZA FOSSATELLO 1*RECUPERO E ADEGUAMENTO PER CENTRO DI PRODUZIONE CULTURALE	705.787,00	705.787,00	B37H21000510005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	15.728,43	70.578,70			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	SISTEMA PIAZZE E SPAZI APERTI DELL'AMBITO*PIAZZE VARIE DEL CENTRO STORICO*RECUPERO E ADEGUAMENTO	3.563.540,00	3.563.540,00	B37H21000520005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	98.270,00	356.354,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	PIAZZA DI SARZANO ED AREE LIMITROFE*VIE VARIE DEL CENTRO STORICO*RIQUALIFICAZIONE	3.600.000,00	3.600.000,00	B37H21000860001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	360.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	MURA DELLA MARINA*MURA DELLA MARINA*RESTAURO DELLE MURA E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO	2.365.000,00	2.365.000,00	B37H21000870001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	236.500,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	MURA DELLE GRAZIE*MURA DELLE GRAZIE*RESTAURO DELLE MURA E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO	5.085.000,00	5.085.000,00	B37H21000890001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	30,00	508.500,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	MURA DELLA MALAPAGA*MURA DELLA MALAPAGA*RESTAURO DELLE MURA E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO	2.455.000,00	2.455.000,00	B37H21000900001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	26.189,93	245.500,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	CASA DELLA SOLIDARIETÀ (MASSOERO)*VIA DEL MOLO 13*OPERE DI COMPLETAMENTO ASILO NOTTURNO, SPAZI CO-WORKING, RESIDENZE SOCIALI, SPAZI COMUNI, LOCALI DEPOSITO; RIFACIMENTO COPERTURA E RESTAURO FACCIAE CORPO B	5.385.000,00	5.385.000,00	B37H21000910001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	31.857,14	538.500,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	VILLETTA DI NEGRO*PIAZZALE G. MAZZINI*RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO E DELLA CASA DEL GIARDINIERE	2.470.000,00	2.470.000,00	B37H21000920001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	13.739,77	247.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	CASTELLO D'ALBERTIS*CORSO DOGALI 18*MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE COPERTURE E RESTAURO ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E INTERNI, DEGLI INFISSI IN LEGNO E DELLE PAVIMENTAZIONI IN PARQUET	910.217,00	910.217,00	B37H21000930001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	375,00	91.021,70			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	EDIFICI VIA DI PRÈ, CIVICI 12 E 14*VIA DI PRÈ 12-14*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.532.678,00	1.532.678,00	B37H21000940001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	153.267,80			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	VICO VEGETTI 8/1A, VIA DI SAN BERNARDO 22R, VIA CHIABRERA 9R*VIE VARIE NEL CENTRO STORICO*ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI AI PIANI TERRA PER RIATTIVAZIONE A SCOPI SOCIO-CULTURALI	2.740.000,00	2.740.000,00	B37H21000950001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	539.063,25	274.000,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	VIA ALLA POSTA VECCHIA, CIVV. 1 E 10*VIA ALLA POSTA VECCHIA 1 E 10*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE DI UN CONDOMINIO ETICO	3.810.976,00	3.410.976,00	B37H21000960001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	341.097,60			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	EDIFICI TABARCA E METELINO*VIA MARINO BOCCANEGRA E VIA MEGOLLO LERCARI*RIQUALIFICAZIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE	18.561.170,00	18.561.170,00	B37H21001050001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	715,62	1.856.117,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0203	PARCO DELL'ACQUASOLA*VIALE IV NOVEMBRE*RIQUALIFICAZIONE	1.981.785,00	1.981.785,00	B37H21001060001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	198.178,50			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0301	IMPIANTO POLISPORTIVO SCIORBA*VIA GELASIO ADAMOLIL 57*REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT MEDIANTE COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI A COMPLETAMENTO IMPIANTO ESISTENTE	7.645.272,64	6.900.000,00	B35B22000150003	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	690.000,00	Il Costo definitivo dle progetto è pari ad Euro 7.645.272,64 (pari all'importo del finanziamento oltre IVA su lavori) e non corrisponde a quanto riportato. Abbiamo richiesto modifica del CUP relativo, ma non è stata accoradata, di questo è stata relazionata l'Amministrazione Responsabile - Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri		
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0301	CENTRO FEDERALE FIV NEL COMPLESSO " CASA DELLA VELA" *AREA FIERA DI GENOVA - WATERFRONT DI LEVANTE*REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO			B35B22000160006	ATTIVO		0,00	0,00	IN ATTESA DI FINANZIAMENT O		Costo progetto 4.000.000

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M5C2I0301	IMPIANTO SPORTIVO VIALE ASPROMONTE*VIALE ASPROMONTE 2*RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO	5.129.111,76	4.600.000,00	B38E22000150006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	460.000,00	Il Costo definitivo dle progetto è pari ad Euro 5.129.111,76 (pari all'importo del finanziamento oltre IVA su lavori) e non corrisponde a quanto riportato. Abbiamo richiesto modifica del CUP relativo, ma non è stata accoradata, di questo è stata relazionata l'Amministrazione Responsabile - Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri		
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C2I4.1.2	ITINERARIO CICLOPEDONALE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE BISAGNO	3.426.814,00	3.426.814,00	B34E22000700001	ATTIVO	FASE DI ATTUAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C2I4.4.1	ACQUISTO ECO-BUS	51.453.275,00	51.453.275,00	H49J22000770004	ATTIVO	FASE DI ATTUAZIONE	0,00	5.145.327,50			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C2I0402	METROPOLITANA DI GENOVA: OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI CORVETTO	56.313.734,45	43.899.106,52	B31B21011680001	IN RIMODULAZIONE	AGGIUDICAZIONE	886.965,70	4.389.910,65		A titolo informativo, premesso che gli oneri IVA relativi alla metropolitana di Genova non costituiscono un costo per l'Ente e non sono quindi rendicontabili, il MIT con nota prot. U.0008791,30-11-2022 ha confermato che l'importo riconosciuto con il finanziamento di cui al DM n.488/2021 potrà essere interamente destinato alla copertura di qualunque costo effettivamente sostenuto per l'esecuzione dell'intervento previsto nel Quadro Economico.	
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M2C2I42	SISTEMA DELI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL COMUNE DI GENOVA	471.645.087,12	173.728.287,00	B31E20000230001	IN RIMODULAZIONE	AGGIUDICAZIONE	5.658.951,56	24.700.305,10			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M1C1I0104	DIGITALIZZAZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI - ACQUISTO DI 3 SERVIZI	97.247,00	97.247,00	B31F22003590006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI BANDO SETTEMBRE 22	103.571,00	103.571,00	B31F22004880006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -	M1C1I105	INVESTIMENTO 1.5 CYBERSECURITY	648.649,60	648.649,60	B37H22005440006	ATTIVO	FASE DI ATTUAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -		Creazione nuova accessibilità al Sistema dei Forti Genovesi mediante la realizzazione di una nuova cabinovia - PNC(PNRR)	40.500.000,00	40.500.000,00	B31B21006780001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	4.050.000,00	FINANZIAMENTO PNC		
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -		Restauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta Muraria: Percorrenze storiche pedonali associate al Sistema dei Forti	8.600.000,00	8.600.000,00	B35F21001070001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	77.941,20	860.000,00	FINANZIAMENTO PNC		
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -		Restauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta Muraria: Acquedotto Storico	2.000.000,00	2.000.000,00	B39D22000280001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	41.601,51	200.000,00	FINANZIAMENTO PNC		
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -		Restauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta Muraria: Forte Belvedere	5.500.000,00	5.500.000,00	B39D22000290001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	550.000,00	FINANZIAMENTO PNC		
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -		Restauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta Muraria: Forte Tenaglia	3.400.000,00	3.400.000,00	B39D22000300001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	340.000,00	FINANZIAMENTO PNC		
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -		Restauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta Muraria: Forte Puin	720.000,00	720.000,00	B39D22000310001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	72.000,00	FINANZIAMENTO PNC		
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -		Restauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta Muraria: Forte Begato	7.500.000,00	7.500.000,00	B39D22000320001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	750.000,00	FINANZIAMENTO PNC		
COMUNE DI GENOVA - GENOVA -		Restauro e valorizzazione del Sistema dei Forti e della Cinta Muraria: Forte Santa Tecla	1.750.000,00	1.750.000,00	B39D22000330001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	175.000,00	FINANZIAMENTO PNC		
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M1C1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 14 SERVIZI DA MIGRARE	252.118,00	252.118,00	D51C22001510006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	74.661,00	74.661,00	D51F22002740006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M1C1I0104	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	36.400,00	36.400,00	D51F22003140006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M1C3I0201	LOGGE DI SANTA CHIARA*BORGOPARASIO*RESTAURO DELLE LOGGE			D55F21003630004	ALTRO				PER IL MOMENTO NON PRESENTE A BILANCIO		Costo progetto 210.000
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M2C4I0202	EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA CALVI*PIAZZA ULISSE CALVI*INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	5.000.000,00	5.000.000,00	D58C20000070001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	849.028,49	990.000,00			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M4C1I0101	NUOVO FABBRICATO DA ADIBIRE A POLO DELL'INFANZIA*CORSO S. ALLENDE - FRAZIONE PIANI*REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO DA ADIBIRE A POLO DELL'INFANZIA			D51B22001560006	REVOCATO						Costo progetto: 4.032.848

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE- ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M4C1I0101	NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA VIA VECCHIA PIEMONTE*VIA VECCHIA PIEMONTE*NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA VIA VECCHIA PIEMONTE	2.169.576,00	2.169.576,00	D51B22001570006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M4C1I0101	ASILO NIDO E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - FRAZIONE PIANI - IMPERIA*CORSO S. ALLENDE*NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - FRAZIONE PIANI - IMPERIA	3.800.000,00	3.800.000,00	D55E22000400006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0101	INCONTRI DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE ORGANIZZATIVA DI GRUPPO E INDIVIDUALE PER OPERATORI SOCIALI DEI DSS1 VENTIMIGLIESE, DSS 2 SANREMESE E DSS 3 IMPERIESE*VIA MATTEOTTI 157 IMPERIA*INCONTRI DI SUPERVISIONE DI GRUPPO SUI CASI E SULLA DIMESIONE ORGANIZZATIVA, INCONTRI DI SUPERVISIONE INDIVIDUALE E INCONTRI DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE	210.000,00	210.000,00	D24H22000430006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0101	SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA DOMICILIARE, DOTAZIONI DOMOTICA E TELEASSISTENZA, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DI DUE ALLOGGI PRESSO ALBERGO ITALIA COMUNE DI IMPERIA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI*VIALE MATTEOTTI 29*SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA DOMICILIARE, DOTAZIONI DOMOTICA E TELEASSISTENZA	2.460.000,00	2.460.000,00	D94H22000240006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0101	SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI ATTRAVERSO IL MODELLO P.I.P.P.I.*VIA MATTEOTTI 157*DISPOSITIVI DI SERVIZI DI EDUCATIVA DOMICILIARE , FAMILIARE E DI GRUPPO	211.500,00	211.500,00	D94H22000260006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE- ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0102	SERVIZI DI ASSISTENZA, DOMOTICA, RIQUALIFICAZIONE E ALLESTIMENTO DI UN ALLOGGIO PER L' AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E SERVIZI CONNESSI PRESSO ALBERGO ITALIA COMUNE DI IMPERIA*VIA MATTEOTTI 29*PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ASSISTENZIALE, SERVIZI ASSISTENZIALI PER L'AUTONOMIA ABITATIVA E PER IL LAVORO IN AUTONOMIA	715.000,00	715.000,00	D44H22000200006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0103	REALIZZAZIONE DI ALLOGGI HOUSING FIRST PRESSO ALBERGO ITALIA COMUNE DI IMPERIA E PRESSO ALLOGGI DEL COMUNE DI PIEVE DI TECO*VIALE MATTEOTTI 29 IMPERIA*SERVIZI DI ORIENTAMENTO, RISPOSTA AI BISOGNI PRIMARI PER NUCLEI IN ESTREMA POVERTA' E PERSONE SENZA DIMORA	710.000,00	710.000,00	D34H22000260006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0103	REALIZZAZIONE DI CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA (STAZIONI DI POSTA) PRESSO LA FRAZIONE CARAMAGNA SOPRANA DEL COMUNE DI IMPERIA*VIA MATTEOTTI 157 IMPERIA*SERVIZIO DI ORIENTAMENTO DI ASSISTENZA AI BISOGNI PRIMARI DI GESTIONE DI CASELLA POSTALE PER NUCLEI IN ESTREMA POVERTA' E PERSONE SENZA DIMORA	1.090.000,00	1.090.000,00	D94H22000250006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0201	AREA COSTIERA DA LEVANTE A PONENTE DEL COMUNE DI IMPERIA*AREA COSTIERA DA LEVANTE A PONENTE DEL COMUNE DI IMPERIA*REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COSTIERO, COMPLETAMENTE ECOSOSTENIBILE E A GUIDA AUTONOMA, CON TRACCIATO CITTADINO TRASVERSALE DA LEVANTE A PONENTE, COMPLETA DI FERMATE ED UNITA' DI TRASPORTO	5.000.000,00	5.000.000,00	D51B21001340005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	131.031,10			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0201	NUOVA RETE DI PERCORSI CICLABILI*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI PERCORSI CICLABILI COLLEGATI CON L' ARTERIA PRINCIPALE DELLA PISTA CICLABILE TRANSISTANTE SULL' EX TRACCIATO FERROVIARIO	2.400.000,00	2.400.000,00	D51B21001350005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	218.899,02			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0201	PLESSO SCOLASTICO DI VIA GIBELLI*VIA GIBELLI*REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA GIBELLI	1.000.000,00	1.000.000,00	D52C21000510005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	184.985,09			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0201	EDIFICIO SCOLASTICO PIAZZA CALVI*PIAZZA ULISSE CALVI*REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA CALVI	4.950.000,00	4.950.000,00	D53D21004630005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	292.893,06			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0201	CAMPO DI ATLETICA COMUNALE A. LAGORIO*VIA LITTARDI TOMMASO*REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECUPERO PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO SPORTIVO E RISTRUTTURAZIONE DI MANUFATTI EX MILITARI PRESSO IL CAMPO DI ATLETICA	1.200.000,00	1.200.000,00	D53D21004640005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	4.945,80	169.569,66			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0201	PALESTRA MAGGI*VIA SILORATA 18*REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MIGLIORAMENTO SISMICO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA MAGGI	1.000.000,00	1.000.000,00	D53D21004650005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	39.516,02	158.778,87			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0201	CAMPI SAN LAZZARO*LUNGOMARE VESPUCCI*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PUBBLICO PER LA PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVA E LUDICO-CREATIVA - NON DESTINATO AD ATTIVITA' AGONISTICA - ZONA S.LAZZARO, LUNGOMARE VESPUCCI	750.000,00	750.000,00	D53D21004660005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	200,00	152.612,70			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0201	CIVICO TEATRO CAVOUR*VIA F. CASCIONE 35*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIVICO TEATRO CAVOUR DI IMPERIA	800.000,00	800.000,00	D53D21004670005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	4.036,40	163.522,58			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0201	PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE EX SEDE MUSEALE POLIVALENTE*PIAZZA DUOMO*1° LOTTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER NUOVA DESTINAZIONE USI DIDATTICI	995.000,00	995.000,00	D53D21004680005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	4.900,00	246.646,78			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0201	PORZIONE FABBRICATO "EX-SALSO" E AREE PERTINENZIALI*VIA SCARINCIO*INTERVENTO DI RESTAURO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA CORTE INTERNA DEL FABBRICATO " EX-SALSO" , A FINI MUSEALI E PER EVENTI CULTURALI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI	495.000,00	495.000,00	D53D21004690005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	601,80	81.701,75			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0201	" CASE PARCHEGGIO" DI VIA G. AIRENTI*VIA G.AIRENTI, LOCALITÀ PIANI*INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPREDENTI LA RIQUALIFICAZIONE COMPLETA DEGLI ALLOGGI E LA RISTRUTTURAZIONE DELLE PARTI COMUNI DELL' EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE DI VIA G.AIRENTI	1.750.000,00	1.750.000,00	D53D21004700005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	31.566,60	183.859,39			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0201	IMMOBILE EX FERRIERE*LUNGOMARE AMERIGO VESPUCCI*RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE PUBBLICO DENOMINATO STECCA EX FERRIERE DA DESTINARE A POLO SCOLASTICO			D53D22000900001	ALTRO				PER IL MOMENTO NON PRESENTE A BILANCIO		Costo progetto 4950.000
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0201	STADIO N. CICCIONE*PIAZZA D'ARMI S.N.C.*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO STADIO N. CICCIONE			D57D22000050006	ALTRO				PER IL MOMENTO NON PRESENTE A BILANCIO		Costo progetto 155.000
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0203	AREA SAN LAZZARO*VIA SAN LAZZARO*REALIZZAZIONE EDIFICIO D = REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA DESTINARSI AD ATTIVITÀ SPORTIVE/RICREATIVE CON FINALITÀ SOCIALI	895.930,00	895.930,00	D51B21000310001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	89.450,20			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0203	AREA SAN LAZZARO*VIA SAN LAZZARO*SISTEMAZIONE GENERALE DEL LOTTO, VERDE PUBBLICO, CREAZIONE PARCO GIOCHI SENZA BARRIERE, REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE ALLA GREEN LINE, INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI, ARREDO URBANO	3.696.529,00	3.696.529,00	D53D21000540001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	369.063,40			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0203	EDIFICIO EX SAIRO*VIA SAN LAZZARO*RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' EDIFICIO EX SAIRO E REALIZZAZIONE DI NUOVA PALAZZINA IN SOCIAL HOUSING CON ANNESSO PARCHEGGIO INTERRATO DI PERTINENZA	10.403.892,00	10.403.892,00	D54E21000080001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	26.341,50	1.039.042,30			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE- ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M5C2I0301	CITTADELLA DELLO SPORT N. CICCIONE -M5-C2-I 3.1 - CLUSTER 1 - CUP MASTER J55E22000170006*PIAZZA D'ARMI S.N.C.*M5-C2-I 3.1 - CLUSTER 1 - CUP MASTER J55E22000170006 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE DI CAMPI DA PADEL, BOCCE, PERCORSO VITA, CON RELATIVE COPERTURE E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE NONCHE' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	1.495.000,00	1.495.000,00	D55B22000100006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M1C1I0104	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.5 PND	59.966,00	59.966,00	D51F22003410006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI IMPERIA - IMPERIA -	M1C1I0104	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 SITO E SERVIZI	280.932,00	280.932,00	D51F22004300006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M1C1I0102	SERVIZI INFORMATICI*PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 7 19124 LA SPEZIA*MIGRAZIONE AL CLOUD 18 SERVIZI FINANZIAMENTO BANDO PNRR 1.2	419.124,00	419.124,00	G47H22001880001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M1C1I0104	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 7 19124 LA SPEZIA*SITO COMUNALE E SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	328.160,00	328.160,00	G41F22000570006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M1C1I0104	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI CIE	14.000,00	14.000,00	G41F22001210006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	0,00			
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M1C3I0102	CENTRO PER L'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA*PIAZZA C. BATTISTI 1*RIMOZIONE BARRIERE FISICHE, COGNITIVE E SENSORIALI	306.500,00	306.500,00	G47B22000310006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			AMMESSO A FINANZIAMENTO DA DECRETO 487 DEL 21/12/2022 MIN. CULTURA DI APPROVAZIONE GRADUATORIE. ATTESA TRASMISSIONE ATTO D'OBBLIGO
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M1C3I0103	TEATRO CIVICO LA SPEZIA*PIAZZA MENTANA*LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI	500.000,00	400.000,00	G44J22000000001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	40.000,00			
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M2C3I0101	SCUOLA MEDIA FONTANA*VIA DEL CANALETTO 165*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO	4.147.360,00	4.147.360,00	G41B22000500006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ENTRO IL 10/07/2023, DETERMINA AGGIUDICAZIONE E LAVORI ENTRO IL 20/09/2023 (UE)

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M2C4I0202	ASILO NIDO COCCINELLA, SCUOLA MEDIA PIAGET, SCUOLA DELL' INFANZIA PARTO VERDE, SCUOLA PRIMARIA REVERE, SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PALAZZO DEGLI STUDI*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	170.000,00	170.000,00	G42G20000110001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	108.970,34	0,00		INTERVENTO CONFLUITO SU PNRR COME DA COMUNICATO MIN. INTERNO-DAIT DEL 11/05/2022. PER OTTENERE EROGAZIONE 5% FINALE INSERIRE TUTTA DOCUMENTAZIONE SU SISTEMA REGIS. MINISTERO NON HA ANCORA INSERITO CUP IN ReGIS	
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M4C1I0101	POLO DELL'INFANZIA DI VIA SARDEGNA*VIA SARDEGNA*REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA DA AGGREGAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO	2.887.600,07	2.887.600,07	G41B22001430006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00		AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO IL 31/05/2023 (UE)	
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M5C2I0103	COMUNE DELLA SPEZIA CAPOFILA DSS18 E COMUNE BOLANO CAPOFILA DSS17*PIAZZA EUROPA 1*POVERTA' ESTREMA HOUSING FIRST	710.000,00	710.000,00	G64H22000140007	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00		ATTESA CONVENZIONE DA MINISTERO PER SOTTOSCRIZIONE	
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M5C2I0103	COMUNE DELLA SPEZIA CAPOFILA DSS 18 E COMUNE DI BOLANO CAPOFILA DSS 17*PIAZZA EUROPA 1*STAZIONI DI POSTA	1.090.000,00	1.090.000,00	G64H22000160007	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00		ATTESA CONVENZIONE DA MINISTERO PER SOTTOSCRIZIONE	
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M5C2I0201	COMPLESSO SCOLASTICO M. FONTANA*VIA DEL CANALETTO*REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA	2.025.000,00	1.750.000,00	G41B21003680001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	175.000,00	COSTO PROGETTO AUMENTATO A € 2.025.000,00 CON DET. 5649 DEL 06/12/2022 DI RIAPPROVAZIONE E QE PROG. FATTIBILITA'. IMPORTO FINANZIATO SU PNRR PARI A € 1.750.000,00.	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO IL 30/07/2023	
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M5C2I0201	PALAZZETTO DELLO SPORT "MARIOTTI"*VIA CARLO ALBERTO FEDERICI 1*REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO	1.865.722,28	1.750.000,00	G41B21003690001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	175.000,00	COSTO PROGETTO AUMENTATO A € 1.865.722,28 CON DET. 5809 DEL 13/12/2022 DI RIAPPROVAZIONE E QE PROG. FATTIBILITA'. IMPORTO FINANZIATO SU PNRR PARI A € 1.750.000,00.		

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M5C2I0201	AREA OVEST DI CADIMARE*LOC. CADIMARE*RIFUNZIONALIZZAZIONE DI AREE PUBBLICHE (GIARDINI PUBBLICI E ANTISTANTE PIAZZETTA IN FREGIO AL MARE)	1.987.887,33	1.987.887,33	G47H21001280001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	198.788,73	RIDUZIONE COSTO PROGETTO A € 1.987.887,33 A SEGUITO RIAPPROVAZIONE E QE PROG. FATTIBILITA' CON DET. 5842 DEL 13/12/2022 . TOTALMENTE FINANZIATO SU RISORSE PNRR		
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M5C2I0201	BIBLIOTECA CIVICA "P.M. BEGHI"*VIA DEL CANALETTO 100*AMPLIAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI SPAZI ATTRAVERSO LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PARTE DEL CAPANNONE A MONTE DELLA BIBLIOTECA	2.060.000,00	1.950.000,00	G47H21001290001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	195.000,00	COSTO PROGETTO AUMENTATO A € 2.060.000,00 CON DET. 5843 DEL 13/12/2022 DI RIAPPROVAZIONE E QE PROG. FATTIBILITA'. IMPORTO FINANZIATO SU PNRR PARI A € 1.950.000,00.		
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M5C2I0301	CAMPO SPORTIVO "A. MONTAGNA"*VIALE FIESCHI*SPOSTAMENTO DEL CAMPO DI TIRO CON L'ARCO	68.000,00	68.000,00	G43I22000150006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	6.800,00			
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M5C2I0301	PALAZZETTO DELLO SPORT "G. MARIOTTI"*VIA CARLO ALBERTO FEDERICI*REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO NATATORIO	2.432.000,00	2.432.000,00	G45B22000070006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	243.200,00		CUP NON ANCORA INSERITO IN ReGIS DA AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	72.840,00	72.840,00	G41F22004340006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00	IN ACCORDO CON DIPARTIMENTO RIPRESENTATA DOMANDA CON NUOVO CUP APPROVATA CON DECRETO N. 129-1/2022-PNRR.		
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M1C1I0104	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	36.400,00	36.400,00	G41F22004320006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00	IN ACCORDO CON DIPARTIMENTO RIPRESENTATA DOMANDA CON NUOVO CUP APPROVATA CON DECRETO N. 127-1/2022-PNRR.		
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M1C1I0105	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	59.966,00	59.966,00	G41F22004060006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00	IN ACCORDO CON DIPARTIMENTO RIPRESENTATA DOMANDA CON NUOVO CUP APPROVATA CON DECRETO N. 131-2/2022-PNRR.		

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M2C4I0202	RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI A) (DM 30 GENNAIO 2020)-ANNO 2021	170.000,00	170.000,00	G41E20000270001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	131.941,39	0,00		INTERVENTO CONFLUITO SU PNRR COME DA COMUNICATO MIN. INTERNO-DAIT DEL 11/05/2022. RENDICONTAZIONE SU REGIS AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE EROGAZIONI RESTANTI. CUP NON ANCORA INSERITO SU REGIS DA AMM.NE CENTRALE	
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M2C4I0202	RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI B) (DM 30 GENNAIO 2020)-ANNO 2022	170.000,00	170.000,00	G41E20000280001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	125.090,11	0,00		INTERVENTO CONFLUITO SU PNRR COME DA COMUNICATO MIN. INTERNO-DAIT DEL 11/05/2022. RENDICONTAZIONE SU ReGIS AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE EROGAZIONI RESTANTI. CUP NON ANCORA INSERITO SU ReGIS DA AMM.NE CENTRALE	
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M2C4I0202	RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI C) (DM 30 GENNAIO 2020)-ANNO 2023	170.000,00	170.000,00	G49J21002180001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00		INTERVENTO CONFLUITO SU PNRR COME DA COMUNICATO MIN. INTERNO-DAIT DEL 11/05/2022. RENDICONTAZIONE SU ReGIS AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE EROGAZIONI RESTANTI. CUP NON ANCORA INSERITO SU ReGIS DA AMM.NE CENTRALE	

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M2C4I0202	RIQUALIFICAZIONE NORMATIVA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERVENTI D) (DM 30 GENNAIO 2020)-ANNO 2024	170.000,00	170.000,00	G49J22000550001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00		INTERVENTO CONFLUITO SU PNRR COME DA COMUNICATO MIN. INTERNO-DAIT DEL 11/05/2022. RENDICONTAZIONE SU ReGIS AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE EROGAZIONI RESTANTI. CUP NON ANCORA INSERITO SU ReGIS DA AMM.NE CENTRALE	
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M2C4I0202	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI NUOVA SEDE CASERMA VV.UU. (DM 20 NOVEMBRE 2020)	170.000,00	170.000,00	G41J21000020001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	87.851,53	0,00		INTERVENTO CONFLUITO SU PNRR COME DA COMUNICATO MIN. INTERNO-DAIT DEL 11/05/2022. RENDICONTAZIONE SU ReGIS AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE EROGAZIONI RESTANTI. CUP NON ANCORA INSERITO SU ReGIS DA AMM.NE CENTRALE	
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M2C2I4.1.2	PISTE CICLABILI IN CENTRO CITTA' - CICLOPOLITANA	298.035,62	155.507,51	G41B20000360001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	0,00	PROGETTO ORIGINARIAMENTE FINANZIATO DA DECRETO MIT 344 DEL 12/08/20. CONFLUITO SU PNRR CON DECRETO MIT 509 DEL 15/12/21		

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI LA SPEZIA - LA SPEZIA -	M2C3I1SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA A RESIDENZIALE E PUBBLICA"- FONDO COMPLEMENTARE	UNITA' IMMOBILIARE "PORTA GENOVA": VIA ANITA GARIBALDI, 12	256.937,74	256.937,74	G43D21005110001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	5.616,00	0,00			A SEGUITO PREASSEGNAZIONE RISORSE PER ADEGUAMENTO PREZZI DEL 15% COMUNICATA DA REGIONE LIGURIA CON PROT. 1244431 DEL 07/11/2022, CON DET. 5352 DEL 18/11/2022 DI APPROVAZ. NUOVO QE, IL COSTO PROGETTO E' STATO AUMENTATO A € 256.937,74 INTERAMENTE FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR
COMUNE DI LAVAGNA - GENOVA -	M1C1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE* TERRITORIO COMUNALE* N 14 SERVIZI DA MIGRARE	121.992,00	121.992,00	I61C22001400006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI LAVAGNA - GENOVA -	M1C1I0104	APPLICAZIONE APP IO* TERRITORIO NAZIONALE* ATTIVAZIONE SERVIZI	17.150,00	17.150,00	I61F22002160006	ATTIVO	IN FASE DI AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI LAVAGNA - GENOVA -	M1C1I0104	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	51.654,00	51.654,00	I61F22003630006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI LAVAGNA - GENOVA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	32.589,00	32.589,00	I61F22002990006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI LAVAGNA - GENOVA -	M2C4I0202	STRADE VARIE/ ILLUMINAZIONE PUBBLICA* VIA VARIE* MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RELAMPING DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	90.000,00	90.000,00	I63G19000050001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	84.818,80	45.000,00			
COMUNE DI LAVAGNA - GENOVA -	M2C4I0202	SCUOLA MEDIA DON CARLO GNOCCHI* VIA CASTAGNOLA 14* MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA, LOTTO IV	300.000,00	300.000,00	I66E18000060001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	118.677,67	60.000,00			
COMUNE DI LAVAGNA - GENOVA -	M2C4I0202	STRADA COMUNALE* VIA BARATTINA* CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE E COSTRUZIONE STRUTTURA DI SOSTEGNO	150.000,00	150.000,00	I67H20001470001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	150.000,00	150.000,00			
COMUNE DI LAVAGNA - GENOVA -	M2C4I0202	PALAZZO COMUNALE/ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO* PIAZZA DELLA LIBERTÀ* EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE	39.200,00	39.200,00	I69J21001380001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	39.200,00	25.939,06			
COMUNE DI LAVAGNA - GENOVA -	M2C4I0202	RELAMPING IMPIANTI COMUNALI* VIA VARIE* RELAMPING IMPIANTI COMUNALI	140.800,00	140.800,00	I69J21001390001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	140.800,00	140.800,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI LAVAGNA - GENOVA -	M2C4I0202	PISTA CICLABILE "GINO BARTALI" LUNGOENTELLA*LUNGOENTELLA *EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISTA PEDONALE E CICLABILE	90.000,00	90.000,00	I69J22000000006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	30,00	0,00			
COMUNE DI LOANO - SAVONA -	M1C1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N.11 SERVIZI DA MIGRARE	73.388,00	73.388,00	E11C22001390006	ATTIVO	IN ATTUAZIONE	0,00	0,00	In considerazione del fatto che si tratta di servizi digitali, erogati mediante voucher sulla base di pacchetti predefiniti, non è possibile valorizzare la colonna K non essendo individuabili delle fasi di lavorazione; ad ogni modo l'Ente sta procedendo ad una indagine di mercato per individuare il fornitore maggiormente idoneo a realizzare i servizi individuati;		

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI LOANO - SAVONA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI			E11F22000810006	IN RIMODULAZIONE		0,00	0,00	Voucher assegnato in data 02/08/2022; Rinuncia alla candidatura in data 18/11/2022 a causa dell'intervenuto parziale finanziamento, con il Fondo innovazione, di alcuni servizi inseriti nell'avviso di PA Digitale. Seconda candidatura inviata in data 28/11/2022; al 31/12/2022 risultava in VERIFICA; finanziamento assegnato in data 20/01/2023 In considerazione del fatto che si tratta di servizi digitali, erogati mediante voucher sulla base di pacchetti predefiniti, non è possibile valorizzare la colonna K non essendo individuabili delle fasi di lavorazione; ad ogni modo l'Ente sta procedendo ad una indagine di mercato per individuare il fornitore maggiormente idoneo a realizzare i servizi individuati;		Costo progetto 10.284

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI LOANO - SAVONA -	M1C1I0104	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI			E11F22001050006	IN RIMODULAZIONE		0,00	0,00	finanziamento assegnato in data 12/08/2022; Rinuncia alla candidatura in data 17/11/2022 a causa dell'intervenuto parziale finanziamento, con il Fondo innovazione, di alcuni servizi inseriti nell'avviso di PA Digitale Seconda candidatura inviata in data 28/11/2022; al 31/12/2022 risultava in VERIFICA; finanziamento assegnato in data 10/01/2023; In considerazione del fatto che si tratta di servizi digitali, erogati mediante voucher sulla base di pacchetti predefiniti, non è possibile valorizzare la colonna K non essendo individuabili delle fasi di lavorazione		Costo progetto 16.807

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI LOANO - SAVONA -	M1C1I0104	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*PIAZZA ITALIA*ENTRAMBI	155.234,00	155.234,00	E11F22001470006	ATTIVO		0,00	0,00	finanziamento assegnato in data 19/09/2022; al 31/12/2022 risultava FINANZIATA; In considerazione del fatto che si tratta di servizi digitali, erogati mediante voucher sulla base di pacchetti predefiniti, non è possibile valorizzare la colonna K non essendo individuabili delle fasi di lavorazione; ad ogni modo l'Ente sta procedendo ad una indagine di mercato per individuare il fornitore maggiormente idoneo a realizzare i servizi individuati;		
COMUNE DI LOANO - SAVONA -	M2C4I0202	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E TECNOLOGICI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. ELLENA A FRONTE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 29 L.160 DEL 27/12/2019.*VIA S. AMICO*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E TECNOLOGICI CAMPO SPORTIVO G. ELLENA	90.000,00	90.000,00	E17H21000500005	CUP CHIUSO PER COMPLETAMENTO PROGETTO	INTERVENTO CONCLUSO	77.373,33	0,00			
COMUNE DI LOANO - SAVONA -	M2C4I0202	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA RAMELLA DI VIA STELLA A FRONTE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 29 L.160 DEL 27/12/2019.*VIA STELLA*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE RESIDENZA PROTETTA RAMELLA	90.000,00	90.000,00	E17H21000520005	CUP CHIUSO PER COMPLETAMENTO PROGETTO	INTERVENTO CONCLUSO	77.249,15	0,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI LOANO - SAVONA -	M2C4I0202	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "E. GARASSINI" DI VIA MATTEOTTI A FRONTE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 29, DELLA LEGGE 27/12/2019 N.160.*VIA MATTEOTTI*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "E. GARASSINI" DI VIA MATTEOTTI	90.000,00	90.000,00	E19H20000180005	CUP CHIUSO PER COMPLETAMENTO PROGETTO	INTERVENTO CONCLUSO	75.317,58	0,00			
COMUNE DI LOANO - SAVONA -	M2C4I0202	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO SECONDARIO PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE "G. ELLENA" DI VIALE S. AMICO*VIALE S. AMICO*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO SECONDARIO	90.000,00	90.000,00	E19J22001080006	ATTIVO	COLLAUDO	4.747,26	0,00			
COMUNE DI LOANO - SAVONA -	M2C4I0202	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PISCINA ESTERNA ED AREE LIMITROFE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT A FRONTE DEL CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 29 L.160 DEL 27/12/2019.	90.000,00	90.000,00	E14J22001810006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI LOANO - SAVONA -	MIC1I0104	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*1) NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA; 2) NOTIFICHE VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA; 3) INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI.	32.589,00	32.589,00	E11F22003430006	ATTIVO		0,00	0,00	candidatura ammessa il 12/10/2022 al 31/12/2022 risultava in VERIFICA; finanziamento assegnato il 03/01/2023; In considerazione del fatto che si tratta di servizi digitali, erogati mediante voucher sulla base di pacchetti predefiniti, non è possibile valorizzare la colonna K non essendo individuabili delle fasi di lavorazione; ad ogni modo l'Ente sta procedendo ad una indagine di mercato per individuare il fornitore maggiormente idoneo a realizzare i servizi individuati		
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	MIC1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 14 SERVIZI DA MIGRARE	252.118,00	252.118,00	J61C22000550006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00	Si tratta di progetto in ambito "Digitalizzazione PA", le cui fasi non si rispecchiano totalmente in quelle del menu a tendina della colonna K, proprie dei Lavori; è stato scelto "aggiudicazione" per indicare la fase che inizia dopo la notifica del decreto di finanziamento con la ricerca di fornitori per lo svolgimento del progetto, secondo le relative specifiche, fino all'aggiudicazione e contrattualizzazione e con i fornitori, da indicare sulla Piattaforma on line "PADigitale 2026"	"	

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M1C1I0104	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI CIE	14.000,00	14.000,00	J61F22000980006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00	Si tratta di progetto in ambito "Digitalizzazione PA" , le cui fasi non si rispecchiano totalmente in quelle del menu a tendina della colonna K, proprie dei Lavori; è stato scelto "aggiudicazione" per indicare la fase che inizia dopo la notifica del decreto di finanziamento con la ricerca di fornitori per lo svolgimento del progetto, secondo le relative specifiche, fino all'aggiudicazione e contrattualizzazione e con i fornitori, da indicare sulla Piattaforma on line "PADigitale 2026"		
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	49.167,00	49.167,00	J61F22002210006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00	Si tratta di progetto in ambito "Digitalizzazione PA" , le cui fasi non si rispecchiano totalmente in quelle del menu a tendina della colonna K, proprie dei Lavori; è stato scelto "aggiudicazione" per indicare la fase che inizia dopo la notifica del decreto di finanziamento con la ricerca di fornitori per lo svolgimento del progetto, secondo le relative specifiche, fino all'aggiudicazione e contrattualizzazione e con i fornitori, da indicare sulla Piattaforma on line "PADigitale 2026"		

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M1C1I0104	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	16.744,00	16.744,00	J61F22002480006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00	Si tratta di progetto in ambito "Digitalizzazione PA", le cui fasi non si rispecchiano totalmente in quelle del menu a tendina della colonna K, proprie dei Lavori; è stato scelto "aggiudicazione" per indicare la fase che inizia dopo la notifica del decreto di finanziamento con la ricerca di fornitori per lo svolgimento del progetto, secondo le relative specifiche, fino all'aggiudicazione e contrattualizzazione e con i fornitori, da indicare sulla Piattaforma on line "PADigitale 2026"		
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M2C4I0202	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA DEL TORRENTE SAN FRANCESCO - VIA MILITE IGNOTO 2° STRALCIO DEL 1° LOTTO*VIA MILITE IGNOTO*REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA DEL TORRETE E SISTEMAZIONE STRADALE	4.150.000,00	1.245.000,00	J61B18000010006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	394.462,26	249.000,00	L'IMPORTO DI EURO 1.245.000,00 E' FINANZIATO DA FONDI PNRR. IL RESTANTE IMPORTO E' FINANZIATO DA FONDI DI REGIONE LIGURIA		
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M2C4I0202	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA DEL TORRENTE SAN FRANCESCO VIA MILITE IGNOTO 1° LOTTO*VIA MILITE IGNOTO*COMPLETAMENTO DELLE OPERE DEL 1 STRALCIO	2.060.000,00	750.000,00	J61B20000110006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	280.171,69	150.000,00	L'IMPORTO DI EURO 750.000,00 E' FINANZIATO DA FONDI PNRR. IL RESTANTE IMPORTO E' FINANZIATO DA FONDI DI REGIONE LIGURIA		
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M2C4I0202	SCUOLA GIUSTINIANI VIA FRANTINI*VIA FRANTINI*RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE GIUSTINIANI - II FASE	73.000,00	25.318,17	J64D22001070005	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	0,00	0,00	IL PROGETTO E' STATO FINANZIATO CON LE ECONOMIE DI GARA 8 COME PREVISTO DAL BANDO) DEL CUP J69J21002910001 - L'IMPORTO DELL'OPERA E' FINANZIATO PER EURO 25.318,17 DA FONDI PNRR E PER LA QUOTA RESTANTE DA FONDI COMUNALI -	RICEVUTI EURO 25.318,17 A COMPLETA RENDICONTAZIONE SU TBEL	

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M2C4I0202	IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI COMUNALI PIAZZA MOLFINO RAPALLO*PIAZZA MOLFINO*RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI SPAZI SITI AL PIANO PRIMO DELL' EX OSPEDALE DI RAPALLO DA ADIBIRSI AD UFFICI COMUNALI	215.000,00	130.000,00	J64H22000550001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	21.190,44	0,00			
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M2C4I0202	SCUOLA MEDIA A. GIUSTINIANI*VIA FRANTINI 7*RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	500.000,00	500.000,00	J66B2000060004	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	251.294,64	100.000,00			
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M2C4I0202	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEL PALAZZO COMUNALE: SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI CALORE, AMPLIAMENTO DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI.*PIAZZA DELLE NAZIONI 4*SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI CALORE, AMPLIAMENTO DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI.	130.000,00	130.000,00	J66G20000120001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	104.373,76	0,00	CON LE ECONOMIE DI GARA E' STATO ATTIVATO IL NUOVO CUP J69J2100060001FIN ANZIATO COMPLETAMENT E DALLA STESSA LEGGE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	RICEVUTI EURO 130.000,00 A COMPLETA RENDICONTAZIONE SU TBEL	
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M2C4I0202	CONSOLIDAMENTO E AMPLIAMENTO PONTE CARRABILE STRADA COMUNALE S.MASSIMO.*VIA S.MASSIMO*CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE	390.000,00	250.000,00	J67H17000970004	ATTIVO	PROGETTAZIONE	8.222,00	50.000,00	A SEGUITO DELLA CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA L'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E' AUMENTATO AD EURO 390.000,00.CONSEGUENTEMENTE IL PROGETTO E' FINANZIATO PER EURO 250.000,00 DA FONDI PNRR E PER EURO 140.000,00 DA FONDI COMUNALI		
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M2C4I0202	VIA ROSSELLI*VIA ROSSELLI*ADEGUAMENTO SOTTOPASSO DI VIA ROSSELLI	600.000,00	600.000,00	J67H20001770004	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	120.000,00			
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M2C4I0202	PALAZZO COMUNALE PIAZZA DELLE NAZIONI - SCUOLA GIUSTINIANI VIA FRANTINI*RAPALLO*OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE: LOTTO 1 AMPLIAMENTO DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL MUNICIPIO AL SERVIZIO DEGLI UFFICI DEL PIANO SECONDO LOTTO 2 RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO	260.000,00	260.000,00	J69J21002910001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	195.169,30	0,00		IMPORTI RICEVUTI A RENDICONTAZIONE CONCLUSA SU TBEL	

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M4C1I0101	ASILO NIDO VIA BOBBIO*VIA DON BOBBIO*RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO S. ANNA	865.000,00	865.000,00	J63C22000290006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	86.500,00			
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M4C1I0101	SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANNA*VIA ARPINATI 50*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO SCUOLA DELL' INFANZIA S. ANNA	3.750.000,00	3.750.000,00	J68H22000000006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	275.000,00			
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M5C2I0101	SUPERVISIONE PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI DISTRETTI 14-15-16*CONFERENZA DEI SINDACI ASL 4 SISTEMA SANITARIA REGIONE LIGURIA*SUPERVISIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVA	210.000,00	158.445,00	J94H22000130006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M5C2I0102	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ*DISTRETTO 14 TIGULLIO*INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ	300.000,00	238.160,00	J64H22000300006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			modalità di reperimento alloggio che richiederanno nel corso del 2023 una rimodulazione e una modifica del piano finanziario non negli importi ma rispetto alla tipologia di spesa e al soggetto che l'assumerà.
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M5C2I0201	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE E RINNOVAMENTO DEL TEATRO-AUDITORIUM DELLE CLARISSE*PIAZZA ESCRIVÀ*PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE E RINNOVAMENTO DEL TEATRO-AUDITORIUM DELLE CLARISSE	2.500.000,00	2.383.383,24	J65F21000240005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	238.238,22			
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M5C2I0201	VILLA TIGULLIO*PARCO CASALE (LOC. SAN ROCCO)*PROGETTO DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE (MUESO E BIBLIOTECA) ATTRAVERSO IL RESTAURO DI VILLA TIGULLIO	1.800.000,00	1.709.915,00	J65F21000270005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	170.991,52			
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M5C2I0201	ANTICO CASTELLO DI RAPALLO*VIA LUNGOMARE VITTORIO VENETO*PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' CULTURALE DI ALLESTIMENTO MUSEALE ATTRAVERSO IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL' ANTICO CASTELLO MEDIEVALE DI RAPALLO	900.000,00	851.785,00	J65F21000280005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	85.178,56			
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M2C4I0202	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE PIAZZA NAZIONI 4 - SOSTITUZIONESERRAMENTI E RISANAMENTO LOCALI SOTTOTETTO -	25.000,00	25.000,00	J69J2100060001	ATTIVO	CONCLUSO	25.000,00	0,00	CUP INSERITO DA COMUNE	RICEVUTI EURO 130.000,00 A COMPLETA RENDICONTAZIONE SU TBEL (STESSO ACCERTAMENTO DEL CUP PADRE)	

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI RAPALLO - GENOVA -	M1C1I0104	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - PACCHETTO CITTADINO INFORMATO E PACCHETTO CITTADINO ATTIVO	280.932,00	280.932,00	J61F22003650006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00	PROGETTO AGGIUNTO ANCHE SE IL DECRETO DI FINANZIAMENTO E' STATO NOTIFICATO il 3/01/2023. Si tratta di progetto in ambito "Digitalizzazione PA", le cui fasi non si rispecchiano totalmente in quelle del menu a tendina della colonna K, proprie dei Lavori; è stato scelto "aggiudicazione" per indicare la fase che inizia dopo la notifica del decreto di finanziamento con la ricerca di fornitori per lo svolgimento del progetto, secondo le relative specifiche, fino all'aggiudicazione e contrattualizzazione e con i fornitori, da indicare sulla Piattaforma on line "PADigitale 2026"		
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M1C1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE* TERRITORIO COMUNALE*N. 18 SERVIZI DA MIGRARE	419.124,00	419.124,00	G21C22000520006	Attivo	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI			G21F22000810006	REVOCATO		0,00	0,00	Costo progetto 100.155. Nuovo CUP G21F22004020006 Nuovo importo 96.513,00€		
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M1C1I0104	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI SPID E CIE			G21F22001020006	REVOCATO		0,00	0,00	Costo progetto 14.000. Nuovo CUP G21F22004040006		
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M1C1I0104	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	36.400,00	36.400,00	G21F22002110006	Attivo	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M1C3I0203	GIARDINO DI VILLA ANGERER* VIA ASQUASCIATI* RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO STORICO MEDIANTE UNA SERIE COORDINATA DI INTERVENTI RELATIVI ALLE COMPONENTI VEGETALI, ARCHITETTONICHE, IMPIANTISTICHE E CORRELATE ALL'ACCESSIBILITÀ			G28E22000010006	NON FINANZIATO		0,00				Costo progetto 1.696.165

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M1C3I0203	GIARDINO DI VILLA ZIRIO*CORSO CAVALLOTTI 51*RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO STORICO MEDIANTE UNA SERIE COORDINATA DI INTERVENTI RELATIVE ALLE COMPONENTI VEGETALI, ARCHITETTONICHE, IMPIANTISTICHE E CORRELATE ALLA FRUIBILITA'			G28E22000020006	NON FINANZIATO		0,00				Costo progetto 1.940.165
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M2C4I0201	ZONA "LA VESCA"*LOCALITA' LA VESCA*SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ LA VESCA-PISTA CICLABILE-BIVIO S.S. N.1 AURELIA KM 667+800-POGGIO CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI SCOGLIERA A MARE	1.600.000,00	1.600.000,00	G22B22000620006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M2C4I0202	SCUOLA ELEMENTARE DANI SCAINI*VIA STRADA SAN MARTINO 73*MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI LOCALI E ADEGUAMENTI IN MATERIA DI ANTINCENDIO	48.312,00	48.312,00	G21E20000040001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	48.312,00	0,00	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2021 - FINANZIAMENTO DEL 2020 CONFLUITO NEL PNRR NELL'ANNO 2022		
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M2C4I0202	SCUOLA ELEMENTARE SAN GIACOMO - SANREMO*STRADA SAN GIACOMO 34*MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE MIGLIORIE ALLA TRASMITTANZA DI SUPERFICI OPACHE E TRASPARENTI	170.000,00	170.000,00	G24D22000360006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	116.462,74	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M2C4I0202	AUTORIMESSA DI COLDIRODI*VIA UMBERTO, LOCALITÀ COLDIRODI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	12.032,00	12.032,00	G24E21001000001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	12.032,00	0,00	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2021 - FINANZIAMENTO DEL 2021 CONFLUITO NEL PNRR NELL'ANNO 2022		
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M2C4I0202	EMPORIO SOLIDALE PRESSO IL PALAFIORI DI SANREMO*VIA MARSAGLIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI - EMPORIO SOLIDALE PALAFIORI	10.492,00	10.492,00	G24E21001010001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	10.492,00	0,00	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2021 - FINANZIAMENTO DEL 2021 CONFLUITO NEL PNRR NELL'ANNO 2022		
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M2C4I0202	AUTORIMESSA DELLA STAZIONE FERROVIARIA*CORSO CAVALLOTTI*MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'AUTORIMESSA FERROVIARIA	147.981,00	147.981,00	G24E21001230001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	147.981,00	0,00	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2022 - FINANZIAMENTO DEL 2021 CONFLUITO NEL PNRR NELL'ANNO 2022		

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M2C4I0202	SCUOLA GHIROTTI - BUSSANA*PIAZZA DELLE SCUOLE N.1*REALIZZAZIONE DEL LOCALE PALESTRA/COMPUTER PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "GHIROTTI" DI BUSSANA	165.000,00	165.000,00	G24I19002860004	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	165.000,00	0,00	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2022 - FINANZIAMENTO DEL 2021 CONFLUITO NEL PNRR NELL'ANNO 2022		
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M2C4I0202	STADIO COMUNALE DI SANREMO*CORSO MAZZINI*SOSTITUZIONE DI PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE CON NUOVI APPARECCHI A LED	121.688,00	121.688,00	G26J20000150001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	121.688,00	0,00	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2021 - FINANZIAMENTO DEL 2020 CONFLUITO NEL PNRR NELL'ANNO 2022		
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M2C4I0202	SCUOLA ELEMENTARE DANI SCAINI SANREMO*STRADA SAN MARTINO 73*MESSA IN SICUREZZA DEL CONTROSOFFITTO NELL'AULA AL SECONDO PIANO DELLA SCUOLA DANI SCAINI	4.496,00	4.496,00	G27H21029690001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	4.496,00	0,00	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2021 - FINANZIAMENTO DEL 2021 CONFLUITO NEL PNRR NELL'ANNO 2022		
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M4C1I0101	SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO - SANREMO*STRADA BORGO TINASSO 151*DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE COSTITUENTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA BORGO TINASSO E RICOSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA	1.949.760,00	1.949.760,00	G22C22000080006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	138.234,75	194.976,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M4C1I0101	AREA DI PROPRIETA' COMUNALE ATTUALMENTE DESTINATA A VIVAIO COMUNALE - VIA DUCA DEGLI ABRUZZI -*VIA DUCA DEGLI ABRUZZI*NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE A NUOVO POLO DELL'INFANZIA AI SENSI DELL'ART.3 D.LGS. 65 DEL 2017	1.752.000,00	1.752.000,00	G25E22000030006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	139.760,04	175.200,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M4C1I0102	SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO - SANREMO*STRADA SAN PIETRO*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	230.000,00	230.000,00	G28H22000050006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	18.276,59	23.000,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M4C1I0103	SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO - SANREMO*STRADA SAN PIETRO*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE	184.200,00	184.200,00	G24E22000310006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	7.392,84	18.420,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I010101	PROGRAMMA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SULL'INTERVENTO CON BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONI DI VULNERABILITÀ*DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 2 SANREMESE*SERVIZIO EDUCATIVO, SUPPORTO ALLE FAMIGLIE CON GRUPPI, FORMAZIONE E PROMOZIONE PER GLI OPERATORI E LE FAMIGLIE DI APPOGGIO	211.500,00	211.500,00	G29I22000330005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I010103	RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE*CONFERENZA DEI SINDACI ASLI IMPERIESE*GESTIONE DOMANDA/OFFERTA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FAMILIARE E FORMAZIONE ASSISTENTI FAMILIARI	330.000,00	330.000,00	G29I22000340001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0102	LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 AREA RAFFORZAMENTO EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E PROGETTAZIONE INDIVIDUALE, AREA DELL'ABITAZIONE E AREA DEL LAVORO.*DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 SANREMESE*ACCOMPAGNAMENTO E RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI IN FAVORE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ: PROGETTO INDIVIDUALIZZATO IN FAVORE DELLA PERSONA VALUTANDO L'AMBIENTE SOCIALE E FAMILIARE, LA SFERA ABITATIVA E LAVORATIVA.	715.000,00	715.000,00	G84H22000170001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I010301	IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA IN ITALIA A SOSTEGNO DELL'ABITARE*VIA DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 SANREMESE*EQUIPE MULTIDISCIPLINARE PER IL SOSTEGNO E L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSONE FRAGILI AL REINSERIMENTO SOCIALE ED ABITATIVO	710.000,00	710.000,00	G81H22000020001	ATTIVO	PROGETTAZIONE					
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I010302	IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA IN ITALIA PER OFFRIRE RISPOSTE AI BISOGNI PRIMARI E FAVORIRE L'ACCESSO AI SERVIZI*DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2 SANREMESE*IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI ESTREMA POVERTÀ E DEI SERVIZI CHE FAVORISCANO LA REPERIBILITÀ DELLA PERSONA E IL CONSEGUENTE ACCESSO ALLE COMUNICAZIONI			G84H22000160001	RICHIESTE INTEGRAZIONI		0,00	0,00			Costo progetto 1.090.000

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE- ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0201	MERCATO DEI FIORI VALLE ARMEA VIA QUINTO MANSUINO SANREMO. RICONVERSIONE DELLA STRUTTURA IN CAMPUS POLIVALENTE SCOLASTICO, TECNOLOGICO, SPORTIVO CON FINALITÀ SOCIALI, DIDATTICHE, SPORTIVE; RECUPERO SPAZI ESTERNI ANNESSI*VIA QUINTO MANSUINO VALLE ARMEA SANREMO*RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI, RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI	6.500.000,00	6.500.000,00	G24E21000910001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	168.185,28	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0201	VILLA MERCEDE CORSO CAVALLOTTI 250 - 252 SANREMO. RESTAURO E RECUPERO EDIFICIO DISMESSO DI INTERESSE CULTURALE PER RIUTILIZZO A INIZIATIVE CULTURALI E DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE, E RECUPERO DEL PARCO URBANO ANNESSO*CORSO CAVALLOTTI 250 - 252*RISANAMENTO DELL'EDIFICIO : RIPRISTINO COPERTURA, RIFACIMENTO TERRAZZI, ADEGUAMENTO SPAZI INTERNI E APPARATI DECORATIVI, INSERIMENTO DI IMPIANTI TECNOLOGICI E ASCENSORE, NUOVO PARCO URBANO ANNESSO	3.500.000,00	3.500.000,00	G25F21000770001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	135.218,60	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0203	RECUPERO DELL'IMMOBILE STORICO PALAZZO DELLE RIVOLTE*RIVOLTE SAN SEBASTIANO*REALIZZAZIONE DI 6 NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PIÙ SPAZI AD USO COMMERCIALE ED ASSOCIATIVO	1.318.662,00	1.318.662,00	G23D00000000005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	17.215,69	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0203	PROGETTO DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DI N 9 PROPRIETÀ COMUNALE NON RESIDENZIALI A PIANO STRADA*VIA AREA DI RIFERIMENTO CENTRO STORICO SANREMO*RESTAURO E RISANAMENTO DEI LOCALI INTERNI CON REALIZZAZIONE DI LOCALI IGIENICI	641.559,00	641.559,00	G24E21000040001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	79.122,56	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0203	INFRASTRUTTURAZIONE DEL BORGO DELLA PIGNA CON LA BANDA LARGA E SERVIZI CONNESSI*VIA AREA DI RIFERIMENTO CENTRO STORICO SANREMO*REALIZZAZIONE DI SMART CITY SERVIZI WIFI VIDEOSORVEGLIANZA RICARICHE ELETTRICHE E REALIZZAZIONE RETE PER LA BANDA LARGA	668.981,00	668.981,00	G24E21000050001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0203	DECRETO MIT N. 395 DEL 16.09.2020*RECUPERO DIFFUSO PARTI COMUNI IMMOBILI RESIDENZIALI E ALLOGGI DI PROPRIETÀ PRIVATA	2.933.571,00	1.072.063,00	G24E21000060008	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0203	REALIZZAZIONE CENTRO DI RICERCA E DIVULGAZIONE PER LA CONSERVAZIONE ATTIVA DELL'AMBIENTE NEL PALAZZO ROVERIZIO IN VIA PALAZZO 12 A SANREMO*VIA PALAZZO 12 SANREMO*RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE PER INSERIMENTO CENTRO DI RICERCA E SPAZI MULTIMEDIALI	1.899.710,00	1.899.710,00	G25F21000040001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	143.697,32	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0203	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI LOCALI ACCESSORI EX ORATORIO DI SANTA BRIGIDA*VIA CAPITOLO*REALIZZAZIONE OPERE INTERNE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	104.870,00	104.870,00	G25F21000050001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	10.759,61	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0203	RESTAURO DELLA CAPPELLA BOTTINI* VIA PALMA, 71 - *RESTAURO DI DIPINTI E AFFRESCHI E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA CAPPELLA BOTTINI	142.000,00	142.000,00	CUP: G25F21000070001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0203	PASSAGGIO IPOGEO*CENTRO STORICO PIGNA*LOTTO 6 RECUPERO PASSAGGIO IPOGEO PER VALORIZZAZIONE CULTURALE E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ	632.264,00	632.264,00	G26G21000020001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0203	VIA MORARDO, PIAZZA CORRIDONI, VIA GIORDANO, VICOLO BOTTINI, VICOLO BALILLA, VIA UMANA, VIA RICCOBONO, VIA DELLA PRUDENZA, VICOLO PROVVIDENZA, VIA FERRUCCIO, VIA RIVOLTE, VICOLO CISTERNIN, VIA CISTERNA, VIA DEL POPOLO, VIA TAPOLETTI*CENTRO STORICO PIGNA*RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI DEGLI SPAZI APERTI CON MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ, RECUPERO FONTANE STORICHE, INSERIMENTO DIFFUSO DI NUOVO ARREDO URBANO COMPRESA REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI MANCANTI E/O CARENTI (GAS,RETE FOGNARIA, ELETTRICITÀ)	3.050.268,00	3.050.268,00	G27H21000270001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0203	RECUPERO DEI GIARDINI STORICI REGINA ELENA - SANREMO.*GIARDINI REGINA ELENA*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI SPAZI COMUNI E DEL VERDE PER I RESIDENTI.	700.000,00	700.000,00	CUP: G27H21000340005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	11.810,00	0,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0203	INTERVENTO DI RIDEFINIZIONE E IMPELEMENTAZIONE DELLA CARTELLONISTICA TURISTICA ESISTENTE CON REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO LETTERARIO CALVINIANO*ZONA "PIGNA" - SANREMO*FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA TURISTICA NEL CENTRO STORICO DI SANREMO	50.000,00	50.000,00	G27H21000350005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0203	VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ DEI LUOGHI: RESTAURO E IMPLEMENTAZIONE DELLE TARGHE TOPONOMASTICHE PUBBLICHE E STORICHE*CENTRO STORICO "PIGNA" - SANREMO*RESTAURO E IMPLEMENTAZIONE DELLE TARGHE VIARIE IN CERAMICA E DELLE TARGHE DEI QUARTIERI DIPINTE	14.000,00	14.000,00	G27H21000360001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0203	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO C. COLOMBO DI SANREMO PIAZZA EROI SANREMESI 77 SANREMO*VIA PIAZZA EROI 77*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO QUALI PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI NUOVI SERRAMENTI E CALDAIA E LAVORI EDILI	2.000.000,00	2.000.000,00	G28I21000420005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	136.887,99	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0203	RIFUNZIONALIZZAZIONE E RECUPERO DI PIAZZA SANTA BRIGIDA E VICOLO PROVVIDENZA*VIA AREA DI RIFERIMENTO CENTRO STORICO SANREMO*RECUPERO DI PIAZZA SANTA BRIGIDA E VICOLO PROVVIDENZA CON RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E ACCESSIBILITÀ	612.725,00	612.725,00	G29J21000210001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	60.079,70	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0203	IMMOBILE P.ZZA CASSINI*PIAZZA CASSINI*ACQUISTO E RECUPERO IMMOBILE PIAZZA CASSINI PER REALIZZAZIONE CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE (COHOUSING)	455.900,00	455.900,00	G29J21000270001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	254.405,74	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M5C2I0301	IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE OUTDOOR LOC. PIAN DI POMA. RIFERIMENTO CUP MASTER J55E22000170006 CLUSTER 1*VIA GRANDE TORINO SNC*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE OUTDOOR CON 3 DISCIPLINE SPORTIVE IN LOC. PIAN DI POMA A SANREMO. RIFERIMENTO CUP MASTER J55E22000170006 CLUSTER 1	2.500.000,00	2.500.000,00	G25B22000090006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	147.139,85	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M4C1I0101	ADEGUAMENTO SISMICO ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI	2.000.000,00	2.000.000,00	G21B21002140001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	172.049,28	0,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M1C1I0104	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	328.160,00	328.160,00	G21F22003470006	Attivo	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SANREMO - IMPERIA -	M1C1I0104	PND-Notifiche Digitali	59.966,00	59.966,00	G21F22003170006	Attivo	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M1C1I0104	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*PIAZZA MATTEOTTI, 1*ENTRAMBI	280.932,00	280.932,00	F71F22001670006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M1C1I0104	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*"INTEGRAZIONE DI CIE"	14.000,00	14.000,00	F71F22001880006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M1C1I0104	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	12.376,00	12.376,00	F71F22001890006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	76.482,00	76.482,00	F71F22001990006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M2C4I0202	ADEGUAMENTO TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI VIA FALCINELLO SUL TORRENTE CALCANDOLA*VIA FALCINELLO*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE STRADALE	900.000,00	820.000,00	F71B20000420001	ATTIVO	CONTRATTO FIRMATO	0,00	0,00			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M2C4I0202	SOSTITUZIONE DEL TELO DI COPERTURA DELLA TENSOSTRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA " D. BOLOGNA" *VIA PARADISO*SOSTITUZIONE TELO DI COPERTURA	83.000,00	41.500,00	F74J22000230006	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	69.981,57	65.000,00			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M2C4I0202	COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DEL PALAZZO RODERIO SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE*PIAZZA MATTEOTTI*EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE	47.000,00	23.500,00	F74J22000240006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI IN CORSO	2.080,00	65.000,00			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M2C4I0202	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO DI NAVE*VIA NAVE*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	565.000,00	565.000,00	F76J20000770001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	253.065,87			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M2C4I0202	RIPRISTINO PASSERELLA PEDONALE ESISTENTE E REALIZZAZIONE NUOVA RAMPA DI ACCESSO LATO NUOVO SOTTOPASSO FERROVIARIO*VIA EMILIANA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA PEDONALE E COSTRUZIONE NUOVA RAMPA DI ACCESSO	250.000,00	250.000,00	F77H20002200001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE LAVORI	6.422,00	50.000,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M2C4I0202	OPERE DI CONTENIMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LE VIE DI ADDUZIONE ALLA FORTEZZA CASTRUCCIO CASTRACANI - LOTTO 1*VIA ALLA FORTEZZA*REALIZZAZIONE PARATIE DI MICROPALI	675.000,00	675.000,00	F77H20002250001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI IN CORSO	229.200,69	135.000,00			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M2C4I0202	OPERE DI CONTENIMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' PRULLA*VIA PRULLA*REALIZZAZIONE PARATIE DI MICROPALI	170.000,00	170.000,00	F77H20002260001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	113.764,49	34.000,00			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M2C4I0202	RIPRISTINO PONTE SU VIA CISA SUL TORRENTE CALCANDOLA*VIA CISA*COLLOCAZIONE IN OPERA DI PARAPETTI SU MURI CONDUTTORI	20.000,00	20.000,00	F77H20002270001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	13.320,00	8.958,08			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M4C1I0101	AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA "I. MATTAZZONI"*VIALE DELLA PACE*AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	110.000,00	110.000,00	F78H22000070006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	11.000,00			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M4C1I0102	PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA DI NAVE*VIA NAVE*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	57.000,00	57.000,00	F78H22000030006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	5.297,87			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M4C1I0102	PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA CATERINA*VIA CISA*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	40.300,00	40.300,00	F78H22000040006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	3.600,00			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M4C1I0303	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO "POGGI-CARDUCCI" - PROGETTAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1 - 2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA LOTTO 1*VIA S.BARTOLOMEO*SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	700.000,00	700.000,00	F74I19001530004	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	488.274,86	595.695,33			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M5C2I0101	PROGETTO SOVRADISTRETTUALE PNRR M5C 1.1.3 RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE*PIAZZA MATTEOTTI 1*IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	330.000,00	330.000,00	F54H22000360006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M5C2I0101	RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE IN GRUPPI DI APPARTAMENTI AUTONOMI DESTINATI ALL'ACCOGLIENZA DELLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI*VIA CANALE 109*ADEGUAMENTO DI UNA STRUTTURA PER LA REALIZZAZIONE DI UN COHOUSING PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI			F54H22000370006	NON ATTIVO (AMMESSO E IN ATTESA DI FINANZIAMENTO)		0,00	0,00			Costo progetto 2.460.000

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M5C2I0102	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 , INVESTIMENTO 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" *PIAZZA MATTEOTTI 3*PROGETTO INDIVIDUALIZZATO MULTIDISCIPLINARE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN COLLABORAZIONE TRA ENTE PUBBLICO E TERZO SETTORE. SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO ED INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO ANCHE SPECIFICI ALLA DIMENSIONE DIGITALE.	715.000,00	715.000,00	F54H22000390006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M5C2I0201	RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO " CAPOLUOGO" IN VIALE XXI LUGLIO IN EDIFICIO POLIFUNZIONALE PUBBLICO - LOTTO 2*VIALE XXI LUGLIO*ADEGUAMENTO SISMICO	5.000.000,00	5.000.000,00	F71B21002000001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SARZANA - LA SPEZIA -	M5C2I0203	PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - BORGO DI MARINELLA*LOCALITÀ MARINELLA*RIGENERAZIONE ABITATIVA	13.424.635,00	13.424.635,00	F73D21000660001	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00	Il CUP in oggetto è stato richiesto quale "contenitore" /Master degli effettivi interventi di cui ai cup collegati di cui alle successive righe 26-31. L'importo complessivo degli interventi risulta quindi pari ad € 13.424,635,00 al netto degli oneri di € 1.900.000,00 per totale € 15.324.635,00.		
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M1C1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 18 SERVIZI DA MIGRARE	419.124,00	419.124,00	C51C22000370006	ATTIVO	PROGETTAZIONE			FASE DI ATTUAZIONE: ATTIVAZIONE CONTRATTO		
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	71.019,00	71.019,00	C51F22000760006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE			FASE DI ATTUAZIONE: ATTIVAZIONE CONTRATTO COMPLETATA		
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M1C1I0104	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI CIE	14.000,00	14.000,00	C51F22000860006	ATTIVO	PROGETTAZIONE			FASE DI ATTUAZIONE: ATTIVAZIONE CONTRATTO		
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M1C1I0104	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	14.560,00	14.560,00	C51F22001040006	ATTIVO	PROGETTAZIONE			FASE DI ATTUAZIONE: ATTIVAZIONE CONTRATTO		

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE- ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M1C3I0103	TEATRO COMUNALE CHIABRERA DI SAVONA*PIAZZA DIAZ*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO CHIABRERA DI SAVONA	532.650,00	379.603,99	C54J22000070001	IN RIMODULAZIONE	ESECUZIONE LAVORI					
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M2C4I0202	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA E. DE AMICIS*LARGO FOLCONI*ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA E DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA E. DE AMICIS	420.000,00	420.000,00	C51E20000160001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	146.473,69	84.000,00			
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M2C4I0202	ISTITUTO COMPRESORIO SAVONA II - SCUOLA SECONDARIA E.CARANDO - VIA F.TURATI - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO*VIA TURATI 6*SOSTITUZIONE PARZIALE SERRAMENTI ESTERNI	170.000,00	170.000,00	C52G19001020001	ALTRO	INTERVENTO CONCLUSO	137.547,50	85.000,00	DA TERMINARE RENDICONTAZIONE		
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M2C4I0202	SCUOLE MEDIE GUIDOBONO*VIA MACHIAVELLI*MESSA IN SICUREZZA PROSPETTI E VETRATE SCUOLE MEDIE GUIDOBONO	600.000,00	600.000,00	C54H20001240001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	14.782,56	120.000,00			
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M2C4I0202	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E VIADOTTI*VIA VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE*OPERE PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI QUALI RIPRISTINI STRUTTURALI, DI GIUNTI DI DILATAZIONE, BARRIERE DI SICUREZZA, PAVIMENTAZIONI, ECC.	598.000,00	598.000,00	C57H19001440004	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI		119.600,00			
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M2C4I0202	VIA SAN NAZARIO*VIA SAN NAZARIO*INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO E RIPRISTINO VIABILITÀ DI VIA SAN NAZARIO INTERROTTA A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2019	700.000,00	700.000,00	C57H20001250001	ALTRO	PROGETTAZIONE			SCADENZA: AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 23/03/2022 NON RISPETTATA	DIFFICOLTA' DI COMUNICAZIONE E CON MINISTERO DELL'INTERNO	
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M2C4I0202	VIA ALLA STRÀ*VIA ALLA STRÀ*INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO E RIPRISTINO VIABILITÀ DI VIA ALLA STRÀ INTERROTTA A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2019	500.000,00	500.000,00	C57H20001260001	ALTRO	PROGETTAZIONE			SCADENZA: AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 23/03/2022 NON RISPETTATA	DIFFICOLTA' DI COMUNICAZIONE E CON MINISTERO DELL'INTERNO	
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M2C4I0202	VIA ALLA MONTEPRATO - VIA RANCO*VIA MONTEPRATO E RANCO*INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO E RIPRISTINO VIABILITÀ DI VIA ALLA MONTEPRATO/VIA RANCO DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2019	300.000,00	300.000,00	C57H20001270001	ALTRO	PROGETTAZIONE			SCADENZA: AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 23/03/2022 NON RISPETTATA	DIFFICOLTA' DI COMUNICAZIONE E CON MINISTERO DELL'INTERNO	
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M4C1I0101	ASILO NIDO BOLLICINE VIA BRILLA 1*VIA BRILLA 1*RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO BOLLICINE VIA BRILLA	647.012,00	647.012,00	C57G22000090006	ATTIVO	PROGETTAZIONE					

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M4C1I0102	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA SANTUARIO*VIA CIMAVALLE*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	332.000,00	260.000,00	C51B22001430001	ATTIVO	PROGETTAZIONE					
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M5C2I0101	DISTRETTO SOCIALE SAVONESE COME CAPOFILIA INSIEME AI DISTRETTI BORMIDE E FINALESE PER PROGETTO 1.1.4*VIA QUARDA INFERIORE N. 4 SAVONA*PROGETTO 1.1.4 SUPERVISIONE E PREVENZIONE BURN OUT	117.871,20	117.871,20	C54FH22000290006	ATTIVO	PROGETTAZIONE					
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M5C2I0102	DISTRETTO SOCIALE N. 7 SAVONESE*VIA QUARDA INFERIORE N. 4 SAVONA*PROGETTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ	536.249,99	536.249,99	C24FH22000120006	ATTIVO	PROGETTAZIONE					
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M5C2I0103	DISTRETTO SOCIALE N. 7 SAVONESE*VIA QUARDA INFERIORE N. 4 SAVONA*PROGETTO 1.3.1 HOUSING FIRST	710.000,00	710.000,00	C24FH22000130006	ATTIVO	PROGETTAZIONE					
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M5C2I0103	PROGETTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA*VIA QUARDA INFERIORE N. 4 SAVONA*PROGETTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA	1.090.000,00	1.090.000,00	C24FH22000140006	ATTIVO	PROGETTAZIONE					
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M5C2I0201	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA DEGRADATA SITA IN VIA GRASSI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO COMUNALE*VIA GRASSI*RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA DEGRADATA SITA IN VIA GRASSI -	1.190.000,00	1.100.000,00	C53D21001420005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	110.000,00				
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M5C2I0201	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER IL RECUPERO FUNZIONALE EX PISCINA DI VIA TRENTO TRIESTE*VIA TRENTO E TRIESTE*INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER IL RECUPERO FUNZIONALE EX PISCINA DI VIA TRENTO TRIESTE	2.000.000,00	1.850.000,00	C53D21001430005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	185.000,00				
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M5C2I0201	RESTAURO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE PALAZZO DELLA ROVERE PER RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO PUBBLICO*VIA PIA*RESTAURO CONSERVATIVO E VALORIZZAZIONE PALAZZO DELLA ROVERE	14.319.800,00	13.600.000,00	C55F21000540007	ATTIVO	PROGETTAZIONE	1.360.000,00				
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M5C2I0201	INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPES SO SAN GIACOMO - RESTAURO CONSERVATIVO EX CHIESA, CAPPELLA E CHIOSCHI.*SALITA SAN GIACOMO*INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPES SO SAN GIACOMO	3.560.000,00	3.450.000,00	C55F21000550005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	21.832,15	345.000,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M5C2I0203	INTERVENTI SUI FABBRICATI ERS DI VIA GARRONI 20 E VIA MINUTO 4-6 IN LAVAGNOLA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLE AREE LIMITROFE*VIA LAVAGNOLA*INTERVENTI SUI FABBRICATI ERS DI VIA GARRONI 20 E VIA MINUTO 4-6 IN LAVAGNOLA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLE AREE LIMITROFE			C59J21033180006	ALTRO				AMMESSO CON RISERVA CON D.M. 383 DEL 07/10/2021 IN ATTESA DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA		Costo progetto 5.350.000
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M5C2I0301	PISCINA COMUNALE ZANELLI*CORSO COLOMBO 3*REALIZZAZIONE 2° LOTTO - 1° STRALCIO	3.545.800,00	2.500.000,00	C55B22000160006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	900,00	250.000,00			
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M1C1I0104	MIGLIORAMENTO DELLESPERIENZA DUSO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*VIA CORSO ITALIA*ENTRAMBI	328.160,00	328.160,00	C51F22003630006	ATTIVO	PROGETTAZIONE			PROGETTO AGGIUNTO IN QUANTO NON PRESENTE A PROSPETTO		
COMUNE DI SAVONA - SAVONA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE COMUNALI (CON PAGAMENTO)	59.966,00	59.966,00	C51F22003220006	ATTIVO	PROGETTAZIONE			PROGETTO AGGIUNTO IN QUANTO NON PRESENTE A PROSPETTO		
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M1C1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 14 SERVIZI DA MIGRARE	121.992,00	121.992,00	E11C22001160006	attivo	progettazione	0,00	0,00			
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M1C1I0104	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	17.150,00	17.150,00	E11F22002030006	attivo	progettazione	0,00	0,00			
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M1C1I0104	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI SPID E CIE	14.000,00	14.000,00	E11F22002040006	attivo	progettazione	0,00	0,00			
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M1C3I0103	CINEMA ARISTON*VIA ERALDO FICO,12*INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CINEMA ARISTON	413.809,00	331.047,21	E13I22000080006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	5.832,32	0,00	QUOTA Importo contributo PNRR € 331. 047,21	Implementazione del Portale ReGis molto complessa e poco intuitiva	

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M2C4I0202	TRATTASI DI OPERE DI COMPLETAMENTO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA REALIZZATA (OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLO SBOCCO A MARE DEL CANALE DELLA CHIUSA)*VIA RIMEMBRANZE*FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATIE METALLICHE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DI ACQUE METEORICHE DA SCARICARE A MARE	19.978,00	19.978,00	E11B21002790001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	17.057,83	9.989,00			
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M2C4I0202	MURO DI SOSTEGNO DELLA ZONA ADIACENTE ALLA CHIESA DI SAN NICOLO' DELL'ISOLA*VIA SALITA ALLA PENISOLA DI LEVANTE*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA ZONA ADIACENTE ALLA CHIESA DI SAN NICOLO' DELL'ISOLA	300.000,00	300.000,00	E13H20000270001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	34.355,18	182.857,14		Implementazione del Portale ReGis molto complessa e poco intuitiva	
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M2C4I0202	PALAZZINA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA SALVI 4*VIA S.SALVI, N. 4*ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E NUOVA DOTAZIONE DI SERVIZI IGIENICI E NUOVA DISTRIBUZIONE UFFICI AL PIANO TERRA.	80.000,00	80.000,00	E14E21002390001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	72.242,80	40.000,00			
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M2C4I0202	CANALE ACQUE BIANCHE VIA MONSIGNOR VATTUONE*VIA MONSIGNOR VATTUONE*INTERVENTI PER ATTENUAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA ZONA DI SAN BARTOLOMEO E VIA MONSIGNOR VATTUONE" - PIANO DI BACINO STRALCIO D.L. 180/98 E SS.MM.II. - AMBITO 17 TORRENTE GROMOLO - PRIMO LOTTO FUNZIONALE	980.000,00	980.000,00	E14H20000930001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	24.055,93	598.053,34		Implementazione del Portale ReGis molto complessa e poco intuitiva	
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M2C4I0202	FRAZIONE DI LIBIOLA*LIBIOLA*INTERVENTI SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA FRAZIONE DI LIBIOLA	400.000,00	400.000,00	E14H20000940001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	214.656,75	243.089,52		Implementazione del Portale ReGis molto complessa e poco intuitiva	
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M2C4I0202	CANALE DI DRENAGGIO CITTADINO ACQUE METEORICHE DENOMINATO "CHIUSA"*VIALE DELLA RIMEMBRANZA*MIGLIORAMENTO DELLO SCARICO A MARE DEL "CANALE DELLA CHIUSA"	100.000,00	100.000,00	E16B20000650002	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	59.470,39	59.470,39			
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M2C4I0202	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALAZZINA EX IREN IN VIA SALVI*VIA SALVI*REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PALAZZINA EX IREN IN VIA SALVI DA ADIBIRE AD ARCHIVIO CARTACEO	27.000,00	27.000,00	E16E20000050001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	22.249,25	22.249,25			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M2C4I0202	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO UFFICI COMUNALI DI VIA SALVI, 4 E FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI A LED NEGLI IMMOBILI COMUNALI*VIA SALVI*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO UFFICI COMUNALI DI VIA SALVI, 4 E FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI A LED NEGLI IMMOBILI COMUNALI	99.000,00	99.000,00	E16G22000210006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	0,00		Implementazione del Portale ReGis molto complessa e poco intuitiva	
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M2C4I0202	PLESSO SCOLASTICO DI VIA LOMBARDIA (SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE)*VIA LOMBARDIA*INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA LOMBARDIA	300.000,00	300.000,00	E17B20001060001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	146.624,44	60.000,00		Implementazione del Portale ReGis molto complessa e poco intuitiva	
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M2C4I0202	STRADA COMUNALE PER VILLA CARMELO - SAN BERNARDO*VILLA CARMELO - SAN BERNARDO*STRADA PER VILLA CARMELO - SAN BERNARDO : INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, AMPLIAMENTO SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA	200.000,00	200.000,00	E17H20001170001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	145.109,69	40.000,00		Implementazione del Portale ReGis molto complessa e poco intuitiva	
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M2C4I0202	STRADA COMUNALE LOTO SAN BERNARDO*LOTO - SAN BERNARDO*MESSA IN SICUREZZA STRADA LOTO - SAN BERNARDO	320.000,00	320.000,00	E17H20001180001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	96.232,91	64.000,00		Implementazione del Portale ReGis molto complessa e poco intuitiva	
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M2C4I0202	INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO E DI AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DELL' ARENILE DELLA BAI A DELLE FAVOLE IN LOC. SANT'ANNA - PERIZIA DI VARIANTE*BAIA DELLE FAVOLE*INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO E DI AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DELL' ARENILE DELLA BAI A DELLE FAVOLE IN LOC. SANT'ANNA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLA MAREGGIATA DEL 29-30 OTTOBRE 2018	80.000,00	80.000,00	E17H21000730001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	72.727,27	40.000,00			
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M4C1I0102	SCUOLA ELEMENTARE "PAPA GIOVANNI XXIII" - AMPLIAMENTO SALA MENSA*VIA LOMBARDIA CIV 29*PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	800.000,00	800.000,00	E18H22000040006	ATTIVO	FASE DI ATTUAZIONE	0,00	0,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M5C2I0102	RISTRUTTURAZIONE DI ALLOGGI E GESTIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ. ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI E FORMAZIONE ALL'USO DEGLI STESSI NEL LAVORO A FAVORE DI PERSONE DISABILI.*COMUNI DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 16*RISTRUTTURAZIONE E ARREDO ALLOGGI, PERCORSI DI TIPO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER L'AUTONOMIA, ACQUISTO DELLA DOMOTICA ADEGUAMENTO ALLOGGI GIÀ UTILIZZATI. TIROCINI FORMATIVI USO TECNOLOGIE PER IL LAVORO DA REMOTO ACQUISTO STRUMENTAZIONE	715.000,00	680.004,99	E14H22000470006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M5C2I0103	RISTRUTTURAZIONE E ARREDO DI ALLOGGI DA ADIBIRE AD HOUSING FIRST CON SERVIZI CONNESSI EDUCATIVI E AMMINISTRATIVI.*TERRITORIO ASL 4 CHIAVARESE DSS14DSS15 DSS16*RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI PER LA CREAZIONE DI ALLOGGI PER HOUSING FIRST ATTIVAZIONE PERCORSI DI SUPPORTO INDIVIDUALI E DI GRUPPO PER IL SUPPORTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE	710.000,00	710.000,00	E64H22000370006	ATTIVO	FASE DI ATTUAZIONE	0,00	0,00		Il CUP è attivo ma non è ancora stata caricata la convenzione	
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M5C2I0103	RISTRUTTURAZIONE LOCALI PER LA CREAZIONE DI CENTRO SERVIZI CON ANNESSA GESTIONE*TERRITORIO ASL 4 CHIAVARESE DSS14DSS15 DSS16*RISTRUTTURAZIONE E ARREDO CENTRO SERVIZI CON ANNESSA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA ANCHE DI SERVIZI GIÀ ESISTENTI IN RETE CON IL CENTRO	1.090.000,00	1.090.000,00	E64H22000400006	ATTIVO	FASE DI ATTUAZIONE	0,00	0,00		Il CUP è attivo ma non è ancora stata caricata la convenzione	
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M5C2I0201	CENTRO STORICO*VIA EDUCANDATO*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - PRIMO LOTTO - PAVIMENTAZIONE VIA EDUCANDATO	230.000,00	230.000,00	E13D21001010005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	4.453,16	22.500,00		Implementazione del Portale ReGis molto complessa e poco intuitiva	
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M5C2I0201	CENTRO STORICO DI LOTO FRAZIONE COMUNE DI SESTRI LEVANTE*LOC. LOTO*RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI LOTO	240.000,00	240.000,00	E13D21001020005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	23.500,00		Implementazione del Portale ReGis molto complessa e poco intuitiva	
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M5C2I0201	PARCO PUBBLICO SERLUPI*LOC. SANTO STEFANO DEL PONTE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO SERLUPI	430.000,00	430.000,00	E13D21001050005	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	9.000,00	43.000,00		Implementazione del Portale ReGis molto complessa e poco intuitiva	
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M5C2I0201	FRONTE MARE RIVA TRIGOSO IN COMUNE DI SESTRI LEVANTE*FRONTE MARE RIVA TRIGOSO*RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO FRONTE MARE RIVA TRIGOSO	3.800.000,00	3.737.000,00	E13D21001060005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	14.352,00	373.700,00		Implementazione del Portale ReGis molto complessa e poco intuitiva	

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE- ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M4C1I1.1	COSTRUZIONE DI NUOVO POLO DELL'INFANZIA SITO NELLA FRAZIONE DI PILA IN VIA NEGROTTO CAMBIASO: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE, L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE DEL 22 MARZO 2021 - PNRR: "PROGETTI IN ESSERE" DELLA MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU	3.000.000,00	2.850.000,00	E11B21002180005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	4.281,00	570.000,00		Implementazione del Portale ReGis molto complessa e poco intuitiva. In fase di progettazione definitiva il costo dell'opera risulta maggiore di quanto preventivato	
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	26.567,00	0,00	E11F22005060006	ALTRO	progettazione	0,00	0,00			
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	32.589,00	32.589,00	E11F22003390006	ATTIVO	progettazione	0,00	0,00			
COMUNE DI SESTRI LEVANTE - GENOVA -	M1C1I0104	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	155.234,00	155.234,00	E11F22003980006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M1C1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*14 SERVIZI	121.992,00	121.992,00	G61C22001830006	IN RIMODULAZIONE	PROGETTAZIONE					
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M1C1I0104	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI SPID E CIE	14.000,00	14.000,00	G61F22002790006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			ENTRATA: 4.0200 - 640/70/5 "P.N.R.R.:M1C1I1.4 .4 "Servizi e Cittadinanza Digitale: SPID/CIE" - CUP G61F22002790006 - Trasferimento" SPESA: 01.11.2 - 6470/8/5 "P.N.R.R.: M1C1I1.4.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale: SPID/CIE" - CUP G61F22002790006 - Realizzazione intervento"

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M1C1I0104	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	3.430,00	3.430,00	G61F22002800006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			ENTRATA: 4.0200 - 640/70/3 "P.N.R.R.:M1C1I1.4 .3 "Servizi e Cittadinanza Digitale: AppIO" - CUP G61F22002800006 - Trasferimento" SPESA: 01.11.2 - 6470/8/3 "P.N.R.R.: M1C1I1.4.3 "Servizi e Cittadinanza Digitale: AppIO" - CUP G61F22002800006 - Realizzazione intervento"
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	19.711,00	19.711,00	G61F22004600006	IN RIMODULAZIONE	PROGETTAZIONE					
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI			G61F22003690006	DOMANDA INOLTRATA						Costo progetto 32.589
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M1C1I0104	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI			G61F22003880006	DOMANDA INOLTRATA						Costo progetto 155.234
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M2C3I0301	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA F. PASTONCHI*VIA COLOMBO/ VIALE DELLE PALME*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA F. PASTONCHI			G64D20000900006	DOMANDA INOLTRATA						Costo progetto 1.500.000
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M2C3I0301	SCUOLE ELEMENTARI DI TAGGIA SOLERI*VIA OTTIMO ANFOSSI*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA DI I GRADO SOLERI			G64D22002220006	DOMANDA INOLTRATA						costo progetto 600.000
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M2C3I0301	PALAZZO COMUNALE*VIA SAN FRANCESCO 441*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE COMUNALE			G64H22000770006	DOMANDA INOLTRATA						costo progetto 135.500
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M2C4I0201	CASERME REVELLI*VIA SAN FRANCESCO*MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE IDRAULICHE ED ADEGUAMENTO DEL RIO BEGLINI ALL'INTERNO DELL'EX CASERMA REVELLI			G66F22000480006	DOMANDA INOLTRATA						costo progetto 910.000
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M2C4I0201	IV STRALCIO MESSA IN SICUREZZA OPERE IDRAULICHE A COMPLETAMENTO DELL'ABITATO DI ARMA DI TAGGIA*VIA LUNGOMARE*MESSA IN SICUREZZA OPERE IDRAULICHE A COMPLETAMENTO DELL'ABITATO DI ARMA DI TAGGIA IV STRALCIO			G68B22006590006	DOMANDA INOLTRATA						costo progetto 535.500

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M2C4I0201	RIO OXENTINA LOTTO 1 E LOTTO 2*RIO REGIANCO*GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO INTERESSANTE L'ALVEO DEL RIO REGIANCO A MONTE DELLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE OXENTINA, CON GRAVE PERICOLO PER LE AREE E LE INFRASTRUTTURE ESISTENTI LOTTO 1 - LOTTO 2			G68H20000720006	DOMANDA INOLTRATA						costo progetto 562.000
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M2C4I0201	RIO OXENTINA LOTTO 3 LOTTO 4*RIO REGIANCO*GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO INTERESSANTE L'ALVEO DEL RIO REGIANCO A MONTE DELLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE OXENTINA, CON GRAVE PERICOLO PER LE AREE E LE INFRASTRUTTURE ESISTENTI LOTTO 3 - LOTTO 4			G68H20000730006	DOMANDA INOLTRATA						costo progetto 551.000
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M2C4I0201	REALIZZAZIONE DI ROTONDA DI INTERCONNESSIONE E VIABILITA' A RIDOSSO DELLO SFERISTERIO COMUNALE LOTTO C E D*VIA LUNGO ARGINE ARGENTINA*MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA SX DEL TORRENTE ARGENTINA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA ROTONDA E VIABILITÀ			G68H22000750006	DOMANDA INOLTRATA						Costo progetto 598.460
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M2C4I0201	COLLEGAMENTO CON IL PONTE ROMANICO E NUOVA STRADA BRUXÀ*VIA LUNGO ARGINE ARGENTINA*MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA SX DEL TORRENTE ARGENTINA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CON IL PONTE ROMANICO E LA NUOVA STRADA BRUXA'			G68H22000760006	DOMANDA INOLTRATA						Costo progetto 449.405
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M2C4I0201	TORRENTE ARGENTINA*TORRENTE ARGENTINA*MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA SX DEL TORRENTE ARGENTINA			G68H22000770006	DOMANDA INOLTRATA						Costo progetto 737.000
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M2C4I0202	VIA SAN FRANCESCO 441*VIA SAN FRANCESCO 441*INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLA SEDE MUNICIPALE ED ASILO NIDO	53.526,00	53.526,00	G61E19000040001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	52.440,00	25.528,32			
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M2C4I0202	PALAZZO COMUNALE*VIA SAN FRANCESCO 441*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA NUOVA SEDE DEL COMANDO VIGILI URBANI E DEGLI UFFICI PUBBLICI ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE	151.500,00	151.500,00	G64J22000400006	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	79.970,00	0,00			
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M2C4I0202	VIA BORGHI*VIA BORGHI*INTERVENTI STRUTTURALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIRE ARCHITETTONICHE	36.474,00	36.474,00	G69D19000170001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	35.950,66	19.471,68			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M4C1I0101	NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO AD ASILO NIDO DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELLE AREE EX CASERME REVELLI DESTINATE AL POLO SCOLASTICO*VIA CASERME REVELLI*NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO AD ASILO NIDO DA REALIZZARE ALL'INTERNO DELLE AREE EX CASERME REVELLI DESTINATE AL POLO SCOLASTICO	1.400.000,00	1.400.000,00	G65E22000050006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	150.000,00			
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M4C1I0101	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA DA REALIZZARE SULLA STESSA AREA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII*VIA PAPA GIOVANNI XXIII*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA DA REALIZZARE SULLA STESSA AREA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII	1.500.000,00	1.500.000,00	G66F22000030006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI TAGGIA - IMPERIA -	M4C1I0103	NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO DA DESTINARE A PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLE SCUOLE SUPERIORI "C. COLOMBO" E "RUFFINI" SITE ALL'INTERNO DELLE EX CASERME REVELLI*VIA CASERME REVELLI*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE			G65E22000060006	DOMANDA INOLTRATA						Costo progetto 2.600.000
COMUNE DI VARAZZE - SAVONA -	M1C1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*14 SERVIZI DA MIGRARE	121.992,20	121.992,20	F51C22000920006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI VARAZZE - SAVONA -	ATTIVO	PIATTAFORMA PAGOPA*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	51.420,00	51.420,00	F51F22000770006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI VARAZZE - SAVONA -	M1C1I0104	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE CIE	14.000,00	14.000,00	F51F22000910006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI VARAZZE - SAVONA -	M1C1I0104	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	13.720,00	13.720,00	F51F22001140006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI VARAZZE - SAVONA -	M1C1I0104	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	155.234,00	155.234,00	F51F22003970006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI VARAZZE - SAVONA -	M1C1I0104	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	32.589,00	32.589,00	F51F22003340006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI VARAZZE - SAVONA -	M2C4I0202	VIA VECCHIA CASANOVA*VIA VECCHIA CASANOVA*RIPRISTINO DEL TRACCIATO DI UN TRATTO DELLA VIA VECCHIA CASANOVA A COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N°542 E LA S.P. N°57	198.000,00	180.000,00	F57H20001870001	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	36.000,00		L'aggiudicazione è avvenuta nei termini previsti dalla misura, attualmente è in corso la contrattualizzazione e dell'appalto. Inoltre occorre che sulla piattaforma Regis venga aggiornato l'importo complessivo dell'appalto in Euro 198.000,00 ripartito in Euro 180.000,00 di finanziamento PNRR ed Euro 18.000,00 finanziati con fondi propri della Stazione Appaltante. Problemi nel caricamento e trasmissione dati con la piattaforma Regis, in particolare per ciò che riguarda la validazione dei dati.	
COMUNE DI VARAZZE - SAVONA -	M2C4I0202	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE COMUNALI*VIE BAGLIETTO E BATTISTI*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	110.000,00	90.000,00	F59J19000480005	ATTIVO	COLLAUDO	90.000,00	45.000,00		Implementazioni dati sul sistema ReGis, in particolare per quanto riguarda la validazione dei dati inseriti	
COMUNE DI VARAZZE - SAVONA -	M2C4I0202	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE COMUNALI*VIA GIOVANE ITALIA, VIA NINO BIXIO, VIA XXIV APRILE E VIA DON MINZONI*LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	200.000,00	180.000,00	F59J21003270005	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	90.000,00		implementazioni dati sul sistema ReGis, in particolare per quanto riguarda la validazione dei dati inseriti	
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M1C1I0102	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N. 14 SERVIZI DA MIGRARE	252.118,00	252.118,00	H31C22000310006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M1C1I0104	ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE*TERRITORIO NAZIONALE*INTEGRAZIONE DI CIE	14.000,00	14.000,00	H31F22000790006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M1C1I0104	MIGLIORAMENTO DELL' ESPERIENZA D' USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE*PIAZZA LIBERTÀ N. 3*IL SERVIZIO RIGUARDA ENTRAMBI: SIA IL SITO COMUNALE CHE SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	280.932,00	280.932,00	H31F22000800006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M1C1I0104	APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI	36.400,00	36.400,00	H31F22000840006	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M1C2I0101	CENTRO CITTADINO*VIA DELLA REPUBBLICA*ECOCOMPATTATORE PER RIFIUTI RICICLABILI	30.000,00	25.430,91	H39J21010940001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	20.845,00	7.629,27	APPROVAZIONE GRADUATORIA DECR CAPO DIPARTIMENTO MIN TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 27/01/2022 - DM 360/2021 per Euro 25.430,91		
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M2C1I0101	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMPENSORIALE DA UBICARSI IN COMUNE DI CAMPOROSSO*LOCALITA' CIAN DE CA*REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PER LA SEPARAZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI A SERVIZIO DEL BACINO D'AFFIDAMENTO VENTIMIGLIESE E IN SOSTITUZIONE DI CENTRO DI RACCOLTA ESISTENTE, DI FUTURA DISMISSIONE.			H31B22001670001	INTERVENTO DA ATTIVARE		0,00	0,00			Costo progetto 986.840. Non presente su Regis
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M2C1I0101	PROGETTO DI FORNITURA IN UNICO LIVELLO NEL COMUNE DI VENTIMIGLIA DI STRUTTURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI*VARIE ZONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENTIMIGLIA*FORNITURA DI ECOISOLE, ECO COMPATTATORI CONTENITORI E STRUTTURE DIVERSI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI			H31E22000060007	INTERVENTO DA ATTIVARE		0,00	0,00			Costo progetto 995.112. Non presente su Regis
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M2C4I0201	OPERE DI PROTEZIONE DELLA COSTA ANTISTANTE IL LITORALE CITTADINO DI VENTIMIGLIA - RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEL CENTRO ABITATO COMPRESE TRA VIA LAMBOGLIA E LA FOCE DEL FIUME ROJA*VIA PASSEGGIATA TRENTO TRIESTE - LUNGOMARE VARALDO*RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEL CENTRO ABITATO COMPRESE TRA VIA LAMBOGLIA E LA FOCE DEL FIUME ROJA	3.321.458,00	3.321.458,00	H39H22000000003	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE- ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M2C4I0202	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI ROVERINO ADEGUAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE*CORSO LIMONE PIEMONTE*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE MEDIE DI ROVERINO ADEGUAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE FINESTRE	144.000,00	144.000,00	H34D22001180001	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	0,00			
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M2C4I0202	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO BIANCHERI VIA ROMA ATTRAVERSO SOSTITUZIONE FINESTRE LATO OVEST*VIA ROMA*SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI	130.000,00	100.000,00	H35I20000050005	ATTIVO	FASE DI ATTUAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M2C4I0202	PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA 61, SEDE DELLA SCUOLA MEDIA BIANCHERI - VENTIMIGLIA*VIA ROMA 61*ADEGUAMENTO ENERGETICO E PER LA MESSA IN SICUREZZA PARZIALE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA, SEDE DELLA SCUOLA MEDIA BIANCHERI	130.000,00	130.000,00	H36J20000540001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	125.507,10	125.711,91			
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M2C4I0202	MESSA IN SICUREZZA DI VIA FRECCERO MEDIANTE VARIANTE DI TRACCIATO*VIA FRECCERO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ VIA FRECCERO	2.700.000,00	2.400.000,00	H37H20001430005	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	500.000,00			
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M2C4I0202	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ENERGETICO E PER LA MESSA IN SICUREZZA PARZIALE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA, SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA BIANCHERI.*VIA ROMA*APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ENERGETICO E PER LA MESSA IN SICUREZZA PARZIALE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA, SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA BIANCHERI.	130.000,00	130.000,00	H39J21009190001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	130.000,00	130.000,00			
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M2C4I0202	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO NERVIA*VIA NERVIA*INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE VETRATE ESISTENTI E OPERE ACCESSORIE -	130.000,00	130.000,00	H39J21009360001	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	114.696,23	98.096,57			
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M2C4I0404	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA RUFFINI E VIA BIAMONTI*VIA BIAMONTI - RUFFINI*LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA RUFFINI E VIA BIAMONTI	95.124,00	95.124,00	H37H21010320004	ATTIVO	INTERVENTO CONCLUSO	95.124,00	0,00			

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10MILA ABITANTI

SOGGETTO TITOLARE (ATTUATORE)	CODICE MISURA	DESCRIZIONE AGGREGATA	COSTO PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	CODICE CUP	Stato dell'investimento (ATTIVO - REVOCATO - IN RIMODULAZIONE-ALTRO)	FASE DI ATTUAZIONE (PROGETTAZIONE, AGGIUDICAZIONE, ESECUZIONE LAVORI, COLLAUDO, INTERVENTO CONCLUSO)	STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO Pagamenti effettuati al 31.12.2022 su fondi PNRR IVA esclusa	IMPORTO RICEVUTO IN ANTICIPAZIONE	INCONGRUENZE RILEVATE	CRITICITÀ	NOTE
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M5C2I0101	SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI*AMBITO TERRITORIALE 1 LIGURIA*SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	211.500,00	211.500,00	H64H22000420007	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	0,00			
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M5C2I0102	AREA DISABILITÀ*VIA AMBITO TERRITORIALE 1 LIGURIA*INVESTIMENTO 1.2- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ	715.000,00	715.000,00	H64H22000350007	ATTIVO	ESECUZIONE LAVORI	0,00	0,00			
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M5C2I0103	INVESTIMENTO: 1.3 - LINEA 1.3.1. HOUSING FIRST*AMBITO TERRITORIALE 1 LIGURIA*INVESTIMENTO: 1.3 - LINEA 1.3.1. HOUSING FIRST	710.000,00	710.000,00	H64H22000430007	ATTIVO	AGGIUDICAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M5C2I0103	INVESTIMENTO 1.3 - LINEA 1.3.2. STAZIONI DI POSTA*AMBITO TERRITORIALE 1 LIGURIA*INVESTIMENTO 1.3 - LINEA 1.3.2. STAZIONI DI POSTA	1.090.000,00	1.090.000,00	H64H22000440007	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00			
COMUNE DI VENTIMIGLIA - IMPERIA -	M5C2I0201	NUOVO CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI IN VIA VENETO - VENTIMIGLIA*VIA VENETO*REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI IN VIA VENETO - VENTIMIGLIA	1.360.693,38	1.360.693,38	H31B21008450006	ATTIVO	PROGETTAZIONE	0,00	0,00	IL PROGETTO PRESENTATO E' STATO FINANZIATO PER EURO 1.360.693,38		
			1.182.293.978,07	852.473.295,44				28.673.348,34	84.214.894,77			
